

T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ



2012 MALİ YILI
FAALİYET RAPORU



”...Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salâhiyetlerini tam kullanmalıdır.”

K. Atatürk

SUNUŞ

İl Özel İdareleri; 5302 sayılı kanun ve diğer kanunlarla kendilerine verilen görevleri yürütürken, merkezi idarenin ilimizdeki yatırımlarını yürüten, yani bir taraftan mahalli idare birimi olma özelliğini taşıırken diğer taraftan da genel idare kuruluşlarının hemen hemen tüm yatırımlarını planlayan, programlayan ve uygulayıp hayata geçiren bir birimdir.

İl Özel İdaresi, görev ve sorumluluk alanında bulunan yerel kalkınmaya yönelik tüm hizmetlerini etkin ve verimli olarak sunmayı vizyon ve misyon edinmiştir. İlimizdeki yaşam kalitesini ve halkımızın refah seviyesini yükseltmek için yapılan hizmetlerde, Bartın'ımızı geleceğe taşımak hedeflenmiştir. İl Özel İdaresi hedeflerini gerçekleştirirken yaptığı tüm faaliyetlerini, kanunların ve diğer mevzuatların getirdiği ilke ve standartlar ışığında uygulamaya koymuştur.

İl Özel İdaresi, 2012 yılı içerisinde 121 adet projeden 114 adedini gerçekleştirerek % 94 oranında performans sergilemiştir.


Bu vesileyle hazırlanan İl Özel İdaresi 2012 Yılı Faaliyet Raporu, İl Genel Meclisimize sunulacak, Mart ayı sonuna kadar da kamuoyuna duyurulacaktır. Bu vesile ile Faaliyet Raporu halkımız tarafından da incelenecek ve halkımızın faaliyetler hakkında bilgi sahibi olması sağlayacaktır. İl Özel İdaresince bir yıllık süreçte gerçekleşen faaliyetlerin bu tür raporlarla ortaya konulması ve kamuoyuna sunulması, bir yandan faaliyet sonuçlarının izlenmesini sağlarken diğer yandan ihtiyaçların ve hedeflerin tespitinde ve hizmetlerin sunumunda verimliliği de arttıracaktır.

Böylece; 2012 Yılı Faaliyet Raporu, siz değerli İl Genel Meclis Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın talep, öneri ve eleştirilerine sunulacak ve görüşleriniz değerlendirilerek, ileriki yıllarda yapılacak hedef, plan, program ve çalışmalarımıza yön verecektir.

2012 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerde ve hizmetlerin sunumunda, başarılı ve koordineli bir çalışma sergileyen İl Genel Meclisimizin Değerli Başkan ve Üyelerine, İl Encümen Üyelerine, Kaymakamlarımıza, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ederim.

Bartın ilimizin kalkınması ve refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla yapılacak tüm hizmetlerle ilgili daha ileri ve yüksek düzeyde hedefler belirlenmesinde ve bu hedeflere ulaşabilmek adına atılacak adımların her aşamasında görev alanlara yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum.

Bülent SAVUR
Vali

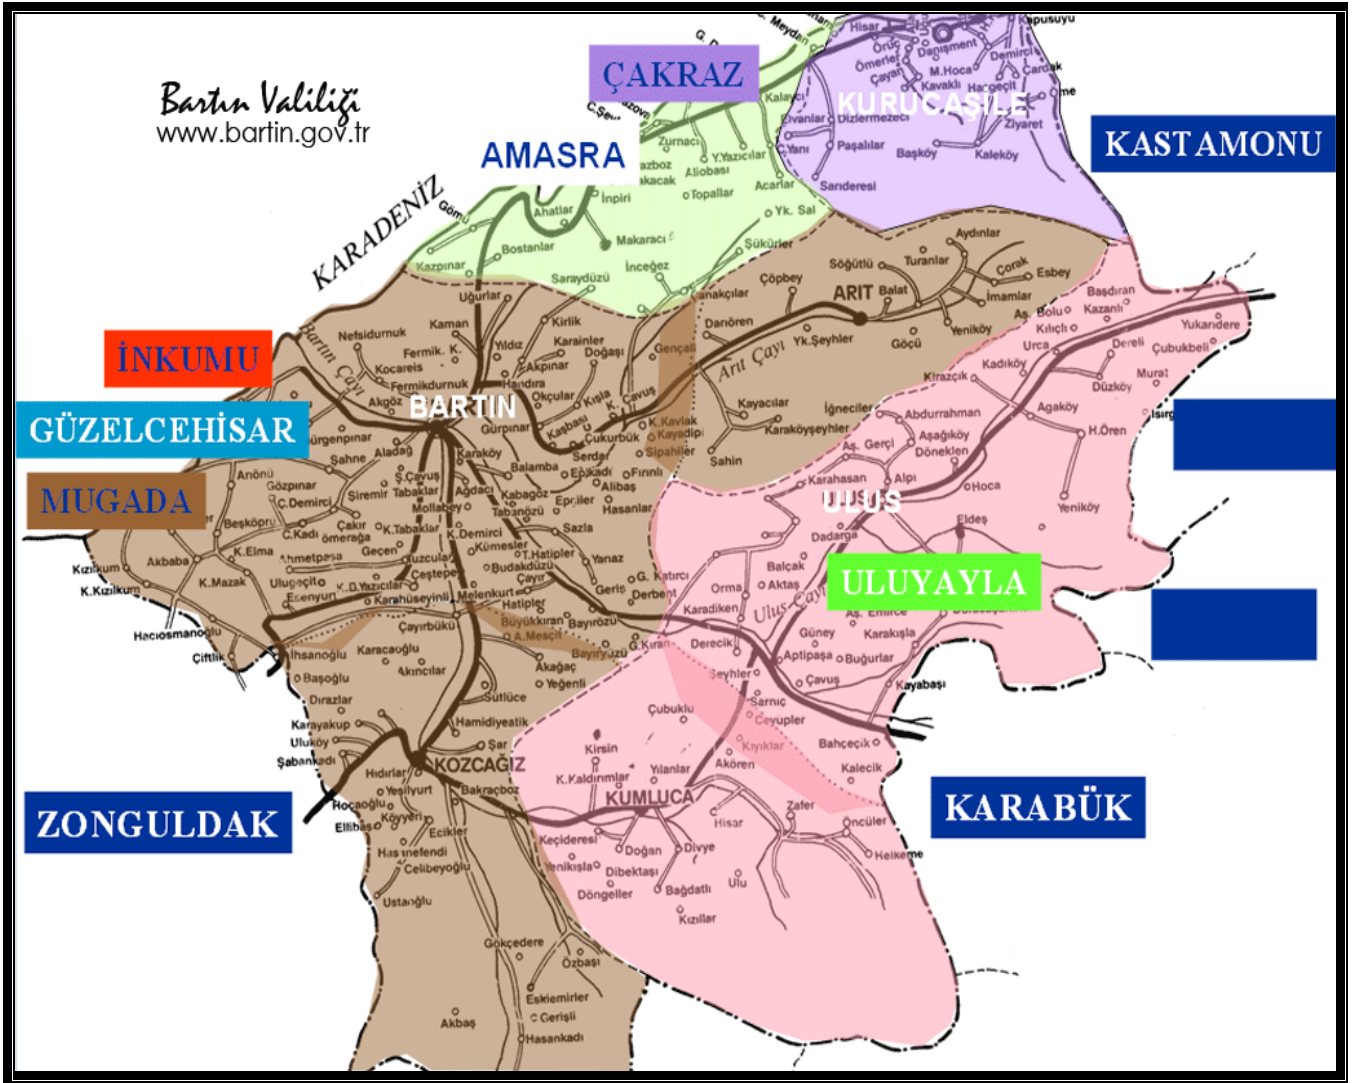

Bartın İlimiz 07.09.1991 tarih ve 20984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.08.1991 tarih ve 3760 sayılı kanun ile il statüsüne kavuşmuştur.

Bartın İlimizin;

- Merkez İlçe, Amasra İlçesi, Kurucasıle İlçesi ve Ulus İlçesi olmak üzere 4 adet İlçesi,
- Arıt, Kozcağız, Kumluca, Abdipaşa ve Hasankadı Belde Belediyeleri ile birlikte 9 adet belediyesi,
- 260 adet köyü vardır.

Bartın ilinin nüfusu 188.436 olup, nüfusun % 36,2'si (68.151) şehirde, % 63,8'i (120.285) kırsal kesimde yaşamaktadır.

2012 MALİ YILI

İDARE FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I- İİ ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon	1
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
C- İdareye İlişkin Bilgiler	2
1- Fiziksel Yapı	2
2- Örgüt Yapısı	3
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları	5
4- İnsan Kaynakları	12
5- Sunulan Hizmetler	14
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	17
D- Diğer Hususlar	17

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	18
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	19

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları	19
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	20
3- Mali Denetim Sonuçları	22

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

▪ Mali Hizmetler Müdürlüğü	23
▪ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	26
▪ Encümen Müdürlüğü	34
▪ Sağlık İşleri Müdürlüğü	38
a) Sağlık Faaliyeti	
b) Sosyal Hizmet Faaliyeti	
c) Çevre Hizmeti Faaliyeti	
▪ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	50
▪ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	69
▪ Yazı İşleri Müdürlüğü	86
▪ Hukuk Müşavirliği	97
▪ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	99
▪ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	113
▪ Dış İlişkiler Müdürlüğü	122
a) Eğitim Faaliyeti	
b) Gençlik ve Spor Faaliyeti	
c) Emniyet Faaliyeti	
d) Jandarma Faaliyeti	
e) Kültür ve Turizm Faaliyeti	
▪ İlçe Özel İdare Müdürlükleri	150
▪ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	151

2- Performans Sonuçları Tabloları

▪ Yol ve Ulaşım Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	157
▪ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	158
▪ Sağlık İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	162
▪ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	165
▪ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	166
▪ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu	167
▪ Dış İlişkiler Müdürlüğü	170
a) Eğitim Hizmetleri Performans Sonuçları Tablosu	
b) Kültür ve Turizm Hizmetleri Performans Sonuçları Tablosu	
c) Spor Hizmetleri Performans Sonuçları Tablosu	
d) Emniyet Hizmetleri Performans Sonuçları Tablosu	

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

176

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

177

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

179

B- Zayıflıklar

179

C- Değerlendirme

180

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

180

EKİ:

İç Kontrol Güvence Beyanı (14 adet)

2012 YILI FAALİYET RAPORU

I- İL ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Görev alanlarımızdaki hizmetlerimizi; mevzuatlar ve ISO 9001 Uluslar arası Kalite Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda sunmak ve halkın refah seviyesini yükseltmektir.

VİZYONUMUZ

AKTİF KATILIMCI,
İHTİYAÇ ODAKLI,
VERİMLİLİK ESASLI,
HESAP VERİLEBİLİR VE ULAŞILABİLİR
BİR ÖZEL İDARE İle BARTIN'I GELECEĞE TAŞIMAKTIR.

İLKELERİMİZ

İl Özel İdaresi, tüm personeli ile hizmet verdiği halkımızın beklentilerine karşılık verebilmek için;

Liderlik	Eşitlik ve adalet
Dürüstlük	Kalite duyarlılığı
Şeffaflık	Hizmette standardizasyon
İş ahlakı	Sürekli gelişme
Çağdaşlaşma ve ilericilik	Etkili ve ekonomik

olarak belirlediğimiz ilkelerimiz doğrultusunda özverili bir şekilde çalışmaktadır.

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Sağlık, gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra da öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER


1- FİZİKSEL YAPI

Bartın İl Özel İdaresi Hizmet Binası




2- ÖRGÜT YAPISI

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

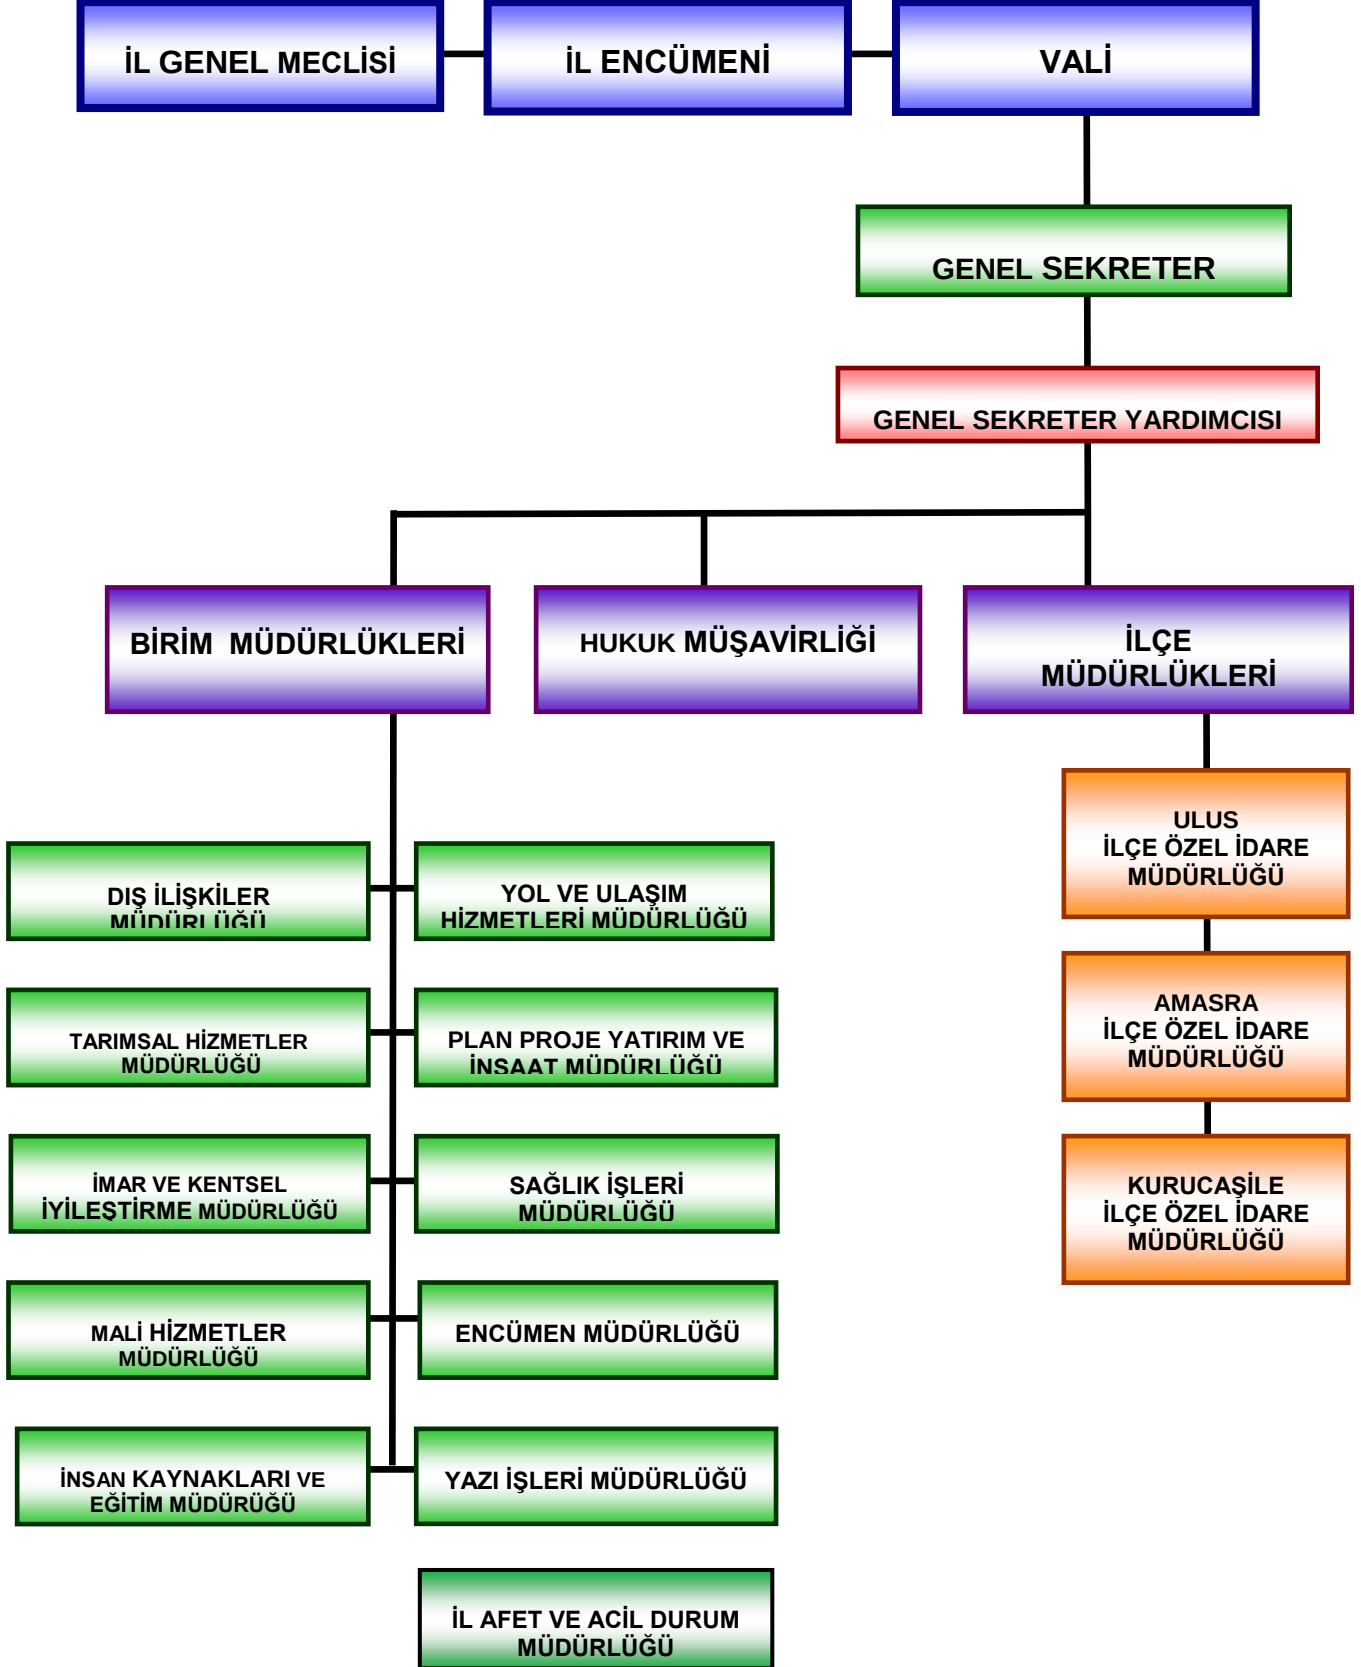

İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI:

İL Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali'dir. İl Genel Meclisi ve İl Encümeni karar organı, Vali ise yürütme organıdır. Karar ve icra organları görev ve yetkileri kapsamında işlevlerini sürdürmekte ve hizmetlerini yürütmektedir.



İL GENEL MECLİSİ:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun İl Genel Meclisi başlıklı 9. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

İL Genel Meclisinin görev ve yetkileri, meclis başkanlık divanı, meclis toplantıları, gündem, toplantı karar yeter sayısı, meclis kararlarının kesinleşmesi, İhtisas komisyonları ve denetim komisyonları v.b. konular 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

<u>İLÇELER</u>	<u>Üye Sayısı</u>
Merkez İlçe	5
Amasra İlçesi	2
Kurucaşile İlçesi	2
Ulus İlçesi	2
TOPLAM:	11

İL ENCÜMENİ:

İL Encümeni Valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. İl Özel İdaresinin icra organıdır.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. İl Encümeni, Valinin başkanlığında, **5 seçilmiş üye ve 5 atanmış üye olmak üzere 11 üyeden oluşmaktadır.**

VALİ:

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İl Özel İdaresinin icra organıdır. Hizmetlerin, diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon vali tarafından sağlanır. Vali, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, vali yardımcılara, yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevlileri ile ilçelerde kaymakamlara devredebilir. Vali, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

3- BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

Bartın İl Özel İdaresi sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili tüm çalışmalarını kamuoyuna duyurmak üzere elektronik ortama taşıyarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşlarımızın hızlı ve aracısız bir şekilde bilgi almalarını sağlamak üzere Web sayfası kurulmuştur.

İdaremizce, 2006 yılından itibaren uygulanan Analitik Bütçe-Muhasebe Programı ile 2012 Yılında Yerel Yönetim Bütçe Modülü kullanılmakta olup, İhale işlemlerinde Kamu İhale Kurumunun EKAP İhale Programı kullanılmaktadır.

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan e-İçişleri (e-Bakanlık) Projesi, İl Özel İdaremizin yürütmüş olduğu tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla idaremiz tarafından kullanılmaktadır.

e-Devlet Projeleri:

1. e-İçişleri Projesi:

- Analitik Muhasebe Modülü
- Bütçe Modülü
- Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü
- Ruhsat Modülü
- Makine İkmal Modülü
- Meclis ve Encümen Modülü
- Bilgi Edinme Modülü

2. Kurumsal Programlar:

- NetCAD Programı
- OSKA Hakediş Programı
- Şimşek Maaş Programı
- Kaspersky Business Space (Güvenlik ve Antivirüs Yazılımı)
- FortiGuard 4.0 (Donanımsal Güvenlik Duvarı)
- FortiAnalyzer (Log kayıt ve raporlama sistemi)

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

KAYNAĞIN ÇEŞİTİ	KAYNAĞIN ADEDİ
Masa Üstü Bilgisayar	100
Dizüstü Bilgisayar	27
Yazıcı	78
Tarayıcı	22
Fotokopi Makinesi	7
Tekser Makinesi	1
Faks Cihazı	3
Projeksiyon	2
Dijital Kamera	2
Fotoğraf Makinesi	4

Ayrıca, etüt ve proje hizmetlerinde kullanılan teknik nitelikte ve kalibrasyona tabi cihazlar mevcut olup, teknik cihazların çeşitleri ve adetleri aşağıda belirtilmiştir.

İl Özel İdaresi Etüt ve Proje Kaynakları

ÇEŞİTİ	ADEDİ
Hp designjet 500 ps prother yazıcı	1
Leica marka arazi ölçüm cihazı	1
Nivo arazi ölçüm cihazı	1
Mlr marka gps	1
Magellan marka gps	1
Arazi ölçümünde kullanılan mira	4
Arazi ölçümünde kullanılan leica marka aletin reflektörleri	3

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Etüt ve Proje Kaynakları

ÇEŞİTİ	ADEDİ
Magellan marka gps	1

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Araçlara Ait Envanter Cetvel

Kullanıldığı Yer	Binek	Toplu Taşıma Araçları	Kamyon / Kamyonet	İş Makineleri	TOPLAM
Valilik Hizmetleri	4	--	--	--	4
İl Özel İdaresi Hizmetleri	7	2	38	55	102
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmetleri	1		2		3
TOPLAM	12	2	40	55	109

Gayrimenkullere Ait Cetvel

Sıra No	Bulunduğu Yer	Gayrimenkulün Cinsi		TOPLAM
		Bina	Arsa-Arazi	
1	Merkez İlçe	37	19	44
2	Amasra İlçesi	6	7	12
3	Kurucaşile İlçesi	5	-	5
4	Ulus İlçesi	9	1	8
TOPLAM		57	27	69

BİNA TAŞINMAZLARI

1	Merkez	İl Özel İdare Memur Lojmn.	26	Merkez	İnşaat Ambar Bina Mülkiyeti İl Özel İdaresi -Arsa Mülkiyeti Maliye
	Kemerköprü Mah.			Çaybükü Köyü Topalalı	
2	Merkez	Özel İdare Hiz.Bin.	27	Merkez	1 Kat 110m ² İnş. Mülk. Özel İdaresi Nizamiye
	Kemerköprü Mah.			Çaybükü Köyü Topalalı	
	Çevre Yolu		28	Merkez	1 Kat 415 M ² İnş. Mülk. İl Özel İd. Büz Fabrikası
3	Merkez	Memur Lojmn .İnş. Mülkiyeti İl Öz. İd. / Arsa Mülkiyeti Maliye	29	Merkez	Kaporta-Kaynak Bin. Mülk.İl Özel İd.
	Ağdacı			Çaybükü Köyü Topalalı	
			30	Merkez	Yıkama Yağ
4	Merkez	Köy.Yön.Hiz.Sos.Tesis.3kat.1250m ² Bin.Mülk.İl Özel İd-Arsa		Çaybükü Köyü Topalalı	

2012 YILI FAALİYET RAPORU

	Ağdacı	Mülk..Maliye	31	Merkez	Isı Santrali Binası İnş. 345m²-
				Çaybükü Ky.Topalali	
5	Merkez	Bina Mülk.Özel İd. / Arsa Mülk.Maliye. / Fenlisesi Olarak Kul.	32	Merkez	Bakım Evi 142m²-1 Kat.
	Ağdacı			Çaybükü Ky.Topalali	
6	Merkez	Nizamiye Binası Mülk. Öz.İd /Arsa Mülk.Maliye	33	Merkez	Atölye İnş.1092m².-
	Ağdacı			Çaybükü Ky.Topalali	
					34
7	Merkez	Aıt Şehit Necdet İlk Öğretim Okulu Lojmanı (Bu Parsel Üzerindeki Bina Aynı Köy 463 Nolu Parselle 91.43m2 Tecavüzlüdür) Milli Eğitim Bakanlığının İzni Alınmadan Satılamaz.	35	Merkez	Akaryakıt Binası
	Menteşpiri			Çaybükü Ky.Topalali	
	Köyiçi				
8	Merkez	İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü 29/05/2009 Tarih Ve5902 Sayılı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 . Maddesi (Devir Hükümleri Başlıklı Geçici 1 Maddesi) Hükümünce İl Özel İdaresine Tahsis Edilmiştir.	36	Merkez	Kozcağız Aile Toplum Sağlığı Merkezi
				Kozcağız	
	Ağdacı				37
9	Merkez	Yeni Vali Konağı Ve Pers Lojman. Ve arsası	38	Ulus	Tek Katlı Kagit Lojman, 2 katlı Betonarme Kaymakam Lojman. Kagit Garaj Ve Arsa
	Gölbucağı				
	Aladağ Mevkii			Mengeller	
10	Merkez	Yeni Vali Konağı Ve Pers Lojman. Ve arsası	39	Ulus	Altı Dükkan 4katlı Kagit Bina İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Ve İş Hanı Binası
	Gölbucağı			Kaldırım.Mh	
	Aladağ Mevkii				
11	Merkez	Yeni Vali Konağı Ve Pers Lojman. Ve arsası	40	Ulus	Merkez Atatürk İlköğretim Okulu Ve Bahçesi
	Gölbucağı			Kaldırım.Mh	
	Aladağ Mevkii			41	Ulus
12	Merkez	Mustafa AYDEDE Anaokulu Eski Vali Konağı	42	Ulus	Hasandede İlköğretim Okul.Ve Kapalı Spor Salonu
	Göl Bucağı			Mezgeler Zb.Mev	
	Aladağ Mevkii			43	Ulus
13	Merkez	Bucak Müdürü Lojmanı	44	Ulus	Hasandede İlköğretim Okul.Ve Kapalı Spor Salonu
	Kozcağız			Mezgeler Zb.Mev	
	Değirmen Yanı				

2012 YILI FAALİYET RAPORU

14	Merkez	İnkum Çitosan 4 Blok 16 Daire	45	Ulus	Ulus Şantiyesi	
	Güzelcehisar			Kaldırım Mah.		
	Sahil Kesimi					
15	Merkez	İki Lojman Helası Ve Bahçeli Okul (Kargir)	46	Ulus	Öz-süt İşletme Binası	
	Ağdacı Mah.			Eldeş Köyü		
	Köprübaşı Mevkii					
16	Merkez	İnkum Dinlenme Tesisleri	48	Kurucaşile	Kagir 1 Katlı Lojman Garaj Ve Bahçesi (Kaymakam Lojmanı)	
	Güzelcehisar			Liman		
	Sahil Kesimi					
17	Merkez	Eski Hizmet Binası İl Kültür Turizm Müd. Kir.	49	Kurucaşile	Kagir Tek Katlı Lojman Ve Bahçesi Pers. Lojman.	
	Kırtepe Mevkii			Liman		
18	Merkez	Eski Hizmet Binası Yemekhane Müstemilat İl Kültür ve Turizm.Müd. Kir.	50	Kurucaşile	Kagir Bina Ve Arsası (Müdür Lojman.)	
	Kırtepe Mevkii			Liman		
19	Merkez	Şehirler Arası Otob. Terminali Bin.3.199,50m². ve Arsası.Bel.İşlt	52	Amasra	Kagir Bina	
	Kutlubeytabaklar			Kum Mahallesi		
20	Merkez	Bahçeli Kagir Fatih İlköğretim Okulu ve Arsası	53	Zindan Mah.	Mektep Ve Arsası	
	Orduyeri		54	Amasra	Kaymakamlık Lojmanı Ve Arsası	
				Kaleiçi Mh.		
21	Merkez	Avlulu Kagir Okul	55	Amasra	Arsa Ve Okul Binası	
	Kırtepe			Kale Şah Yarbaşı		
22	Merkez	Bahçeli Kagir İlkokul İnönü	56	Amasra	Arsa Ve Okul Binası	
	Demirciler			Kum Mh.Karaevler		
23	Merkez	Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bahçesi	57	Amasra	Amasra Çakraz Şantiyesi	
	Kırtepe			Çakrazova		
24	Merkez	Atatürk İlköğretim Okulu Bahçeli Kagir İlkokul				
	Kemerköprü					
25	Merkez	Gazi İlköğretim Okulu Ve Arsası				
	Kemerköprü Halatçıyaması					

2012 YILI FAALİYET RAPORU

TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR FORMU ARSALAR

Sıra	İlçesi	Taşınmaz Numarası	Cinsi	Pafta No	Cilt No	Yüzölçümü (m2)	Sıra	İlçesi	Taşınmaz Numarası	Cinsi	Pafta No	Cilt No	Yüzölçümü (m2)
No	Mahallesi/			Ada No	Sayfa No	Hisse	No	Mahallesi/			Ada No	Sayfa No	Hisse
	Köyü			Parsel No	Sıra No	Oranı		Köyü			Parsel No	Sıra No	Oranı
1	Merkez	1374	Arsa	4	8	292.700,00	15	Merkez	422	pilon yeri		8	17,00
	Terkehatipler Köyü				754	Tam		Terkehaliller				736	Tam
	Kum Düzü Mevki			739				Düz			731		
2	Merkez	136	Arsa		6	13.400,00	16	Merkez	1348	Arsa		8	1.311,00
	Büyükkıran Köyü				547	Tam		Terkehatipler				752	Tam
				92				Yağcılar Mevkii			722		
3	Merkez	856	Arsa	E28C 19D	6	18.090,37	17	Merkez	1293	Tek Katlı Betonarme Fabrika Binası ve Tek Katlı Betonarme Ofis Binası ve Arsası	E28C 22B-E28C 17C	8	23.802,55
	Büyük Kıran Köyü			...	550	Tam		Terkehatipler			101	758	Tam
				558				Yağcılar Mevkii			2		
4	Merkez	857	Arsa	E28C 19D	6	13.960,83	18	Merkez	1348	Arsa	E28c1 7C	8	6.250,00
	Büyük Kıran Köyü			...	551	Tam		Terkehatipler			102	759	Tam
				559				Yağcılar Mevkii			1		
5	Merkez	1956	Arsa	E28C 19D	6	54.942,11	19	Merkez	118	Tarla		8	1.500,00
	Büyük Kıran Köyü			...	554	Tam		Yanaz				722	Tam
				562				Evaltı			704		
6	Merkez	136	Arsa	E28c1 9c	6	18.450,00	20	Ulus	220	Arsa	2	3	1.267,00
	Geriş Ky			...	539	Tam		Kaldırım Mah.			3	205	Tam
				322				Kaşaltı Mevkii			40		
7	Merkez	150	Arsa	...	6	860,59	21	Amasra		Arsa		21	167,00
	Geriş Ky			...	569			Zindan Mah.				1993	
				566		28/860					1996		
8	Merkez	133	Tarla	...	6	73,70	22	Amasra	183	Tarla	15	8	770,00

2012 YILI FAALİYET RAPORU

	Geriş Ky			...	594	Tam	2	Hisarönü				738	
				579							741		
9	Merkez		Arsa	...	16	2.608,00	2	Amasra			15	8	850,00
	Gölbucağı			511	1513	Tam		Hisarönü				739	
		1933		251					4	Tarla	742		
10	Merkez		Arsa	2	3	8.480,00	2	Amasra			15	8	620,00
	Güzelcehisar				224	Tam		Hisarönü				746	
	İnkumu	1458		224					129	Tarla	749		
11	Merkez		Arsa	2	21	5.578,23	2	Amasra			15	8	4.320,00
	Güzelcehisar				2020	Tam		Kayaaltı				770	
	İnkumu	2302		2292					5	Tarla	773		
12	Merkez		Arsa		17	547,50	2	Amasra			15	8	4.360,00
	Kemerköprü			89	1575	Tam		Kayaaltı				772	
	Şiremirçavuş	1743		121					104	Tarla	775		
13	Merkez		Tarla	4	3	26.390,00	2	Amasra			15	8	2.900,00
	Kutlubey Demirci				238	Tam		Kayaaltı				773	
	Mısırlık	522		242					6	Tarla	776		
14	Merkez		Tarla		6	558,97							
	Kutlubey Tabaklar				499	Tam							
	Düz	1098		496									

2012 YILI FAALİYET RAPORU


4- İNSAN KAYNAKLARI

Merkez ve ilçeler itibariyle idaremizde;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi toplam **119 adet** kadro bulunmaktadır. Bu kadrolardan, dolu kadro sayısı **51 adet** ve boş kadro sayısı ise **68 adettir**.

- 4857 sayılı İş Kanununa tabi toplam **113 adet daimi işçi** görev yapmaktadır.

- **17 adet sözleşmeli personel** çalışmaktadır.




Merkez ve 3 İlçe Özel İdaresi dâhil 119 mevcut memur kadrosu bulunmakta olup, Bu kadroların 65'i Genel İdare Hizmetleri, 1'i Avukatlık Hizmetleri, 28'i Teknik Hizmetler, 10'u Sağlık Hizmetleri ve 15'i Yardımcı Hizmetlerdir. **İdaremizde, memur, işçi ve sözleşmeli kadrosunda toplam olarak çalışan personel sayısı 181 adettir.** İl Özel İdaresi personel tablosu aşağıda gösterilmiştir.

	GİH	AH	TH	SH	YH	TOPLAM
NORM KADRO DAĞILIMI	65	1	28	10	15	119


	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
DOLU KADROLARIMIZ	51	17	113	181

2012 YILI FAALİYET RAPORU


İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü Personel Durum Cetveli



İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü Personel Durum Cetveli Arama Kurtarma Ekibi



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Personel Durum Cetveli İl Afet Ve Acil Durum Yönetimi Merkezi



5- SUNULAN HİZMETLER:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 6 ncı maddesin de belirtilen görev ve sorumluluklarımız ile diğer mevzuatlar gereği yapmak zorunda olduğumuz görev ve sorumluluklarımız için yapılan tüm iş ve işlemler ile yürütülen hizmetler, tabi olduğumuz kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ v.b. hükümlerine göre yerine getirilmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresi teşkilatı başlıklı 35. maddesi gereğince, İdaremiz de genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, encümen, yazı işleri, yol ve ulaşım, plan proje yatırım ve inşaat, dış ilişkiler ve hukuk işleri birimleri kurulmuştur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi İl Genel Meclisinin Kararıyla yapılmıştır. Ayrıca, İlçelerde, Özel İdare işlerini yürütmek amacıyla Kaymakama bağlı olarak Amasra, Kurucaşile ve Ulus İlçe Özel İdare Müdürlükleri kurulmuştur.

İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanarak 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda idaremizde kurumsallaşma tamamlanmıştır.

İl Özel İdaresinin kadrolarının iptali, ihdası ve değiştirilmesi İl Genel Meclis kararıyla yapılmakta, İl Özel İdaresi personeli vali tarafından atanmakta ve ilk toplantıda İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmaktadır.

İlimiz İl Özel İdaresi kadroları, 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda oluşturularak İl Genel Meclisine sunulmuş, İl Genel Meclisinin muhtelif tarih ve sayılı kararıyla gerekli ihdaslar yapılmıştır.

Hukuk Müşavirliği:

- İdarenin tüm birim müdürlükleri tarafından talep edilen konularda hukuki görüş vermek.
- İdareye ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek.
- İdare ve bağlı birimlerin ihale kanunları ve ihale sözleşme tasarıları ile ilgili inceleme yapmak ve görüş bildirmek.
- Her türlü yargı organı ve icra daireleri ile noterler tarafından İl Özel İdaresi'ne izafeten İl Özel İdaresi Tüzel Kişiliği'ne yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek.
- Sendika ile toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak.
- Vali, Genel Sekreter ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak
- Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
- Birimi ile ilgili dönemler halinde Faaliyet Raporları hazırlamak ve Üst Makama sunmak,
- Birimi ile ilgili dönemler halinde Birim Performans Planını hazırlamak ve Üst Makama sunmak,
- Birimi ile ilgili Yıllık Yatırım Programı hazırlamak ve Üst Makama sunmak.

İlçe Müdürlükleri:

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde İl Özel İdaresi organlarınca alınan kararlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek.
- 5018 sayılı kanun gereği muhasebe yetkilisi görevlerini yürütmek.
- Mevzuat gereği, Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek
- İl Özel İdaresi'nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi, evrak, rapor vb. çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek.
- İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak.

Birim Müdürlükleri:

1) Mali Hizmetler Müdürlüğü

- Muhasebe Hizmetleri
- Bütçe
- Gelir
- Taşınır ve Taşınmaz İcmal Hesabı
- Stratejik Plan
- Ön Mali Kontrol

2) Yol ve Ulaşım Müdürlüğü

- Yol ve Ulaşım Hizmetleri
- Satın alma
- Makine İkmal Bakım ve Onarım
- Maden İşleri
- KÖYDES Projesi

3) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

- İmar İskân
- Çevre Koruma, Kontrol
- KUDEP
- Emlak

- Binalar
- Yapı Ruhsat Kontrol ve Denetim

4) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

- Veterinerlik
- Bitki Koruma
- Kontrol ve Destek
- Hayvan Sağlığı
- Çiftçi Eğitim
- Toprağın Korunması ve Erozyon
- Tahlil ve Analiz
- Sulama İşleri
- İşyeri Ruhsat ve Denetim
- Park ve Bahçe İşleri
- İçme suyu hizmetleri

5) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

- Özlük
- Atama
- Personel İşleri
- Eğitim
- Bilgi İşlem - BİMER
- Basın ve Halkla İlişkiler
- İşçi Sağlığı ve Güvenliği
- Mikro Kredi

6) Dış İlişkiler Müdürlüğü

- Eğitim Hizmetleri
- Gençlik ve Spor Hizmetleri
- Kültür ve Turizm Hizmetleri
- Emniyet Hizmetleri
- Jandarma Hizmetleri
- Çevre ve Orman Hizmetleri
- Sanayi ve Ticaret Hizmetleri
- Organize Sanayi Hizmetleri

7) Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

- İnşaat inceleme ve kontrol
- Makine inceleme ve kontrol
- Elektrik inceleme kontrol
- Etüt-Proje
- Yapı Kontrol ve Denetim
- İçme suları inceleme kontrol
- Köylere Yardım

8) Encümen Müdürlüğü

- İl Encümeni iş ve işlemleri

9) Yazı İşleri Müdürlüğü

- İl Genel Meclisi iş ve işlemleri
- Evrak Kayıt İşlemleri
- Arşiv
- Özel Kalem İş ve İşlemleri
- Sosyal Tesisler

10) Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

- Sağlık Hizmetleri
- Sosyal Hizmetleri
- Çevre Hizmetleri

11) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Ön Malî Kontrol başlıklı 58 inci maddesi

“Ön Malî Kontrol Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.

Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî kontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir. “ hükmü,

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin Ön Mali Kontrol Süreci başlıklı 12 inci maddesi “ Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemten önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.” hükmü gereğince, idaremizce Süreç Akış Şeması düzenlenmiştir.

İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenerek, Valilik Makamının 15.01.2008 tarih ve 246 sayılı Olur’ları ile yürürlüğe giren Süreç Akış Şemasına göre, mali hizmetler ve harcama birimlerince yapılan iç kontrol ve ön mali kontrol işlemleri devam etmektedir.

D- DİĞER HUSUSLAR:

17 Haziran 2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun ilgili hükümlerine göre; idaremiz bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurulmuştur. Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür.

Ancak, İl Özel İdarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

2012 Mali Yılı Stratejik Plan, Performans Planı, Yatırım ve Çalışma Programı, Gider Bütçesi ve Faaliyet Raporunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün plan, program, ödenek ve faaliyetleri de yer almaktadır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

KURUMSAL YAPILANMA	1- Kurumda tüm çalışanların yetkinliklerini, bilinç düzeylerini, organizasyon ve yönetme kabiliyetlerini, kişisel gelişimlerini, araç ve gereç kullanma artırmak, bilinç düzeylerinin Liderlik uygulamalarını üst düzeye çıkarmak amacıyla, işlerin zamanında etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için yöneticilerin otoritelerini, yaptırım güçlerini ve iş yaptırma yeteneklerini arttırmak. 2- Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kamunun İhtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina yapımı ve onarımı, tesisat bakım onarım çalışmaları yürütülecektir.
BEŞERİ KALKINMA	1- Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak. 2- Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile çocuk sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine süratli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak. 3- Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, mevcut bina, tesislerin bakım ve onarımını yapmak. 4- İlimizde spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymak, spor tesisi sayılarını ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltmak, mevcut spor tesislerimizi günümüz şartlarına uygun hale getirmek için bakım, onarım ve tamiratlarının yapılarak hizmete sunup, daha çok federasyon spor faaliyeti organize edip, ilimize maddi ve manevi spor turizmi girdisini artırmak. 5- İl'de sosyal, kültürel ve sanat yaşamını zenginleştirmek ve kent kültürünü geliştirmek; unutulmaya yüz tutmuş folklorik değerleri araştırarak tespitini yapmak ve güncel yaşama kazandırmak. 6- Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kır- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır. 7- Afet öncesi hazırlığı ve müdahaleyi etkili kılmak, Afet Yönetiminde bireylerin kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almalarını vurgulamak, Sivil Savunma hizmetlerinde gönüllü personellerin artırılarak afet çalışmalarında başarı grafiğinin yükseltilmesini sağlamak. 8- Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması

2012 YILI FAALİYET RAPORU

KIRSAL KALKINMA	1- İnsan sağlığını ön planda tutan çevreyle uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek 2- Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir. 3- Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. 4- Kent ve çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması, kaçak yapılaşmayı maksimum düzeyde engellemek sureti ile kontrollü ve yerel mimari özelliklere bağlı estetik kaygı gözeterek yapılaşmanın aynı düzeyde sağlanması
------------------------	--

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

İl Özel İdaresinin görev alanındaki hizmetlerimizi tabi olduğumuz mevzuatlar doğrultusunda sunmak ve halkın refah seviyesini yükseltmek temel politikamızdır. İl Özel İdaremiz kıt kaynaklarına rağmen, yapmış olduğu tüm hizmetleri tecrübeli ve bilinçli personeli ile yürütmekte ve modern bir Bartın için çalışmalarını sürdürmektedir. Hizmetlerimizin etkili, ekonomik ve verimli olabilmesi için; ihtiyaçlarımızdan öncelikli olanları tespit etmekte ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmekteyiz. Bartın İlinin, sosyal, ekonomik, turizm ve tarım potansiyeli göz önünde bulundurularak, nüfus projeksiyonlarına göre temel politikalarımızın önceliklerini belirlemek.

Ayrıca, İl Özel İdaresi olarak, Stratejik Plan, Performans Planı, Çalışma ve Yatırım Programı, Faaliyet Raporları, Denetim Raporları, yapılan iş ve işlemler ile yürütülen hizmetler İdaremiz sitesinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

- Bütçe Uygulama Sonuçları:

2012 mali yılı tahmini bütçesi **19.491.500,00 TL.** olarak düzenlenmiş, önceki yıldan devir olunan **14.621.579,02 TL.** Bakanlıklardan tahsisli olarak aktarılan ödenek **24.619.671,48TL** olmak üzere 2012 yılı itibarıyla toplam **58.732.750,50 TL.** bütçe ödeneği gerçekleşmiş ve **% 72,5** oranında harcama yapılmıştır.

2012 mali yılına ait gelir, gider ve ödeneklerle diğer mali bilgileri içeren tablolar aşağıda sunulmuştur.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Temel Mali Politikalara İlişkin Açıklamalar:

GELİR - GİDER BÜTÇESİ BİLGİLERİ

GİDER BÜTÇESİ		
PERSONEL GİDERİ	6.319.760,68	32,4 %
MAL VE HİZMET ALIM (CARİ) GİDERLERİ	3.719.645,32	19,1 %
SERMAYE (YATIRIM) GİDERLERİ	9.452.094,00	48,5 %
TOPLAM	19.491.500,00	100,0 %

GİDER BÜTÇESİ		
VERGİ GELİRLERİ	20.000,00	0,1 %
SERMAYE GELİRLERİ	1.635.500,00	8,4 %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.157.000,00	5,9 %
DİĞER GELİRLER	16.679.000,00	85,6 %
TOPLAM	19.491.500,00	100,0 %

31.12.2012 tarihi itibarıyla;

A- GELİR (Öz Kaynak):

EKONOMİK	AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Yıl İçinde Yapılan Tahsilat	ORAN
1.6	Harçlar	20.000,00	11.880,00	59,4%
3.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	557.000,00	2.445.398,59	439,0%
3.6	Kira Gelirleri	600.000,00	533.541,03	88,9%
5.1	Faiz Gelirleri	1.425.000,00	1.168.975,62	82,0%
5.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.004.000,00	14.118.745,54	94,1%
5.3	Para Cezaları	110.000,00	141.518,77	128,7%
5.9	Diğer Çeşitli Gelirler	140.000,00	145.464,87	103,9%
6.1	Taşınmaz Gelirleri	1.635.500,00	0	0,0%
TOPLAM		19.491.500,00	18.565.524,42	95,2%

2012 YILI FAALİYET RAPORU

B- GELİR (Dış Kaynak):

EKONOMİK	AÇIKLAMA	Yıl İçinde Yapılan Aktarma
04.2.1.51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	1.576.364,00
04.2.1.99	Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	22.937.463,44
04.2.2.99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	105.844,04
04.4.1.102	Kişilerden alınan yardım ve bağışlar	0,00
TOPLAM		24.619.671,48

C- GELİR-GİDER (Toplam Kaynak)

GELİR – GİDER İCMAL CETVELİ		
GELİRİN ÇEŞİDİ	GELİR	GİDER
ÖZ KAYNAK	18.565.524,42	18.489.177,08
DIŞ KAYNAK	24.619.671,48	24.094.700,72
TOPLAM KAYNAK	43.185.195,90	42.583.877,80

A- GİDER (Öz Kaynak):

ÖZKAYNAK HARCAMALARININ İCMALİ		
PERSONEL GİDERİ	6.678.111,67	36,1 %
MAL VE HİZMET ALIM (CARİ) GİDERLERİ	4.055.720,03	21,9 %
SERMAYE (YATIRIM) GİDERLERİ	7.755.345,38	41,9 %
TOPLAM	18.489.177,08	100,0%

B- GİDER (Dış Kaynak):

DIŞKAYNAK HARCAMALARININ İCMALİ		
PERSONEL GİDERİ	9.135.524,22	37,9%
MAL VE HİZMET ALIM (CARİ) GİDERLERİ	7.285.183,65	30,2%
SERMAYE (YATIRIM) GİDERLERİ	7.673.992,85	31,8%
TOPLAM	24.094.700,72	100,0%

2012 YILI FAALİYET RAPORU

C- GİDER (Toplam Kaynak):

TOPLAM HARCAMALARIN İCMALİ		
PERSONEL GİDERİ	15.813.635,89	37,1 %
MAL VE HİZMET ALIM (CARİ) GİDERLERİ	11.340.903,68	26,6 %
SERMAYE (YATIRIM) GİDERLERİ	15.429.338,23	36,2 %
TOPLAM	42.583.877,80	100,0 %

Harcamalara Ait Özet Bilgi

NOT: Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden devredilen memur ve işçi personellerin giderlerinin tamamı Maliye Bakanlığı tarafından dış kaynaktan karşılanmayıp, 1/3 oranında İl Özel İdaresi tarafından öz kaynaktan karşılanmaktadır.

NOT: İlköğretim Kurumları ile Ortaöğretim Kurumlarının taşınalı eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dış kaynaktan karşılanmakta ve cari giderler içerisinde yer almaktadır.

- Mali Denetim Sonuçları:

Dış Denetim:

İl Özel İdaresinin 2009 mali yılı dönemine ait gelir-gider ve 12 aylık ödeme evrakları Sayıştay Başkanlığınca talep edilmesi sonucu, idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce, denetlenmek üzere 18.06.2010 tarih ve 3574 sayılı yazı ile Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. Denetim sonucu düzenlenen Denetim Raporu idaremize ulaşmış, ilgililerce savunma yapılmış ve temyize gidilmiştir. 2009 yılı ilam tebliğleri ilgililere tebliğ edilmiştir.

Ayrıca; 2012 mali yılının ilk altı aylık dönemini kapsayan denetim 2012 yılı içerisinde, ikinci altı aylık dönemini kapsayan denetim ise 2013 yılı Şubat ayında yapılmış olup, Denetim Raporu henüz idaremize ulaşmamıştır.

İç Denetim:

5302 sayılı yasa gereğince, 2011 mali yılı gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemleri İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından 2012 yılı içerisinde denetlenerek, 14.03.2012 tarihli denetim raporu İl Genel Meclis Başkanlığını bilgilendirilmek ve görüşülmek üzere Nisan 2012 ayı toplantı oturumuna sunulmuştur.

Ayrıca; 2012 mali yılına ait gelir-gider, hesap iş ve işlemlerinin denetimi, İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından devam etmektedir.

Denetim Sonucu:

İl Özel İdaresi iş ve işlemleri ile ilgili yapılan her türlü iç ve dış denetim sonucu düzenlenen denetim raporları ve sorgularda konusu suç teşkil eden herhangi bir olay ile karşılaşılmamıştır.


B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresi Teşkilatı başlıklı 35. maddesi gereğince 2006 yılında kurulmuştur.

Birimimiz; Muhasebe, Bütçe ve Gelir bölümlerinden oluşmakta ve birimimizde tüm iş ve işlemler ile yürütülen hizmetler;



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği gibi diğer yönetmelik, genelge ve tebliğlerle idaremize verilen görev, yetki ve sorumluluklardan mali konularla ilgili tüm iş ve işlemler, kayıtlar, raporlar ve planlar birimimizce yürütülmektedir. Ayrıca, birimlere talepleri halinde yazılı ve sözlü olarak görüş verilmekte ve yine talepleri üzerine mali konularda gereken destek gösterilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali Hizmetler Birimi başlıklı 60 ıncı maddesinde Mali Hizmet Biriminin görevleri belirtilmiştir.

- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

- İdarenin Stratejik Plan, Performans Planı, Çalışma ve Yatırım Programı ve Bütçesini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

2012 YILI FAALİYET RAPORU

- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri ve talepler dikkate alınarak ödenek tahsis etmek, ödenek aktarmak veya ödenek gönderilmesini sağlamak.

- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının takip ve tahsili ile ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak,

- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak,

- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

- Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

- İl Özel İdaresi **2011 Mali Yılı Yönetim Dönemi Hesabı** birimimizce düzenlenerek, 31.01.2012 tarihinde Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.

- İl Özel İdaresi **2011 Mali Yılı Kesin Hesabı** İl Genel Meclisinin 05.06.2012 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Kesin Hesap Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.

- İdareimiz harcama birimlerince düzenlenen Birim Faaliyet Raporları, konsolide edilerek İl Özel İdaresi **2011 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu** düzenlenmiş, İl Genel Meclisinin 06.03.2012 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilerek, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.

- İl Özel İdaresi **2009-2013 yıllarını kapsayan 5 Yıllık Stratejik Planda** güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulması üzerine üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine katkı ve görüşleri alınarak güncelleme yapılmış ve İl Genel Meclisinin 22.11.2011 tarih ve 73 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

- İl Özel İdaresi **2013 Mali Yılı Performans Planı** düzenlenerek, İl Genel Meclisinin 22.11.2012 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

- İl Özel İdaresi **2013 Mali Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi** hazırlanarak, İl Genel Meclisinin 23.11.2012 tarih ve 66 sayılı kararı ile de kabul edilmiş ve 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

- İl Özel İdaresi **2013 Mali Yılı İl Özel İdaresi Yatırım ve Çalışma Programı** birimimizce hazırlanarak, 21.11.2012 tarih ve 62 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

- Birimimizce, idaremiz harcama birimlerinden gelen tüm gelir-gider iş ve işlemleri ile diğer mali iş ve işlemler **Maliye Bakanlığı Say-2000i** sistemine aylık olarak girilmektedir.

- 2012 Mali Yılı içerisinde mevzuat gereği 689.787,72 TL.'lik **kanuni pay ödemesi** yapılmıştır.

- İlimiz Merkez ve İlçelere bağlı 260 adet köy ve 52 adet mahalle olmak üzere toplam 312 adet **muhtara ait ödenekler banka hesap numaralarına yatırılmıştır.**


- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” gereğince birimimizce tüm harcamalara ilişkin Ödeme Emri Belgeleri ve Muhasebe İşlem Fişleri ile eki kanıtlayıcı belgeler üzerinde harcama öncesi “**Ön Mali Kontrol**” görevi birimimizce yerine getirilmektedir.

- **Ödenek Gönderme Belgesi** düzenlenerek, mali yıl sonu itibariyle merkez ve ilçelere **42.583.877,80 TL.** tutarında ödenek gönderilmiştir.

- Ay sonu, mali yılbaşı, mali yılsonu, devreden ve imha edilen ödenek iş ve işlemleri, aktarılan ve gönderilen ödenekler, gelir kayıtları, gelir-ödenek kayıtları, taşınır mal iş ve işlemleri, emanet hesaplarına alınma ve reddi yatlar, teminat mektubu alınma ve iadeleri, avans verilmesi ve mahsup işlemleri, icra, temlik ve haciz işlemleri, vergilerin ve diğer kanuni kesintilerin ödenmeleri gibi tüm mali iş ve işlemler birimimizce yürütülmekte ve elektronik ortamda çalışmakta olduğumuz bakanlık programına girilmektedir.

Özetle; 2012 Yılı Çalışma ve Yatırım Programında bulunan proje sayısı 91 adet olup, yıl içerisinde 56 adet proje programa eklenmiş ve toplamda 147 adet proje olmuştur. 147 adet projeden ise 26 adedi programdan çıkarılmış olup, 31.12.2012 itibariyle 121 adet proje mevcuttur.


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP CETVELİ



2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 5 adet doğrudan temin yöntemi ile alım yapılmıştır.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

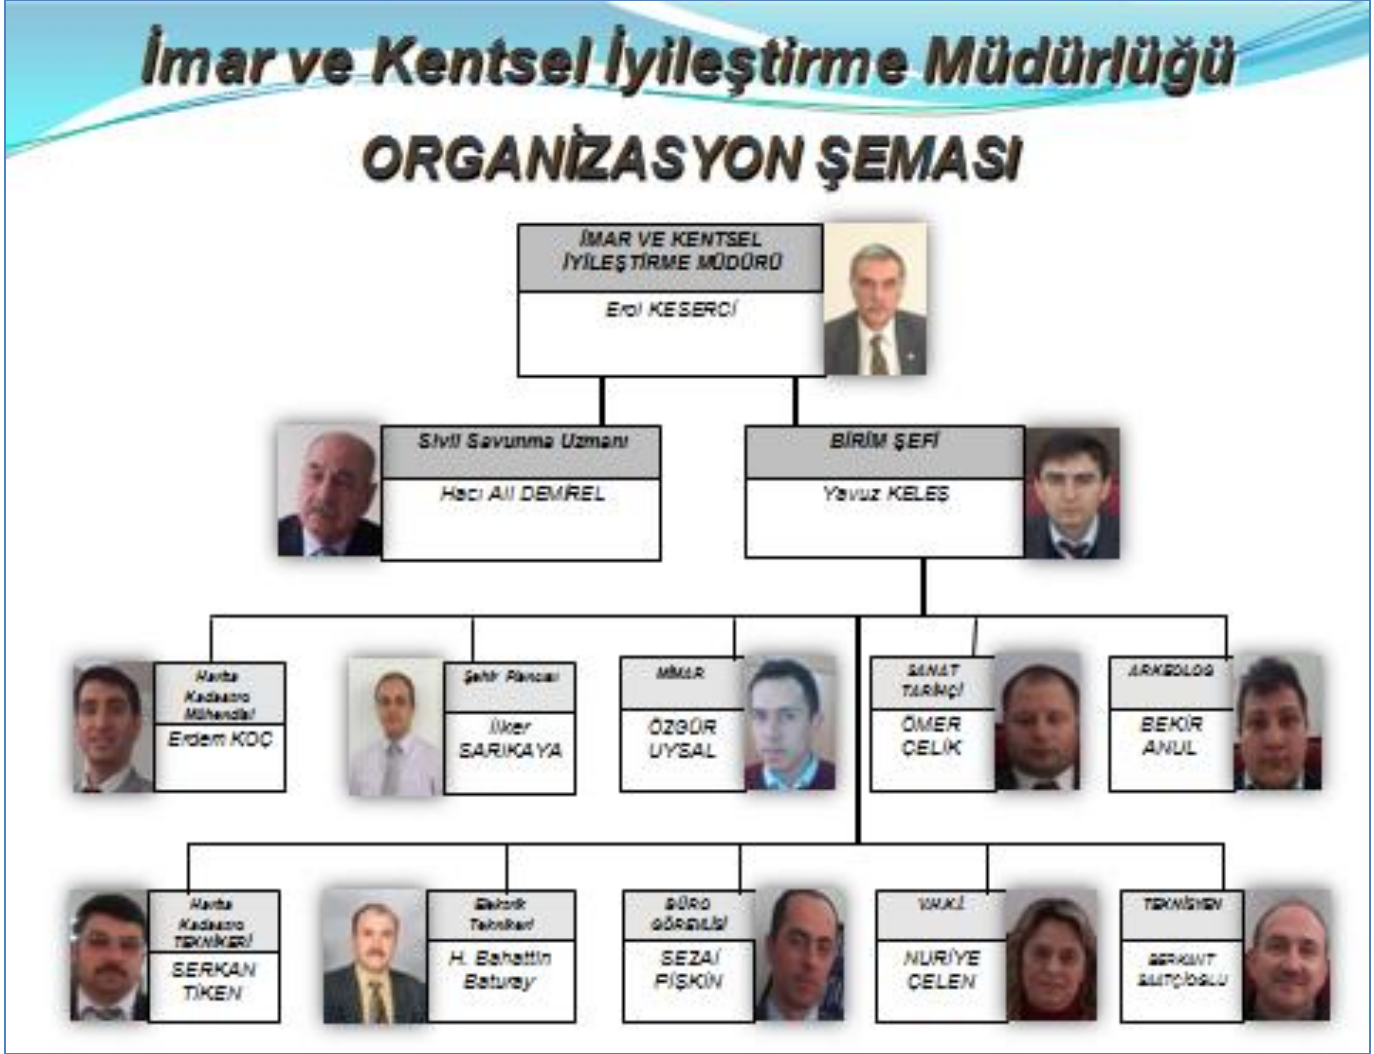

2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 15 adet doğrudan temin,
21/f maddesine göre 1 adet,
3/e maddesine göre 2 adet ve
19. maddesine göre 1 adet ihale yapılmıştır.

1- İnşaat İzni ve Ruhsat İşlemleri: 2012 yılı içerisinde 258 kişi inşaat yapımı için müracaatta bulunmuş olup başvuruların **162 adedi İmar Mevzuatı çerçevesinde inşaat yapmaya uygun görülmüş** 96 adedi ise inşaat yapmaya uygun bulunmamıştır.

162 adet proje isteme yazısı yazılmış ve 159 proje onayı yapılmıştır. 17 adet müracaata ise 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre uygun olmadığından, müracaat sahiplerine iade edilmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

İnşaat izni verilen yapı sahiplerinden 125 adedi inşaatlarını tamamladığına dair müracaatta bulunmuş olup, müracaat sahiplerinden 93 adedine yapı kullanım izni verilerek alt yapı hizmetlerinden faydalanması uygun görülmüştür. 32 adedine ise, inşaatın projesine uygun yapılmadığı veya iskâna hazır olmaması gerekçesi ile yapı kullanım izni verilmemiştir.

<u>İnşaat Başvurusu</u> 258	<u>İnşaat İzni</u> 162	<u>Yapı Kullanma İzni</u> 93
<u>İnşaat Ruhsatı</u> 16	<u>İskan Ruhsatı</u> 8	

2- Yıkım Kararları :

3194 sayılı kanun hükümlerine aykırı olması nedeniyle izinsiz ve kaçak yapılan iş ve işlemler

<u>İdari Para Cezası</u> 19	<u>Alınan Yıkım Kararı</u> 16	<u>Yıkılan Yapı Sayısı</u> 7
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

3- Hali Hazır Harita Yapımı:

2012 yılı içerisinde, vatandaşlarımız tarafından 2 Adet hayvancılık tesisi amaçlı, 1 adet konut amaçlı, 1 adet eğitim tesisi amaçlı, 1 adet Bartın katı atık bertaraf tesisi amaçlı olmak üzere toplam 5 adet, İdareimiz tarafından ise 1 adet Güzelcehisar Koruma Amaçlı İmar Planı amaçlı, 1 adet Bartın yeni çevreyolu projesi amaçlı olmak üzere toplam 2 adet, genel olarak **toplamda 7 adet hâlihazır harita tamamlanmıştır.**

4- Adrese Dayalı Kayıt Sistemi:

Bartın İli'ne bağlı Tüm Köylerin Adres/Numaralandırma işlemleri tamamlanarak, kapı Numaraları Köy Muhtarlarına teslim edilerek Köylerde bulunan yapıların numaralandırılması sağlanmıştır.

2012 yılında 327 adet konut ve müştemilatına kapı numarası verilmiş olup, Adres Veri Kayıt sistemine dahil edilmiştir. Yapılan yeni konut ve kayıtlarına göre sistem sürekli güncellenmektedir.

5- Orman İzin Haritaları:

İdareimiz tarafından Abdipaşa belediyesinde bulunan okul alanının genişletilmesi amacıyla hazırlanan Orman İzin Haritası tamamlanmış olup, ilgili idarelere gönderilmiştir.

KÖYDES projesi kapsamında; Geriş-Yanaz, Ören, Özbaşı köylerine ait içmesuyu yatırımları için orman izin haritaları yapılmış ve ilgili idarelere gönderilmiştir.

6- Çevre Düzeni Planı Çalışmaları:

Müdürlüğümüzde 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ihale edilmiş olup, 2010 yılı içerisinde fiziki gerçekleştirmesi tamamlanmıştır.

Ancak, 1/25.000 ölçekli ÇDP çalışmaları neticesinde, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiş, ÇDP değişikliği Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmuş olup 24.06.2011 tarihinde onaylanmış, 03.05.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revizesi yapılmıştır. 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Ağustos ve Eylül aylarında ilgili meclislerde görüşülmüş olup, onaylanması için 12.10.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir.



7- İmar Planı Çalışmaları:

2012 yılı içerisinde, vatandaşlarımız tarafından 3 adet hayvancılık tesisi amaçlı, 1 adet eğitim tesisi amaçlı, 1 adet Bartın katı atık bertaraf tesisi amaçlı toplam 5 adet İmar Planı hazırlanmış, İdaremiz tarafından Eğitim Tesisi amaçlı Ağdacı Mahallesinde İmar Planı, Yine Ağdacı Mahallesinde Sosyo, Kültürel Tesis ve Resmi Kurum Amaçlı İmar Planı ve Kutlubeytabaklar Köyünde Resmi Kurum ve Ticaret Alanı Amaçlı İmar Planı hazırlanmıştır.

8- Diğer Çalışmalar:

İdaremiz tarafından Çakrazşeyhler Köyü Kanalizasyon Projesi, mevcut İmar Planı ile entegre edilerek söz konusu projenin düzenlenmesi sağlanmıştır.

Arıönü Köyü Mugada Sahil kesiminde bulunan mevcut imar uygulaması yerinde aplike edilerek yapılacak olan üst ve altyapı projelerinin hazırlanması için gerekli koşullar sağlanmıştır.

İdaremiz tarafından hazırlatılan İmar Planlarına göre bahse konu alanların imar uygulamaları tamamlanmıştır.

9- Güzelcehisar Köyü Hisar Mahallesi 1. derece Arkeolojik ve 1. derece Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmaları:

Güzelcehisar Köyü Hisar Mahallesi 1. Derece Arkeolojik ve 1. Derece Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı'nın fiziki gerçekleştirmesi 2011 yılında tamamlanmış olup, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülmüş, İl Genel Meclisimiz tarafından onaylanmış ve askı süresine müteakip yürürlüğe girmiştir.

GÜZELCEHİSAR KÖYÜ (BARTIN)

1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

PLAN ÖLÇEĞİ=1/1000

GÖSTERİM


SINIRLAR
PLANLAMA SINIRLARI
 ●●● 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
 KURUMA AMAÇLI İMAR PLANI ONAMA SINIRI
 ●●●● 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI

ÖZEL KOSULLU ALAN SINIRI
 --- KİYİ KENAR ÇİZGİSİ (KKÇ)
 SAHİL ŞERİDİ
 --- +50
 --- +100


KORUMA ALANLARI
SİT KORUMA ALANLARI
 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
 (YAPI YASAKLI ALAN)

PLAN NOTLARI

1. ANKARA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU' NUN 16.12.1988 GÜN VE 605 SAYILI KARARI İLE 1.DERECE DOĞAL SİT ALANI KİYİ KESİMİNİN HEMEN DOĞUSUNDA YER ALAN SAĞIRAN MEVKİİ İSE 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLMİŞTİR. ANCAK ARKEOLOJİK SİTİN KADASTRO DIŞI ALANDA YER ALMASINA RAGMEN KARAR EKI KADASTRAL PAFTALARDA YAYLIŞ VERDE GÖSTERİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN YERİNDE YAPILAN TESPİTLE ANKARA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULUNUN 17.01.2003 GÜN VE 8377 SAYILI KARARI İLE SİT SINIRLARI KADASTRAL SINIRLARA UYACAK ŞEKİLDE DÜZELTİLMİŞTİR.
2. PLAN ONAMA SINIRI, ANKARA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULUNUN 17.01.2003 GÜN VE 8377 SAYILI KARARI İLE BELİRLİDİR 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRIDIR.
4. PLANLAMA ALANININ TAMAMI YAPI YASAKLI ALAN OLUP 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇERİSİNDE KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULUNUN İZİN OLMADAN HERHANGİ BİR UYGULAMA YAPILAMAZ.
4. BİTKİ ÖRTÜSÜ, TOPOGRAFYA, SİLÖET ETKİSİNİ VE TARİHİ DOKUYU BOZABİLECEK, TAHRİBATA YÖNELİK HİÇBİR EYLEMDE BULUNULAMAZ.
5. İLGİLİ KURUMLARIN İZİN ALINMADAN ORMAN AGACI ÖZELLİĞİNDEKİ AĞAÇLARIN KESİMİ KESİNLİKLE YASAKTIR.
6. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE VE KİYİLERDE, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ VE KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ONAYI ALINMADAN, DOĞAL KİYİ ÇİZGİSİNİ DEĞİŞTİRECEK HİÇ BİR KAZI VE DOLGU YAPILAMAZ, HADEİ OCAĞI KURULAMAZ, KİYİDAN KUM, ÇAKIL, SAZ, YOSUN ÇEKİLEMEZ, GEREK KİYİLERDE, GEREKSE PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE MOLOZ, ÇURUF, ÇÖP VB. DOKULEMEZ.
7. BU PLAN VE PLAN NOTLARINDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA:
 - 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (5226 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK) VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
 - KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI
 - 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
 - KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULANMASI, DENETİMİ VE MÜELLEFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AIT YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
 - 644 SAYILI KANUN HÜKÜMÜNDE KARARNAME, İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
 - 3621 SAYILI KİYİ KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
 - 6532 SAYILI ORMAN KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

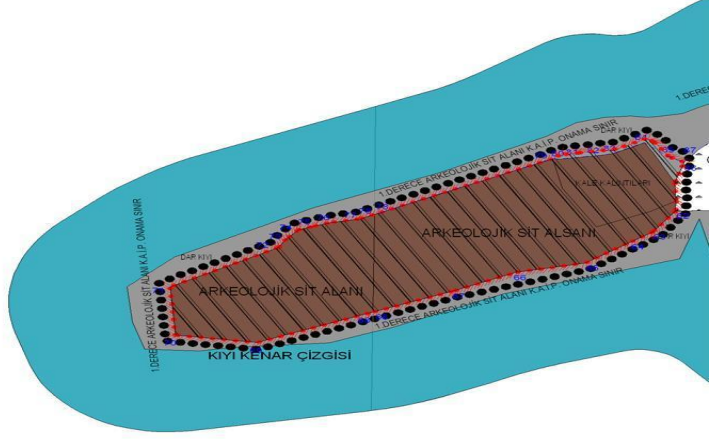

1. Derece Doğal Sit Alanı için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı onaylanmak üzere Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından değerlendirilmiş, plan ve görüşlerde bir takım değişiklikler istenilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

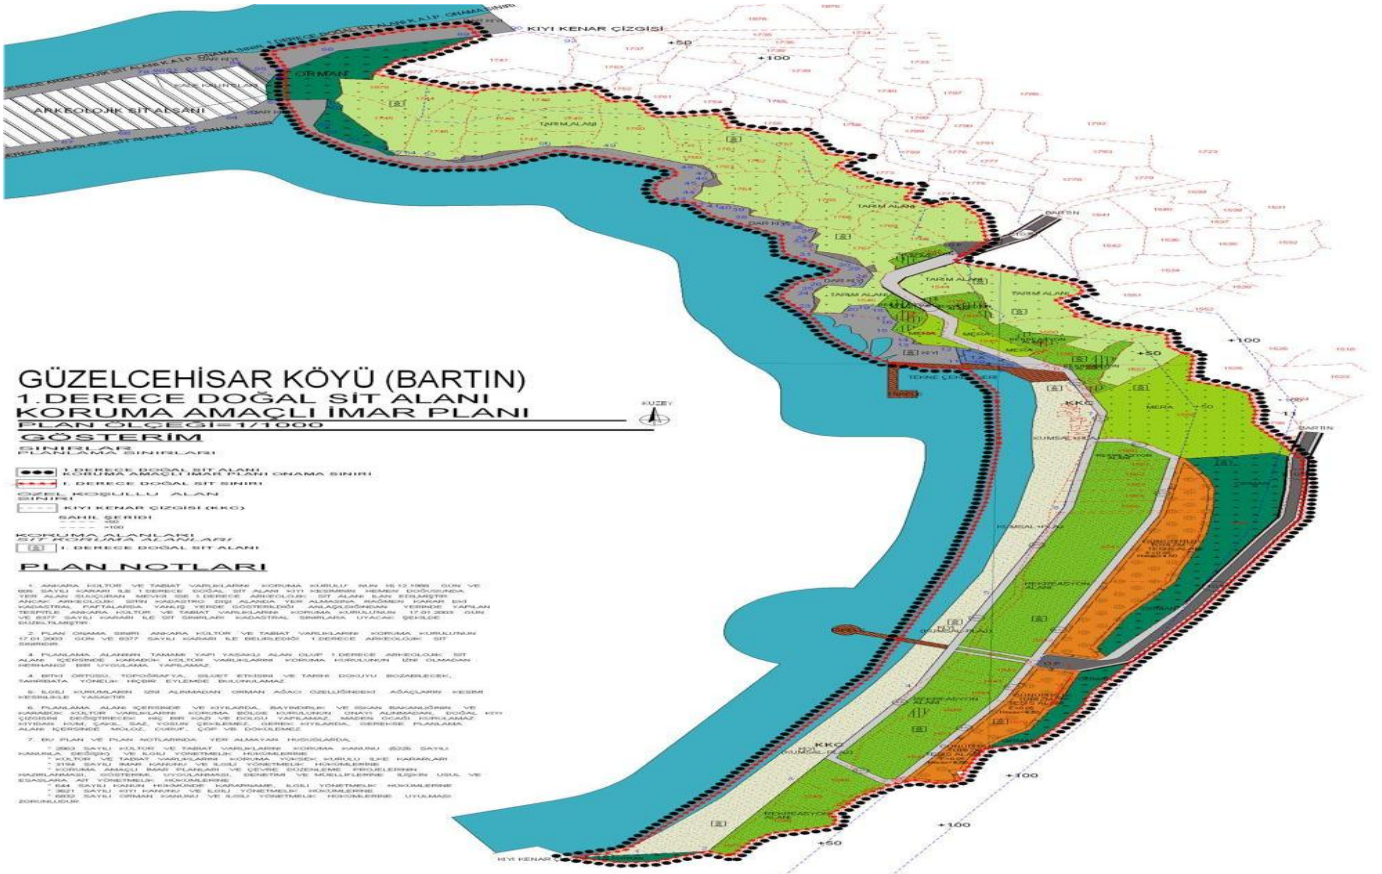


10- Parsel Çalışmaları

2012 yılı itibariyle; 63 adet ifraz,
8 adet tevhit,
1 adet geçit hakkı,
2 adet yola terk,
177 adet hisseli satış ve
45 adet imar planı ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.

11- Köy Yerleşik Alanı Tespit Çalışmaları:

31.12.2012 itibariyle **138 adet köyün köy yerleşik alan** çalışmaları yapılmış olup, 2012 yılında ise 22 adet köyün yerleşik alanı hazırlanmış olmakla birlikte 648 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca onaylanmayı beklemektedir.

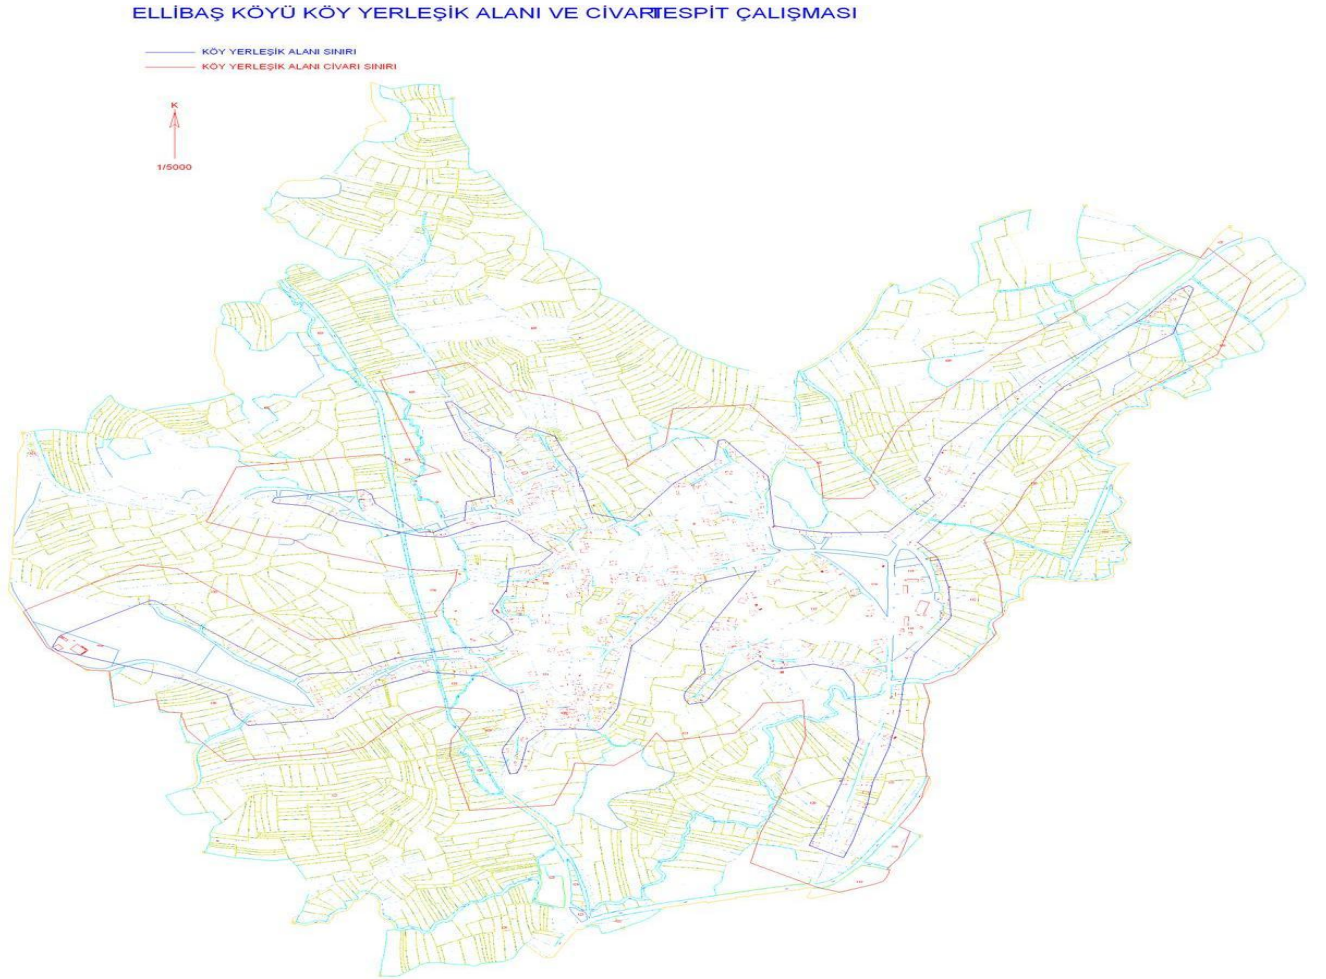

12 - Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı İle İlgili Çalışmalar:

2012 yılı içerisinde **131.620,85 TL** olmak üzere toplamda **522.101,74 TL**. tahsilat yapılmıştır. 2007 yılında Bartın Belediye Başkanlığına Samancıoğlu Kent Müzesi Sokak İyileştirme Projesine **44.735,00 TL'lik ödenek** kullanıldıktan sonra 31.12.2012 tarihi itibariyle **479.096,68 TL**. katkı payı hesaplarımızda mevcuttur.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

YILLAR	MİKTAR
2005	38.505,16
2006	41.497,39
2007	23.546,34
2008	19.227,20
2009	35.289,35
2010	66.191,88
2011	166.223,57
2012	131.620,85
TOPLAM	522.101,74
KULLANILAN	44.735,00
KALAN	479.096,68

Ayrıca; Amasra Kalesi ile Bartın İl Özel İdaresi Eski Hizmet Binası Röleve-Restitüsyon-Restorasyon çalışmaları yatırım programına alınmış olmakla birlikte bu konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

13- Mülkiyeti İdaremize Ait Taşınmazların Kiralama İşleri:

a) Merkez İlçede Yer Alan Taşınmazlar:

Mülkiyeti İdaremize ait, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan

- A- 9 nolu işyeri 04.04.2012
- D-11 nolu işyeri 05.03.2012
- A- 2 nolu işyeri 06.07.2012
- A- 3 nolu işyeri 06.07.2012
- D- 4 nolu işyeri 09.07.2012
- 2 nolu WC 06.06.2012 tarihlerinde toplam 6 adet işyeri, sözleşmeleri imzalanarak kiraya verilmiştir. İdaremiz hizmet binasında bulunan çay ocağı 09.04.2012 tarihinde kiraya verilmiştir.

b) İlçelerde Yer Alan Taşınmazlar:

Mülkiyeti İdaremize ait, Kurucaşile Müdür Lojmanı, 23.05.2012 tarihinde Kurucaşile Belediye Başkanlığına kiraya verilmiştir.

Mülkiyeti İdaremize ait, Kurucaşile İlçesi Özel İdare Sitesi 1., 2., ve 3., katlar 21.03.2012 tarihinde Kurucaşile Öğretmenevine kiraya verilmiştir.

Mülkiyeti İdaremize ait, Kurucaşile İlçesi Özel İdare Hizmet Binası 2. katı 29.02.2012 tarihinde Kurucaşile İlçe Halk Kütüphanesine kiraya verilmiştir.

Mülkiyet İdaremize ait, Hasankadı Sağlık Ocağının 3, 4 ve 11 nolu odaları 29.08.2012 tarihinde Dr. Recep ACIBAL'a kiraya verilmiştir.

Mülkiyeti İdaremize ait, Kurucaşile İlçesi Özel İdare Müdür Lojmanı Kurucaşile Köylere Hizmet Götürme Birliğine 21.10.2012 tarihinde kiraya verilmiştir.

Mülkiyeti İdaremize ait, Ulus İlçesi Özel İdare Hizmet Binası İşhanı 1.katı 5 nolu dükkan avukat Elmire TUGUŞ'a 07.11.2012 tarihinde kiraya verilmiştir.

Mülkiyeti İdaremize ait, Ulus İlçesi Özel İdare Hizmet Binası İşhanı Zemin kat 1 nolu işyeri Hatice DENİZLİ'ye 26.09.2012 tarihinde kiraya verilmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU


14. Sivil Savunma Faaliyetleri:

Planın Adı	Hazırlama veya Güncelleme Yılı	Onay veya Güncelleme Tarihi
Sivil Savunma Planı	2012	09.01.2012
Sabotajlara Karşı Koruma Planı	2012	22.06.2012
24 Saat Devamlı Çalışma Planı	2012	15.05.2012
Yangın Söndürme Yönergesi	2012	23.02.2012
Afetlerde Sivil Savunma İcra Planı	2012	14.06.2012
Yedeklik Devresi Yükümlüleri Erteleme İşlemleri Denetleme Sonuç Raporu	2012	26.01.2012
Seferberlik Eğitimi	2012	16.11.2012
Seferberlik Denetimi	2012	07.11.2012
Seferberlik Savaş Hali Hazırlıkları Toplantısı	2012	30.04.2012
Afetler Acil Yardım ve Kurtarma Ek. Gör. Çalışma Talimatı	2012	06.03.2012
Afetler Acil Yardım Planı	2012	04.01.2012
Afetler Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi	2012	18.06.2012
Afetlerde Kurtarma Ekibi Çalışma Talimatı	2012	13.03.2012
Seferberlik Duyuru Planı	2012	30.11.2012
Sefer Görev Emri	2012	25.01.2012
Personel Erteleme Planı	2012	20.01.2012

Not: 1) Planların hazırlanmasında münferit yazışmalar dikkate alınmıştır.

2) Kuruma ait **162 adet yangın tüp dolumu** yapılmış ve yıllık kontrolleri ise 22.06.2012 tarihinde yapılmıştır.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP CETVELİ

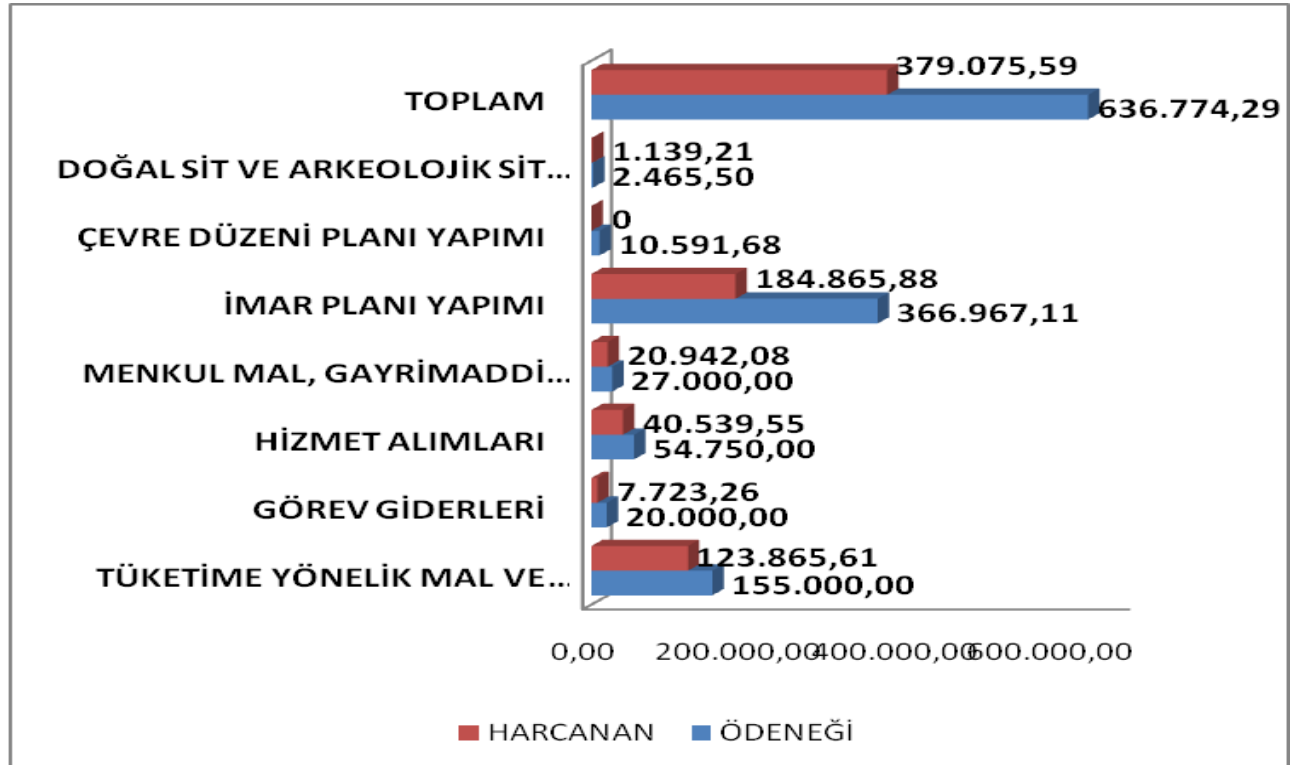


2012 YILI FAALİYET RAPORU

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA MASASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER VE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARCA (TL)	NAK Dİ Gerç. %	FİZİK İ Gerç. %	
1	DİĞER KAMU HİZMETLERİ		5	İMAR PLANI YAPIMI	İl Geneli	150.000,00	-	150.000,00	102.666,00	100	100	İmar planlarının yapılması için gerekli olan jeolojik-jeoteknik etüt raporu işi 102.666+kdv bedel ile ihale edilip işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmış, 09.11.2012 tarihinde iş teslim edilmiş, onay mercii olan kurum tarafından 25.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.
2	DİĞER KAMU HİZMETLERİ		5	YÖRESEL MİMARİYE UYGUN PROJE YAPIMI	İl Geneli	25.000,00	-	25.000,00	6.000,00	100	100	Projeler 2.400,00 ve 3.600,00 + kdv bedeller ile tamamlanmış olup kabul komisyonunca kabul edilmiş ve halkımıza bedelsiz olarak sunulmuştur.
3	DİĞER KAMU HİZMETLERİ		5	1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI	Merkez	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı il genel meclisi ve belediye meclislerinin ağustos ve eylül aylarında görüşülmüş olup, bakanlıkça da onayına müteakip çalışmalara başlanacaktır.
4	DİĞER KAMU HİZMETLERİ		5	GELİŞMİŞ OLAN 10 ADET KÖYÜN PLANLARININ YAPILMASI	İl Geneli	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2012 yılı yatırım programında yer alan Gelişmiş olan 10 adet köyün planlarının yapılması projesi, İmar Planı Yapımı Projesi içerisinde gerçekleştirildiğinden, proje Bartın İl Genel Meclisinin 10.01.2013 tarih ve 6 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
5	DİĞER KAMU HİZMETLERİ		5	1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI	Ulus	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	ZBK Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının onayından sonra İdaremizce yapılması planlanan ve 2012 yılı yatırım programında bulunan Merkez ve Ulus İlçeleri 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 644 sayılı KHK'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan 7. maddenin 3. fıkrasında (3) birinci fıkranın a bendinde belirtilen ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planları bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. büyükşehir belediyeleri içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri büyükşehir olmayan illerde ise bakanlık yapar,yaptırır ve onaylar hükmü gereği söz konusu proje Bartın İl Genel Meclisinin 10.01.2013 tarih ve 6 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ



5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Encümeni başlıklı 25 inci maddesi gereğince oluşturulan İl Encümeni; Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 26 ncı maddesi hükümleri gereğince, görev ve yetkisinde bulunan konularda karar almak amacıyla ve yine kanunun İl Encümeni başlıklı 27 nci maddesinde belirtildiği üzere haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanmıştır.

Vali tarafından hazırlanan gündem gereği, görev ve yetkisinde bulunan muhtelif konularda görüşülerek kararlar alınmış ve alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanmıştır.


5'i İl Genel Meclisi Üyelerinden, 5'i ise Vali tarafından İdaremiz Birim Müdürleri arasından seçilerek oluşan, Başkanlığını Sayın Valimizin, yokluğunda da Genel Sekreterimizin yürüttüğü **İl Encümeni 2012 yılı içerisinde toplam 298 adet konuyu görüşerek karara bağlamıştır.**

2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 1 adet doğrudan temin yöntemi ile alım yapılmıştır.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KESİN HESABI



Ağustos-Aralık 2012

İl Encümeni Başkanı Sayın Bülent SAVUR Bartın Valisi

İl Encümeni Atanmış Üyeleri:

Mali Hizmetler Müdürü
Encümen Müdürü
Yazı İşleri Müdürü
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü

İl Encümeni Seçilmiş Üyeler:

Ali KARTAL
Sefai DİKYURT
Kenan DURSUN
Uğur TİMUR
Atnen AYDOĞAN

2012 YILI FAALİYET RAPORU

01 OCAK – 31 ARALIK 2012 İTİBARIYLA YILLIK ENCÜMEN KARARLARI DAĞILIMI

SIRA NO	BİRİMİ	İdari Para Cezası	Kiralama ve Satış	Genel Konular	İfraz, Tevhit ve Yola Terk	Kaçak İnşaat Yıkımı	İnceleme	Yardımlar	Ödenek Aktarma	Yatırım Programı	TOPLAM
1	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	24	50	18	76	23	1			1	193
2	Mali Hizmetler Müdürlüğü		3	8			4		11	10	36
3	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	6		9			2				17
4	Dış İlişkiler Müdürlüğü			7						12	19
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			2							2
6	Encümen Müdürlüğü			8							8
7	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü							3			3
8	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		3	7			1		2		13
9	Yazı İşleri Müdürlüğü			1							1
10	Sağlık İşleri Müdürlüğü			5							5
TOPLAM		30	56	66	76	23	8	3	13	23	298

2012 YILI FAALİYET RAPORU

İL ENCÜMENİ TOPLANTILARI



01 Ocak-14 Nisan 2012

İL Encümeni Başkanı Sayın İsa KÜÇÜK Bartın Valisi

15 Nisan-31 Aralık 2012

İL Encümeni Atanmış Üyeleri:

Mali Hizmetler Müdürü
Encümen Müdürü
Yazı İşleri Müdürü
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü

İL Encümeni Seçilmiş Üyeler:

Sefai DİKYURT
Recep KANTARCIOĞLU
Uğur TİMUR
Mehmet Ali UĞUR
Musa GÜRÜZ

İL Encümeni Atanmış Üyeleri:


Mali Hizmetler Müdürü
Encümen Müdürü
Yazı İşleri Müdürü
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü

İL Encümeni Seçilmiş Üyeler:

Ali KARTAL
Sefai DİKYURT
Kenan DURSUN
Uğur TİMUR
Atnen AYDOĞAN

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

ORGANİZASYON ŞEMASI



2012 yılı Çalışma ve Yatırım Programı ve Performans Planında 6 adet proje hedeflenmiş, 6 adet de ek proje olmak üzere toplam 12 adet proje bulunmaktadır.

- Sağlık Hizmetlerinde: 3 adet
 - Sosyal Hizmetlerde: 6 adet
 - Çevre Hizmetlerinde: 3 adet
- olmak üzere **TOPLAM: 12 adet**

1- Hasankadı Beldesi Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi Yapımı İşi:

31.01.2012 tarihinde 359.000,00TL ihale bedeli ile Özbulut Yapı Taah. İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. uhdesinde kalmış olup firma ile sözleşme düzenlenmiş ve işin yapımına 14.03.2012 tarihinde başlanmıştır. 120 gün içinde bitirilmesi hedeflenen işin fiziki gerçekleşmesi % 100 olup **20.06.2012 tarihinde yapımı tamamlanmış ve şu anda sağlık hizmeti verilmektedir.**

2012 YILI FAALİYET RAPORU



2012 YILI FAALİYET RAPORU



2- İlimize Merkez ve İlçelerdeki Plajı Olan Köylerimiz İçin Sürücülü Çöp Aracı Kiralanması İşi:

İl genelinde ve 12 adet köy sahil plajlarından günde 117 ton olan evsel atığın ortalama 50 tonu İdaremize ait 2 (iki) adet 6 m3 araç ve kiralama yaptığımız 13 m3 çöp aracı ile gerçekleştirildi.

Ayrıca; İş-Kur Müdürlüğü ve Kurumumuz arasında imzalanan **Toplum Yararına Çalışma Projesi** kapsamında Köy plajlarının standartlarının yükseltilmesi ve sağlık açısından temizliğin ön planda tutulması amacı ile ücretleri İş-kur tarafından karşılanan **6 adet personel plaj temizliğinde 90 gün süre ile çalıştırılmıştır.**

2012 YILI FAALİYET RAPORU



Çöp Konteynırı Alımı İşi:

Köylerde öncelikle okulların, Pazar kurulan köyler ile sahil köylerinin çöp konteynırı ihtiyacını karşılamak üzere **68 adet 800 Lt.'lik Çöp Konteynırı** alımı yapılarak, **36 adet köye dağıtımı tamamlanmıştır.**

2012 YILI FAALİYET RAPORU

KONTEYNİR DAĞITIMI YAPILAN KÖYLERİMİZ

SIRA NO	KÖYÜ ADI	ADET
1	Merkez Güzelcehisar Köyü Muhtarlığına	7
2	Merkez Aydınlar Köyü Muh. (okul,pazaryeri)	2
3	Merkez Küçükkızılkum Köyü Muhtarlığına	3
4	Merkez Özbaşı Köyü Muhtarlığına (okul)	1
5	Merkez Yanaz Köyü Muhtarlığına (okul)	1
6	Merkez Bedil Köyü Muhtarlığına (okul)	1
7	Merkez Kocareis Köyü Muhtarlığına (okul)	1
8	Merkez Karahüseyinli Köyü Muhtarlığına (okul)	1
9	Merkez Serdar Köyü Muhtarlığına (okul)	2
10	Merkez Tabanözü Köyü Muhtarlığına (Emri Mah)	1
11	Merkez Gürgenpınarı Köyü Muhtarlığına (okul)	1
12	Merkez Kayadibikavlak Köyü Muh. (Merkez mah)	1
13	Merkez Şahin Şahin Köyü Muhtarlığına (okul)	1
14	Merkez Geriş Köyü Muhtarlığına (okul)	1
15	Merkez Epçiler Köyü Muhtarlığına (okul)	1
16	Merkez Sipahiler KöyüMuhtarlığına (okul)	1
17	Merkez Kaşbaşı Köyü Muhtarlığına (okul)	1
18	Merkez Akpınar Köyü Muhtarlığına (okul)	1
19	Merkez Yeşilkaya Köyü Muhtarlığına (okul)	1
20	Merkez Karainler Köyü Muhtarlığına (okul)	1
21	Merkez Yıldız Köyü Muhtarlığına (okul)	1
22	Merkez Akçalı Köyü Muhtarlığına (okul)	1
23	Merkez Akbaş Köyü Muhtarlığına (okul)	1
24	Merkez Ecikler Köyü Muhtarlığına (okul-pazaryeri)	5
25	Merkez Sütlüce Köyü Muhtarlığına (okul)	1
26	Merkez Göçgündemirci Köyü Muhtarlığına(okul)	1
27	Amasra Çakrazşeyhler Köyü Muhtarlığına	5
28	Amasra Çakrazova Köyü Muhtarlığına	3
29	Amasra Tarlagzı Köyü Muhtarlığına	3
30	Amasra Akkonak Köyü Muhtarlığına	2
31	Amasra Göçkün Köyü Muhtarlığına	2
32	Amasra Çakrazboz Köyü Muhtarlığına	3
33	Amasra Hatipler Köyü Muhtarlığına	3
34	Amasra Gömü Köyü Muhtarlığına	2
35	Kurucaşile Sarıdere Köyü Muhtarlığına(okul)	1
36	Ulus Zafer Köyü Muhtarlığına(okul,pazaryeri)	4
	TOPLAM	68 adet

2012 YILI FAALİYET RAPORU

4- Sosyal Hizmetler Gönüllülüğü Sisteminin Oluşturulması İşi:

İdaremizin www.bartinozelidare.gov.tr web sitesine duyuru hazırlandı. Duyuru ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Bunun sonucunda, şu ana kadar başıboş hayvanların bakımı ile muhasebe ve işletme alanında ders vermek isteyen 2 adet gönüllü başvuruda bulunmuş olup, faal olarak 1 adedi başıboş hayvanlarla ilgili çalışması devam etmektedir.

Gönüllü olmak ister misiniz?



5- Bartın Sahil Köyü Plajlarının Hizmet Kalitesinin Ve Turizm Bilincinin Arttırılması Projesi:

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından teklif çağrısına çıkılan Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde % 57 finans destekli kabul görmesi sonucu uygulamaya başlanıldı. Proje bedeli 170.923.03 TL.' den;

BAKKA DESTEĞİ %57 : 90.366,70 TL.
ÖZEL İDARE DESTEĞİ % 43 : 68.170,91 TL.

olmak üzere toplam : 158.537,61 TL.'lik harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında yapılan faaliyetler; öncelikle 12 adet köy sahilinin turizm sezonunda çöplerden arındırmak amacıyla;

- 1) 13+1,5 m³ hidrolik sıkıştırırmalı çöp aracı 93 gün süre ile kiralandı.



2012 YILI FAALİYET RAPORU

- 2) Plaj temizliklerinin ardından halk sağlığını korumak amaçlı **uçan ve yürüyen haşerelere karşı ilaçlama** yapıldı.



- 3) Sahil köylerimizdeki işletmeci ve köy halkına işletmecilik ve turizm üzerine eğitim desteği sağlandı.



- 4) Sahillerimizdeki turistlerin can güvenliği açısından **Çeken Akıntıya Karşı görsel bez afiş** basımı yapıldı.



2012 YILI FAALİYET RAPORU

5) Engelliler için Kumsalda ve Plajda Gidebilen, su üzerinde yüzen **14 adet Tekerlekli Sandalye** alındı.



Proje hedefi; köy plajlarının turizm hizmet kalitesinin artırılması, ayrıca özürlü WC-soyunma kabini-duş-özürlü şezlongundan oluşan yerlerin yapılması ile engelli plaj kullanıcılarının sosyal hayata katılımları sağlanmış olacaktır.

6) Turizm potansiyeli yüksek olan sahillerimizin hizmet kalitesi ve turizm bilincini artırmak amaçlı, İlimiz sahil köylerinden;

- Merkez İlçemizde; Hatipler, Büyükkızılkum, Arıönü (Mugada) ve Güzelcehisar Köylerimiz,
- Amasra İlçemizde; Bozköy ve Göçgündemirci Köylerimiz,
- Kurucaşile İlçemizde; Kapısuyu ve Ovatekkeönü Köylerimizdeki

sahillerinde Kabin (WC, bay-bayan duş, soyunma kabini) yapılması çalışmaları devam etmektedir.



7) Hanımeller Yöresel El Sanatları Projesi:

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından teklif çağrısına çıkılan Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde İl Özel İdaresi olarak, Bartın Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa “**Hanımeller Yöresel El Sanatları**” projesi % 90 finans destekli kabul görmesi sonucu uygulamaya başlanıldı. İdareimizce projeye 6.000,00 TL eş finansman sağlanarak proje hesabına aktarılmıştır.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Bu proje ile Bartın'da kadınların bölge kültürünün bir simgesi olan tel kırma işini öğrenerek ekonomiye katkıda bulunmaları ve sosyal hayata katılımının sağlanması hedeflenmiş olup, yaklaşık 4 yıldır mikro kredi verdiğimiz bayanlar ve Halk Eğitim Merkezinde kurs alan bayanların bir araya gelerek dernek kurup şu anda internetten ürün pazarlaması yapmaktadırlar.



8) Sosyal Hizmetlere Erişim Sağlamak Üzere Araç Kiralanması:

Sosyal hizmetlerde erişimi sağlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar **55 günlük bir adet binek aracı kiralaması yapılarak Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edildi.**

Bunun sonucunda, 3 aylık dönemde bakım ücreti alan özürünün yeniden değerlendirilmesi amacıyla **255 adet kişiye erişim sağlanmıştır.**

9) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bina Onarımı:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre Açık Usul İhale Usulü ile 24.09.2012 tarihinde 73.700,00TL ihale bedeli ile Erdoğan ÇAKIR'ın uhdesinde kalmıştır. Söz konusu firma ile sözleşme düzenlenmiş ve işin yapımına 19.10.2012 tarihinde başlanmıştır. 45 gün içinde bitirilmesi hedeflenen işin fiziki gerçekleşmesi % 100 olup, 17.12.2012 tarihinde yapımı tamamlanmıştır.



2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 13 adet doğrudan temin,
21/f maddesine göre 2 adet ve
19. maddesine göre 6 adet ihale yapılmıştır.


10) İmar Planı ve Zemin Etüdü Yapımı:

Mülkiyeti Maliye hazinesine, kullanım hakkı İl Özel İdaresine ait Ağdacı mevkindeki yaklaşık 61.000 m² arsanın sosyal hizmet ve idari amaçlı uygulamalı imar planı ve zemin etüdü yaptırıldı.

11) Huzurevi Binası Onarımı:

Mevcut binanın TV sistemi yenilenmiştir.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KESİN HESABI

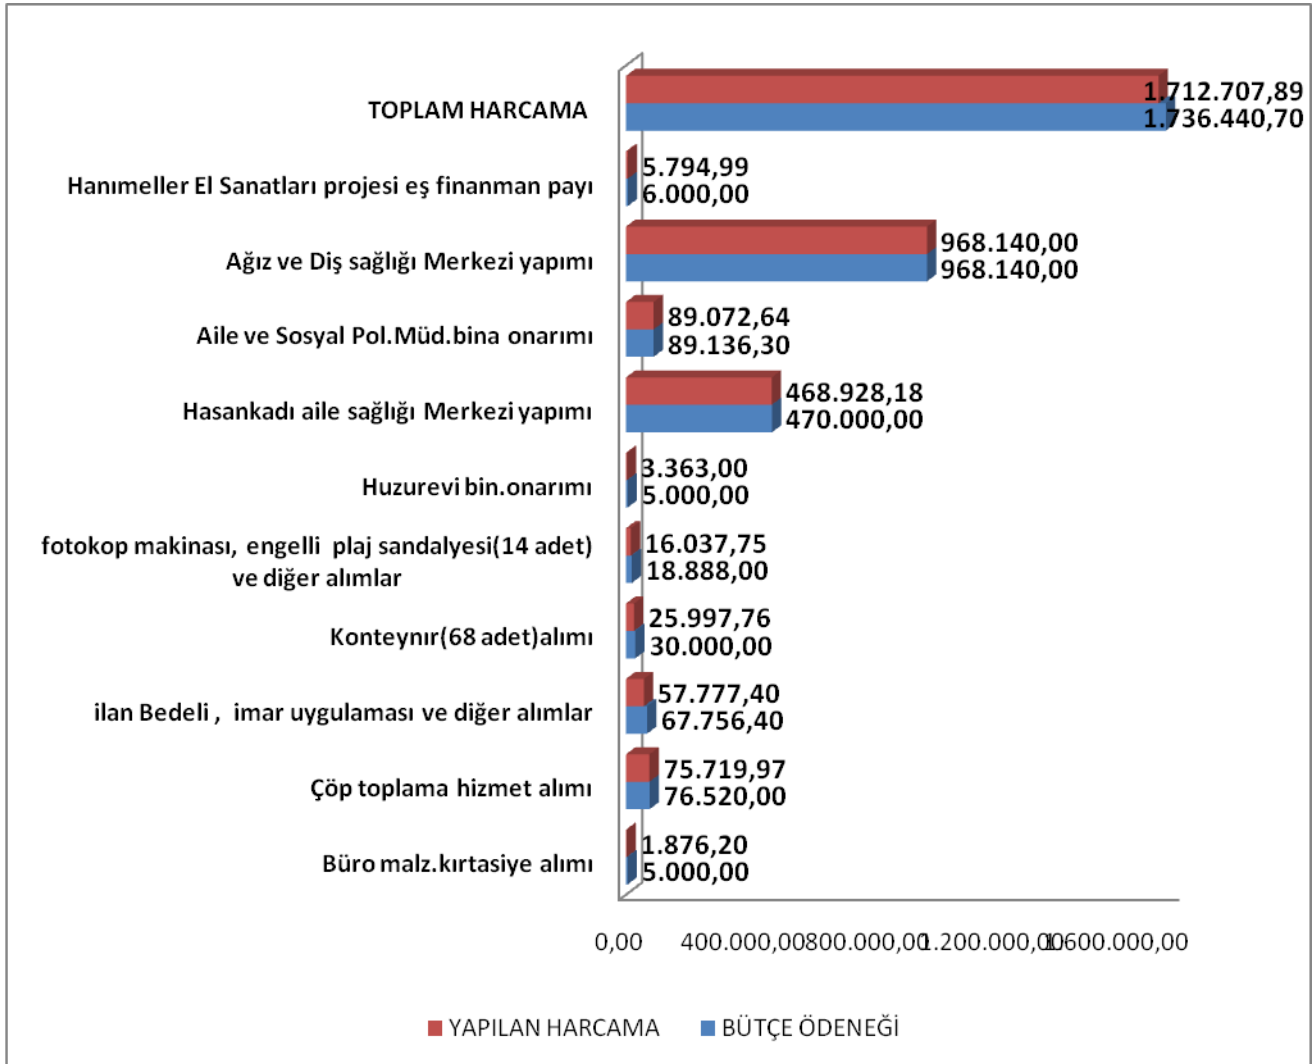

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU (SAĞLIK HİZMETLERİ)

SIRA NO	PROJE NUMARASI	PROJE/FAALİYET ADI	MALİ YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ (+KDV)	ÖZKAYNAK/ DİŞ KAYNAK	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞE BAŞLAMA TARİHİ	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	SORUNLAR VE GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1	37.1	Hasankadı Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi Yapımı	470.000,00	468.928,00	Öz Kaynak	31.01.2012	09.03.2012	14.03.2012	100	100	20.06.2012	Tamamlandı
2	37.2	Acil Sağlık Hizmetleri için Mal ve Malzeme alımı	10.000,00		Dış Kaynak							Sağlık Bakanlığından ödenek aktarılmadığı için, İl Genel Meclisinin 28.12.2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile proje iptal edilmiştir.
3	37.3	Plajı Olan Köyler İçin Çöp Aracı Kiralanması	60.000,00	47.200,00	Öz Kaynak	22.05.2012	18.06.2012	19.06.2012	100	100	19.09.2012	Tamamlanmıştır.
4	37.4	Köy Sağlık Evlerinin Onarımı	100.000,00		Dış Kaynak							Sağlık Bakanlığından ödenek aktarılmadığı için, İl Genel Meclisinin 28.12.2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile proje iptal edilmiştir.
5	37.5	Çöp Konteynırı Alımı	30.000,00	22.030,00	Öz Kaynak	02.05.2012	Sözleşme öncesi teslim		100	100	01.06.2012	68 adet 800 TL.'lik konteynır alımı yapılarak, 37 adet köy muhtarlığımıza teslim edilmiştir.
6	37.6	Sosyal Hizmetler Gönüllüğü Sisteminin oluşturulması	2.000,00		Öz Kaynak				100		31.06.2012	Sosyal Hizmetler Gönüllüğü Sistemi oluşturularak, web sitemizde yayınlanmış ve 2 adet Gönüllü başvurusu yapılmıştır. .


2012 YILI FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU (SOSYAL ve ÇEVRE HİZMETLERİ)

SIRA NO	PROJE NUMARASI	PROJE/FAALİYET ADI	MALİ YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ (+KDV)	ÖZKAYNAK/ DIŞ KAYNAK	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞE BAŞLAMA TARİHİ	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	SORUNLAR VE GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
7	37.7	Bartın Sahil Köyü Plajlarının Hizmet Kalitesinin Ve Turizm Bilincinin Arttırılması Projesi	75.000,00	170.923.03	Öz Kaynak+ Dış Kaynak		18.06.2012	02.05.2012	60	60	31.12.2012	Projenin uygulanmasına devam edilmektedir.
8	37.8	Hanım Eller Yöresel El Sanatları Projesi	6.000,00		Öz Kaynak+ Dış Kaynak	Yardım	Yapılmadı.	02.05.2012	100	100		Tamamlanmıştır.
9	37.9	Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Bina Onarımı	92.095.70	73.700,00	Dış Kaynak	24.09.2012	17.10.2012	22.10.2012	100	100	20.12.2012	Tamamlanmıştır.
10	37.10	Sosyal Hizmetlerde Erişimi Sağlamak Üzere Araç Kiralanması.	14.000,00		Öz Kaynak	Doğrudan Temin	16.10.2012	16.10.2012	100	100	21.12.2012	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne araç teslim edilmiş ve sonucunda 255 adet kişiye erişim sağlanmıştır.
11	37.11	İmar Planı ve Zemin Etüdü Yapımı.	20.000,00	20.000,00	Öz Kaynak	Doğrudan Temin	Yapılmadı.		100	100	08.11.2012	Tamamlanmıştır.
12	37.12	Huzurevi Binası Onarımı	5.000,00		Öz Kaynak	Doğrudan Temin	Yapılmadı.		100	100		Tamamlanmıştır.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

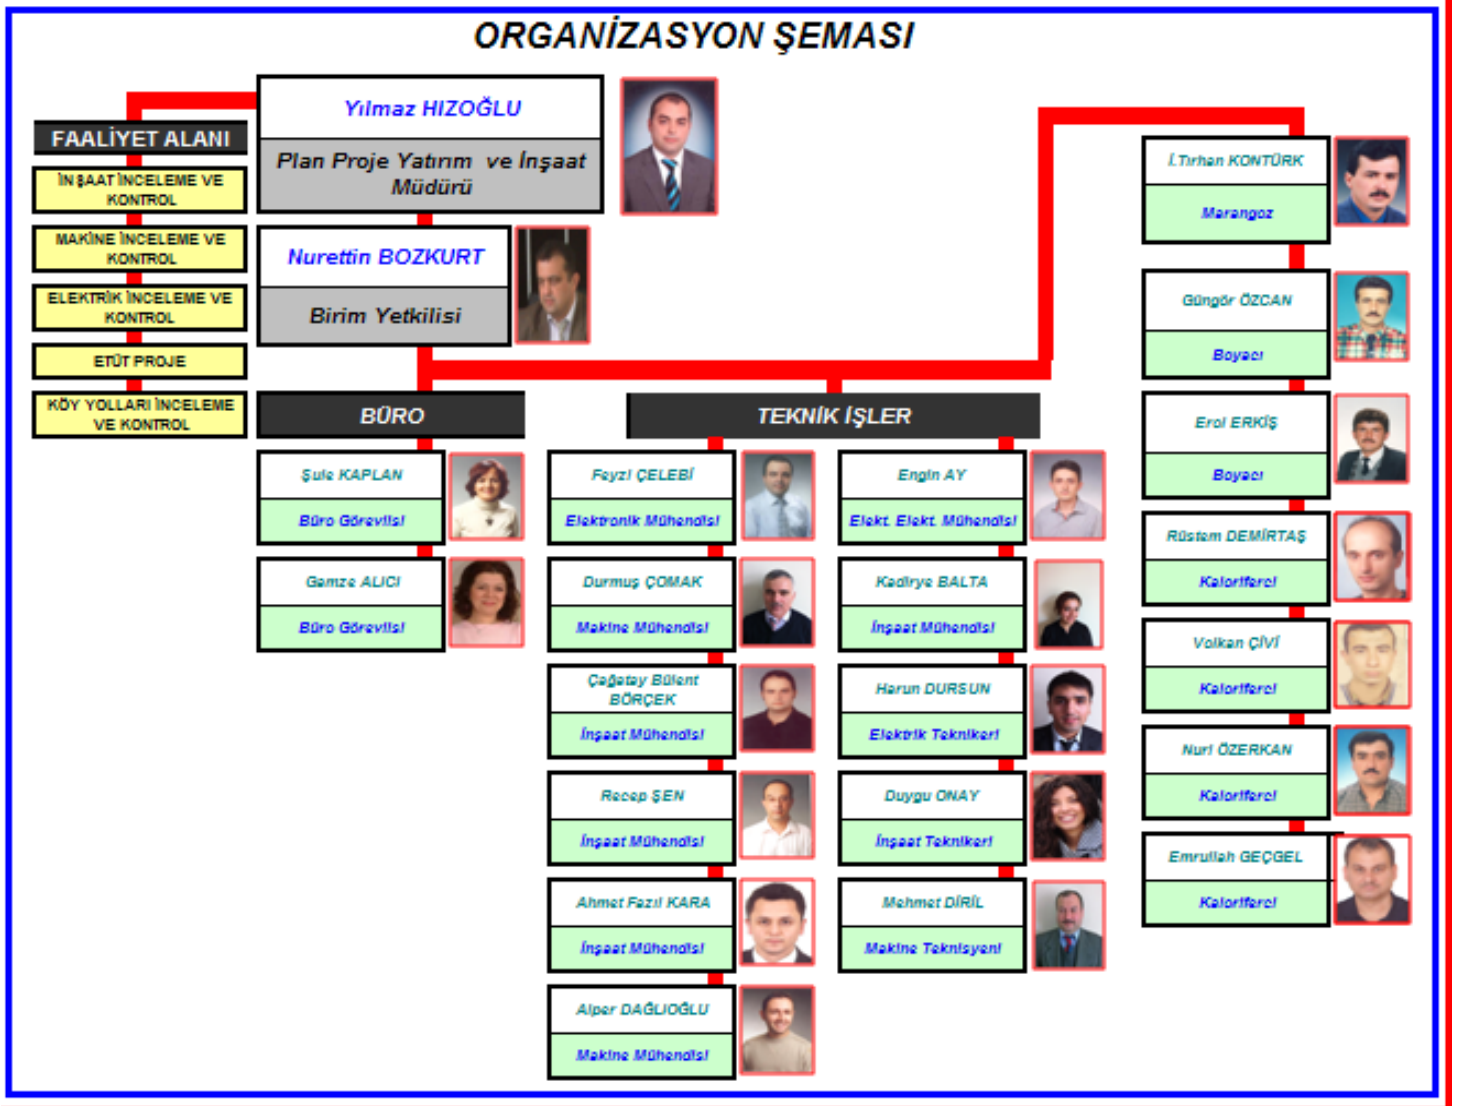

1- Hizmet Binası ve Lojmanlarımızın Bakım ve Onarım Çalışmaları:

- İdaremiz Hizmet Binası İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Biriminin Onarım Yapılması İş
- İdaremiz Hizmet Binası Jenaratörüne Bakım Onarım Yapılması İş
- Ağdacı Köyü Mevkiinde Bulunan İdaremiz Lojmanlarına Elektrik Tesisatı Onarım İş
- İl Özel İdaresi Merkez Lojmanlarının Elektrik Sayaçlarının Yenilenmesi İş
- İdaremiz Hizmet Binası Yemekhanesine Onarım Yapılması İş
- Ağdacı Köyü Mevkiinde Bulunan İdaremiz Lojmanı Kalorifer Kazanına Onarım Yapılması İş
- İdaremiz Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Satın Alınması İş
- İnkum (Taşınmaz) Yazlık Evleri İçin Boya Ve Boya Malzemesi Satın Alınması İş
- İnkum (Taşınmaz) Yazlık Evlerinin Hidrofor ve Sıhhi Tesisatının Yenilenmesi İş
- İnkum(Taşınmaz)Yazlık Evleri İçin Onarım İş
- İl Özel İdaresi Memur Lojmanı Onarım İş
- İdaremiz Hizmet Binası Kalorifer Tesisatı Onarım İş
- İdaremiz Hizmet Binası Su Deposu Onarım İş
- İdaremiz Hizmet Binası Kalorifer, Asansör Ve Telefon Santrali Yıllık Bakım-Onarım İş
- İdaremiz Hizmet Binası Ağdacı Köyü Mevkiinde Bulunan Lojmanın Çatı Onarım İş Yapılmıştır.

2012 YILI FAALİYET RAPORU




2- Ahşap İskele Yapılması İşi:

Ahşap İskele Yapımı İşine ait Proje Hazırlanması işinin ihalesi 20.060,00 TL. bedelle tamamlanmış olup, yüklenici firma tarafından projeler teslim edilmiştir. Ancak; yapım ihalesi Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesi gereğince iptal edilmiş olup, İl Genel Meclisinin 28/12/2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile programdan çıkarılmıştır.

2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;


22/d maddesine göre 41 adet doğrudan temin,
22/a maddesine göre 9 adet,
21/f maddesine göre 4 adet ve
19. maddesine göre 1 adet ihale yapılmıştır.

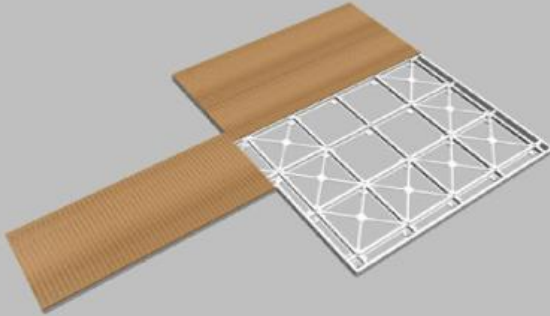

2012 YILI FAALİYET RAPORU

3- İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve Lojmanlarına Deprem Güçlendirme Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması İşi:

28/06/2012 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup, yüklenici İnter Yapı İnş. Müh. Hizm. Dan. Nak. Turz. İth. ve İhl. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmıştır. Taraflarca 03/08/2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 06/08/2012 tarihinde yer teslimi yapılarak 04/10/2012 tarihinde iş ve işlemler tamamlanmıştır.

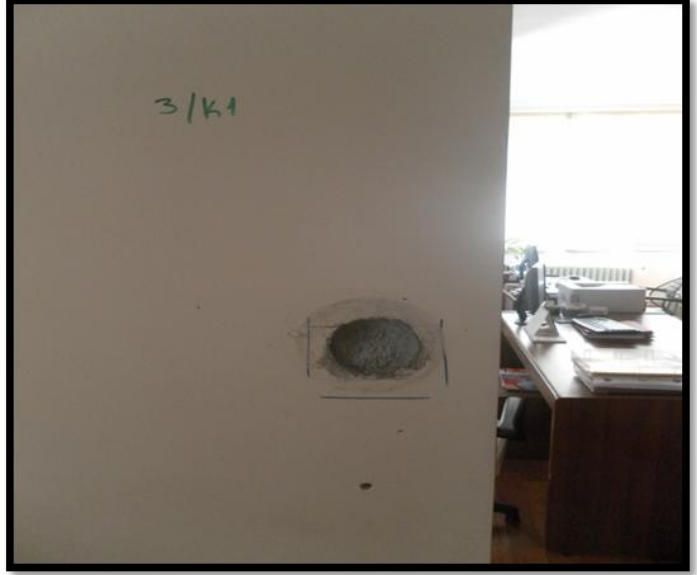

İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI



İL ÖZEL İDARESİ MERKEZ LOJMAN BİNASI



İL ÖZEL İDARESİ AĞDACI KÖYÜ LOJMAN BİNASI



4- Bartın Organize Sanayi Bölgesi Gökırmak Havzasının Islah ve Taşkın Koruma Amaçlı Taş Tahkimatı Sedde İnşaatı için Taş Temin Edilmesi Projesi:

İl Genel Meclisinin 04/12/2012 tarih ve 67 sayılı kararı ile Müdürlüğümüzün 2012 Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınmıştır. Taş temin edilmesi işi ihalesi ile ilgili iş ve işlemler tamamlanmış olup, Kamu İhale Kanununun 19. maddesi Açık İhale Usulü ile 21/01/2013 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecektir.


5- Toki Köprüsü Projesi:

Kalkınma Bakanlığından Toki Köprüsü Yapımı için 2.500.000,00 TL. aktarılmış ve söz konusu iş ile ilgili uygulama imar planı tamamlanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı onay aşamasında olup, plan onaylandıktan sonar zemine tütü + proje+yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.

2012 yılı içerisinde Paydaş Müdürlüklerimize Yapılan Teknik Hizmetler İcmali

- 192 adet Yaklaşık Maliyet çalışması yapılmıştır.
- 83 adet Yapı Denetim çalışması yapılmıştır.
- 51 adet Geçici Kabul çalışması yapılmıştır.
- 27 adet Kesin Kabul çalışması yapılmıştır.
- 24 adet Muayene Kabul çalışması yapılmıştır.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

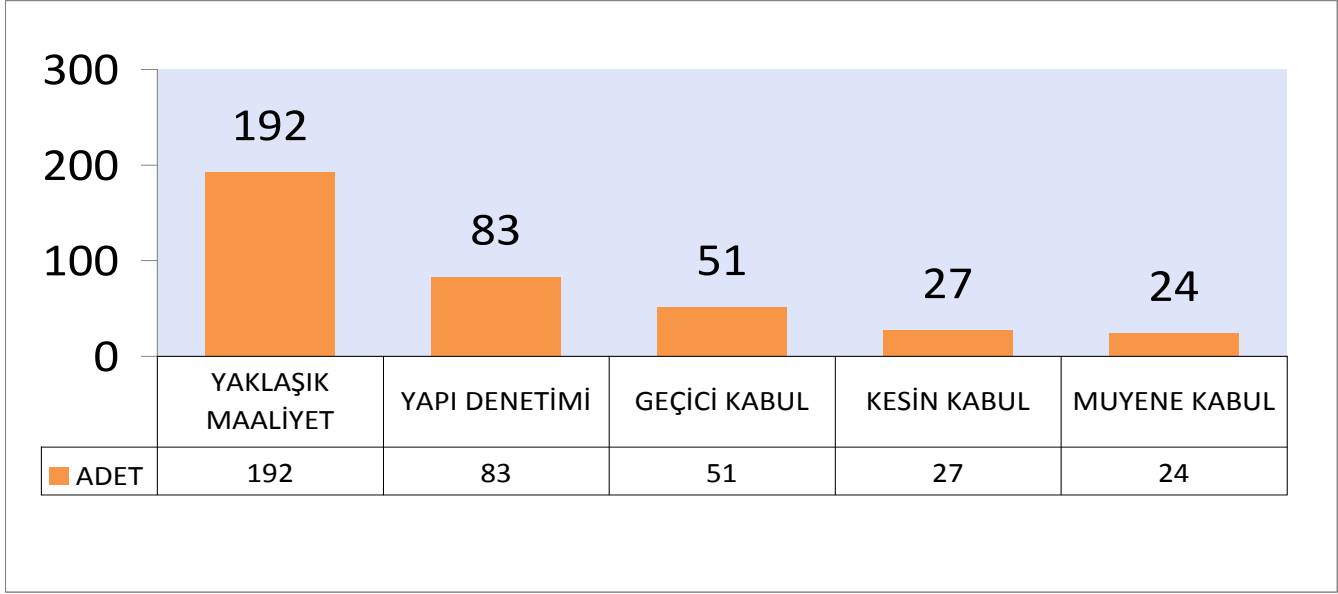

2012 Yılı İçerisinde Yapılan Köy Yardımları

- Merkez İlçemizde 3 adet köye 5.000,00 TL.
 - Ulus İlçemizde 9 adet köye 10.500,00 TL.
 - Kurucaşile İlçemizde 2 adet köye 3.750,00 TL.
- olmak üzere **TOPLAM 14 adet köyümüze 19.250,00 TL.** tutarında nakdi yardım yapılmıştır.

MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE NAKDİ YARDIM			
Sıra No	KÖYÜN ADI	YARDIM MİKTARI (TL)	NİÇİN VERİLDİĞİ
1	Hıdırlar köyü	2.500,00	İstinat Duvarı İş
2	Terkehaliller Köyü	1.000,00	Kanalizasyon Borusu Alımı
3	Söğütlü Köyü	1.500,00	Mezarlık Çevre Düzenlenmesi İş
TOPLAM		5.000,00	


KURUCAŞİLE İLÇE KÖYLERİNE NAKDİ YARDIM			
Sıra No	KÖYÜN ADI	YARDIM MİKTARI (TL)	AÇIKLAMA
1	Ziyaret Köyü	2.000,00	İstinat Duvarı İş
2	Paşalılar Köyü	1.750,00	Beton Kanal Yapılması İş
TOPLAM		3.750,00	

2012 YILI FAALİYET RAPORU

ULUS İLÇE KÖYLERİNE NAKDİ YARDIM

Sıra No	KÖYÜN ADI	YARDIM MİKTARI (TL)	AÇIKLAMA
1	Dereli köyü	750,00	Köy Konağı Çatı Tamirâtı
2	Köklü Köyü	1.000,00	Kanal İmalatı
3	Isırganlı köyü	1.250,00	Cami altına morg yapılması işi
4	İbrahim DERESİ	1.250,00	Köprü ayakları için beton direk yapım işi
5	Kirazcık Köyü	1.000,00	Cami bakım onarımı
6	Buğurlar Köyü	2.000,00	Cami şadırvanının bakım onarımı
7	Karahasan Köyü	1.000,00	Beton kanal Yapılması işi
8	Alpı Köyü	1.000,00	Kanalizasyon boru alımı
9	Karakışla Köyü	1.250,00	Cami Şadırvanının Bakım ve Onarımı
TOPLAM		10.500,00	

PLAN PROJE VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KESİN HESABI

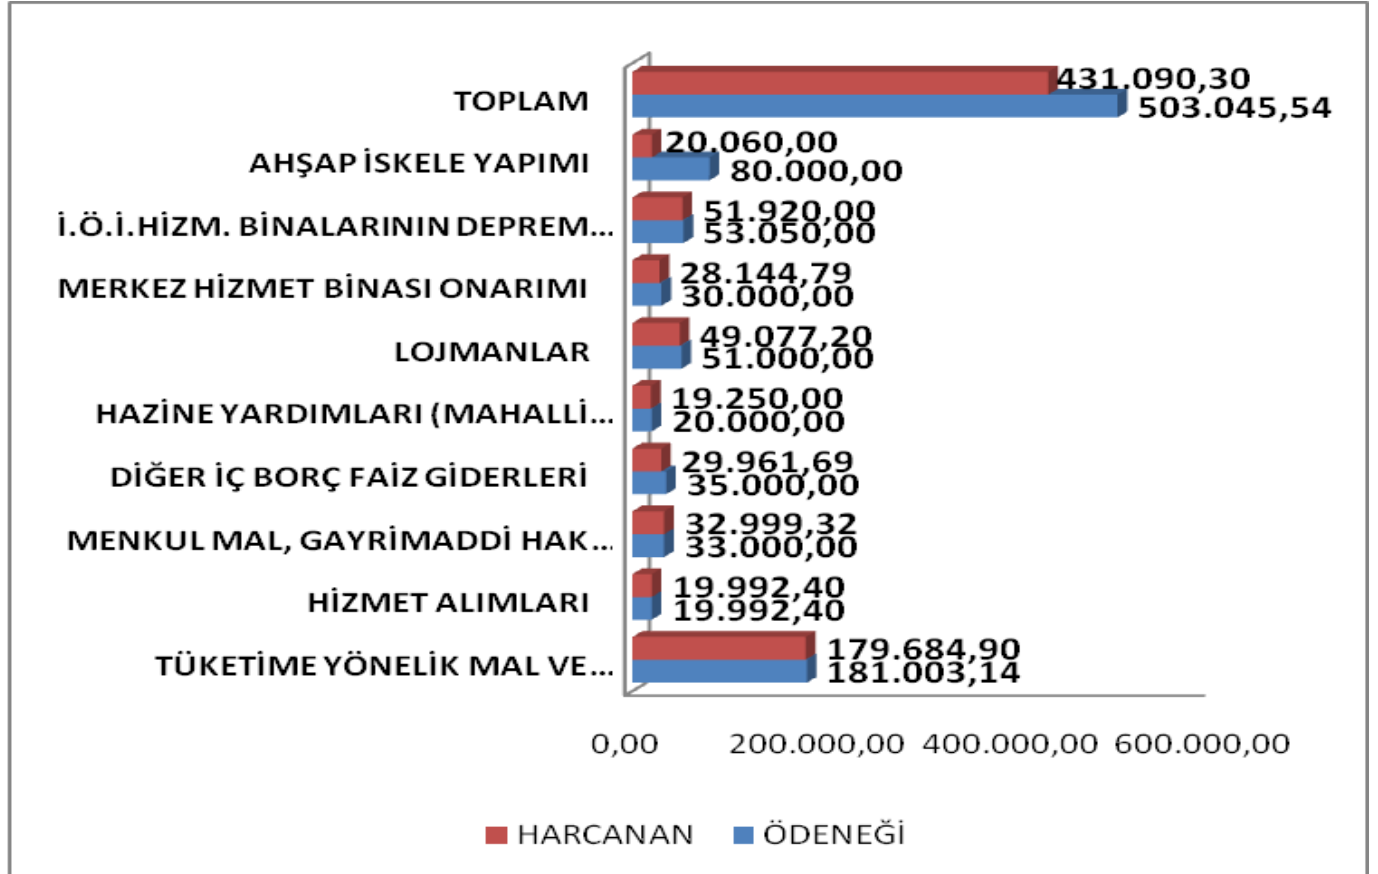

2012 YILI FAALİYET RAPORU

192 ADET YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR.

Sıra No	Proje Adı ve Yeri	Sıra No	Proje Adı ve Yeri
1	İdaremiz Hiz. Bin. Loj. Dep Tahkiki Güçlendirme Projesi İ Şi	21	Ulus Zafer İ.Ö.O. Onarım İşi
2	Merkez Atatürk İ.Ö.O. İnşaatı Yapım İşi	22	Kurucaşile Karaman İ.Ö.O.Onarım İşi
3	Abdipaşa İ.Ö.O. İnşaatı Yapım İşi	23	Kurucaşile Hisar Pirireis İ.Ö.O. Onarım İşi
4	Merkez İlçe İ.Ö.K. Deprem Güç.(Ellibaş)	24	Amasra Kaleşah İ.Ö.O.Onarım İşi
5	Merkez İlçe İ.Ö.Kurumları Deprem Güç.(Fatih)	25	Ulus Mehmet Akif ERSOY İ.Ö.O.Onarımı İşi
6	Deprem Güçlendirme Tahkiki Ve Proje Yapılması İşi	26	Amasra Şehit Ahmet TELLİ İ.Ö.O.Onarımı İşi
7	Merkez Şehit Necdet Orhan YİBO Onarım İşi	27	Merkez İlçe İ.Ö.O. Spor Salonu Yapımı
8	Ulus Kumluca YİBO Onarım İşi	28	Amasra Şükürler İ.Ö.O.Onarımı İşi
9	Merkez Kocareis İ.Ö.O. Onarım İşi	29	Merkez Cumhuriyet İ.Ö.O.Onarımı İşi
10	Merkez Esenyurt İ.Ö.O. Çevre Düz.Ve Onarımı İşi	30	Merkez Sütlüce İ.Ö.O.Onarımı İşi
11	Merkez İMKB Onarım İşi	31	Merkez Gürgenpınarı İ.Ö.O.Onarımı İşi
12	Merkez Hasankadı İ.Ö.O. Onarım İşi	32	Kurucaşile Sarıderesi İ.Ö.O. Onarımı İşi
13	Merkez Şahin İ.Ö.O.Onarım İşi	33	Merkez Epçiler İ.Ö.O. Çevre Düzenlemesi İşi
14	Merkez Akçalı İ.Ö.O.Çevre Düzenlemesi Ve Onarımı İşi	34	Merkez Vali Tevfik BAŞAKAR İ.Ö.O.Çevre Düzenlemesi Onarımı İşi
15	Merkez Terkehaliller İ.Ö.O. Onarım İşi	35	Merkez Mustafa AYDEDE Anaokulu Çevre Düz.İşi
16	Merkez Hendekyanı İ.Ö.O.Onarım İşi	36	Bilim Sanat Yapım İnşaatı Proje İşi
17	Merkez Aydınlar İ.Ö.O.Çevre Düz.Ve Onarımı İşi	37	Merkez Yanaz İ.Ö.O. Yapımı İşi
18	Ulus Ağaköy İ.Ö.O. Onarımı İşi	38	Kurucaşile İlyasgeçidi İ.Ö.O. Kal.Kazanı Onarım İşi
19	Merkez Özbaşı İ.Ö.O.Onarım İşi	39	İl Emniyet Müdürlüğü MOBESE İşi
20	Merkez Yeşilkaya İ.Ö.O.Onarım İşi	40	Çakraz Arıönü Ahşap İskele Yapım Proje İşi

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sıra No	Proje Adı Ve Yeri	Sıra No	Proje Adı Ve Yeri
41	Hizmet Binası Loj.Deprem Tahkiki Ve Güçlendirme Proje İşi	61	İnönü İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
42	Cumhuriyet Anadolu Lisesi Onarım İşi	62	Hendekyanı İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
43	Bedil İ.Ö.O. Elk.Kompansasyon Sistemi İşi	63	Kocareis İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
44	Şahin İ.Ö.O. Kal.Izgara Ve Den.Daim Pomp. Arızası İşi	64	Amasra Fatih Sultan Mehmet İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
45	Bartın Lisesi Müd.Kal.Kazanı Alev Boru Elk.Tes. İşi	65	Amasra Köksal TOPTAN İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
46	Amasra İlçe M.E.M. Hiz.Bin.Jenaratör Ödeneğe Esas Keşif Haz.İşi	66	Ulus Zafer İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
47	Çaydüzü İ.Ö.O. Kalorifer Kazanı İle Hid.Pomp. Onarım İşi	67	Ulus Abdipaşa İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
48	Vali Evi Sıhhi Tesisat Arızası Onarım İşi	68	Ulus Atatürk İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
49	Çakraz Bakım Evi E.N.H. Onarımı İşi	69	Ulus Kumluca YİBO İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
50	Akçalı İ.Ö.O. Kalorifer Onarımı İşi	70	Kurucaşile Sarıderesi İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
51	Vali Yavuz ERKMEN İ.Ö.O. Kal. Onarımı İşi	71	Fatih İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi
52	Özbaşı İ.Ö.O. Onarımı İşi	72	Bartın Orman Ve Su İşleri Müd. İdari Bina Onarım İşi
53	Kumluca YİBO Kal.Sistemi Onarımı İşi	73	Serdar Köyü Futbol Sahası Sent. Çimlendirme İşi
54	Ticaret Meslek Lisesi Kal.Tesisatı Onarımı İşi	74	Gürgenpınarı Köyü Futbol Sahası Sentetik Çimlendirme İşi
55	Budakdüzü İ.Ö.O. Kalorifer Sistemi Onarımı İşi	75	Kumluca Futbol Sahası Sent. Çimlendirme İşi
56	Epçiler İ.Ö.O. Deprem Tahkiki İşi	76	Toki İ.Ö.O. 12 adet Güvenlik Kamerası Ve Kayıt Sis. İşi
57	Gölbucağı Ş.Üstteğmen Aydın AYDOĞMUŞ Dep.Güç.Tahkiki İşi	77	Kaleşah İ.Ö.O. Onarımı İşi
58	Terkehaliller İ.Ö.O. Dep.Güç.Tahkiki İşi	78	Şehit Gürdal Çakır İ.Ö.O. Onarım İşi
59	Arıt Şehit Necdet ORHAN YİBO Dep.Güç.Tahkiki İşi	79	Kurucaşile İlyasgeçidi İ.Ö.O. Onarımı İşi
60	Hasankadı İ.Ö.O. Deprem Güçlendirme Tahkiki İşi	80	Ulus 75. Yıl İ.Ö.O. Onarımı İşi

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sıra No	Proje Adı Ve Yeri	Sıra No	Proje Adı Ve Yeri
82	İstiklal İ.Ö.O. Onarımı İşi	102	Umut İ.Ö.O. Dep.Tahkiki Ve Onarımı
83	Gökkuşluğu Anaokulu Onarımı İşi	103	İmam Hatip Lisesi Ek Bina Proje Yapımı Ve Onarımı
84	M.E.M. Lojmanları Deprem Tahkiki Ve Onarımı	104	Kozcağız Yuva Anaokulunun İç Zemin Döşeme İşi
85	Anadolu Öğretmen Lisesi Deprem Tahkiki Ve Onarımı İşi	105	Amasra Çanakçılar İ.Ö.O. Onarımı İşi
86	Köksal Toptan Lisesi Deprem Tahkiki ve onarımı	106	Ulus M.E.M. Hiz.Binası Özürlü Asansörü Yapımı İşi
87	Bartın Lisesi Dep.Tahkiki Ve Onarımı	107	7 Eylül Anaokulu Donanım İhtiyacı İşi Teknik Şartihaz.İşi
88	Davut FIRINCIOĞLU Deprem Tahkiki Ve Onarımı	108	Merkez Esenyurt Köyü Sağlık Ocağı Onarımı İşi
89	Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Dep.Tah. Ve Onarımı	109	Epçiler Köyü Sağlık Ocağı Onarımı İşi
90	Cumhuriyet Lisesi Deprem Tahkiki Ve Onarımı	110	Akçamescit Sağlık Ocağı Onarımı İşi
91	Merkez Teknik Lise Dep.Tahkiki Ve Onarımı İşi	111	Kozcağız Sağlık Ocağı Ve Lojmanı Onarımı İşi
92	Ticaret Meslek Lisesi Deprem Tahkiki Ve Onarımı	112	Ellibaş Aile Sağlık Ocağı Onarımı İşi
93	Kız Meslek Lisesi Ve Anadolu Lisesi Dep.Tahkiki Ve Onarımı	113	Kurtköy Sağlık Ocağı Onarımı İşi
94	Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesi Dep.Tahkiki Ve Onarımı	114	Amasra Gömü Sağlık Ocağı Onarımı İşi
95	Kızılelma ÇPL. Deprem Tahkiki Ve Onarımı	115	Kurucaşile Tekkeönü ASM Onarım İşi
96	Hasankadı ÇPL Deprem Tahkiki Ve Onarımı	116	Ulus Ağaköy Sağlık Ocağı Onarım İşi
97	Amasra Otelcilik Tur.Meslek lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı	117	Kurucaşile TSM Lojmanı Onarımı İşi
98	Abdipaşa ÇPL. Deprem Tahkiki ve Onarımı	118	75. Yıl Huzurevinin Tv Anten Sistemindeki Arıza Gideri İşi
99	Ulus ÇPL. Deprem Tahkiki Ve Onarımı	119	İnkum Tüneli Etüt Proje Hazırlanması İşi,
100	Merkez Halk Eğitim Merkezi Ve ASM Onarımı	120	Amasra Müze Müd. Bedesten Mevkii Arkeolojik Kazı Alanı Çevresi Tel Örgü İle Koruma Hattı İşi

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sıra No	Proje Adı Ve Yeri	Sıra No	Proje Adı Ve Yeri
121	Kurucaşile 1 Adet Halı Sahası İşİ	141	Bartın Lisesi Çatı Onarımı İşİ
122	Ulus Hasandede İ.Ö.O. Spor Salonu Onarımı İşİ Ödeneğe Esas	142	Güzel Sanatlar Lisesi Çatı Onarımı İşİ
123	Şiremirçavuş İ.Ö.O. Elk.Arızası Onarım İşİ	143	Kız Meslek Lisesi Çatı Onarımı İşİ
124	Epçiler İ.Ö.O. Foseptik Ve Kanalizasyon İşİ	144	Fen Lisesi Çatı Onarımı İşİ
125	Ulus EML. Pansiyon Binası Deprem Testi İşİ	145	Anadolu Öğretmen Lisesi Çatı Onarımı İşİ
126	Vali Konağı Elk.Sistemi İşİ	146	Atatürk Yatılı İ Ö.O. Bölge Okulu Kalorifer Kazanı Onarımı İşİ
127	Vali Konağı Parke Onarımı İşİ	147	Abdipaşa İ.Ö.O. Kalorifer Kazanı Onarım İşİ
128	Kurucaşile İlçe Sağlık Müd. Lojmanlarının Onarım İşİ	148	Abdipaşa ÇPL. Onarım İşİ
129	Amasra Belediyesi Ve Kozcağız Belediyesinin Meydan Düzenleme İşİ	149	İl Genel Meclisi Toplantı Salonu
130	Hasankadı Aile Sağlığı Merkezi Bahçe Kapıları İşİ	150	Ellibaş Deprem Güçlendirme Ve Onarımı İşİ
131	Kemal Sabriye Ocakçı İ.Ö.O.Çatı Onarımı İşİ	151	Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müd. Hiz.Binası Onarım İşİ
132	Bilim Sanat Merkezi Çatı Onarımı İşİ	152	EML. Pansiyon Binası Deprem Güçlendirme İşİ
133	İmam Hatip Ek Bina Çatı Onarımı İşİ	153	Halk Sağlığı Müd. Bulaşıcı Hastalıkları Oda Arşivi Bakım Ve Onarımı İşİ
134	İmam Hatip Ana Bina Çatı Onarımı İşİ	154	Kurucaşile İlçe Sağlığı Müdürlüğü Onarım İşİ
135	Cumhuriyet Lisesi Ve Pansiyon Çatı Onarımı İşİ	155	Kapısuyu Köy Sahillerine 4 Adet Fotoselli Portatif Duş Kabini Yapılması İşİ
136	İMKB Çatı Onarımı İşİ	156	Amasra Lisesi Onarım İşİ
137	Endüstri Meslek Lisesi Onarımı İşİ	157	Abdipaşa Kapalı Spor Salonu Yapımı İşİ
138	Ticaret Lisesi Çatı Onarımı İşİ	158	İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Ve İlçe Hizmet Binası Bakım Ve Onarımı İşİ
139	Akçalı İ.Ö.O. Çatı Onarımı İşİ	159	Ahmetler İ.Ö.O. Kalorifer Arızası İşİ
140	Mustafa Kemal İ.Ö.O. Çatı Onarımı İşİ	160	Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi Kalorifer Teçhizatı Onarım İşİ

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sıra No	Proje Adı Ve Yeri	Sıra No	Proje Adı Ve Yeri
161	Bartın Anadolu Lisesi Onarım İşi	177	Şehit Üst.A.Aydoğmuş İ.Ö.O. Kalorifer Kazanı Onarım İşi
162	Fatih Ortaokulu Kalorifer Kazanı Ateşleme Arızası İşi	178	İl Emniyet Müdürlüğü 20 Daireli Potbaşı Polis Lojmanı Çevre Düzenlemesi İşi
163	Ellibaş Ortaokulunun Kalorifer Kazanı Onarım İşi	179	Amasra Çanakçılar Ortaokulu Kalorifer Sistemi Arızası İşi
164	Sipahiler Şehit Gürdal ÇAKIR Ortaokulu Öğretmenler Odası Düzenleme İşi	180	Kemal Sabriye OCAKÇI Öğretmenler Odası Düzenleme İşi
165	Akçamescit Ortaokulu Öğretmenler Odası Düzenleme İşi	181	Şahin Şahin İ.Ö.O. Onarım İşi
166	Mustafa Kemal İ.Ö.O. Öğretmenler Odası Düzenleme İşi	182	Bartın Lisesi Müdürlüğü Kalorifer Kazanı Onarım İşi
167	Bartın Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Müdürlüğü Elektrik Tesisatı İşi	183	Şiremirçavuş İ.Ö.O. Elektrik Tesisatı Onarım İşi
168	Ağdacı İlkokulu Proje Yapım İşi	184	Ellibaş İ.Ö.O.Kalorifer Kazanı Onarım İşi
169	İl Emniyet Müdürlüğü Potbaşı 20 Daireli Polis Lojmanları İstinat Duvarı Yapım İşi	185	Derbent BSİO. Lojmanının Dersliğe Dönüştürülmesi İşi
170	İmamhatip Ortaokulu Proje Hazırlama İşi	186	Ulus 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Kalorifer Kazanı Onarım İşi
171	Bartın Öğretmenevi Deprem Güçlendirme Projesi Hazırlama İşi	187	Akpınar İ.Ö.O. Kalorifer Kazanı Su Akıntısı Onarımı İşi
172	Kurucaşile ÇPL. Deprem Tahkiki Ve Onarımı	188	Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi Müdürlüğü Kanalizasyon Onarımı İşi
173	Bartın Kurtköy OSB. Menfez İşi	189	Amasra Öğretmenevi Jeolojik Etüt Proje Hazırlama İşi
174	23 Nisan Anaokulu Müdürlüğü İhtiyaçları İşi	190	Şehit Ahmet Poyraz İ.Ö.O. Müdürlüğü Onarım İşleri
175	Kurucaşile Kömeç Köyü Köy Okulu Ve Lojman Bakım Onarım İşi	191	Abdipaşa Ortaokulu Kalorifer Kazanı Onarım İşi
176	Ellibaş Ortaokulu Kalorifer Kazanı Onarım İşi	192	İmkb Ortaokulu Okul Binası Kalorifer Kazanı Onarım İşi

2012 YILI FAALİYET RAPORU

24 ADET MUAYENE KABUL ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR.

SIRA NO	PROJE ADI	SIRA NO	PROJE ADI
1	Atatürk Şehir Stadına Turnike Kurulması İşİ	13	Amasra Köksal Toptan İ.Ö.O. Deprem Tahkiki İşİ
2	Kumluca Atatürk Yatılı İ.Ö.O Bölge Ok.	14	Kurucaşile Sarideresi İ .Ö.O. Deprem Tahkiki İşİ
3	Sürücülü Çöp Aracı Kiralanması İşİ	15	Ş.Ü.Aydın AYDOĞMUŞ İ.Ö.O. Deprem Tahkiki İşİ
4	Bartın Amasra ve Kurucaşile Köylerimizdeki Sahil Plajlarına 8 adet (Wc+Duş+Soyunma)Kabin Alımı İşİ	16	İnönü İ.Ö.O. Deprem Tahkiki İşİ
5	Ellibaş İ.Ö.O.Deprem Tah.Güçl.Projelerinin Hazırlanması İşİ	17	Hendekyeni İ.Ö.O. Deprem Tahkiki İşİ
6	Kaleşah İlköğretim Okulu Deprem Tah.Güçl.Prj.Hazırlanması İşİ	18	Ulus Zafer İ.Ö.O. Deprem Tahkiki İşİ
7	Atatürk İlköğretim Okulu Deprem Tah.Güçl.Projelerinin Hazırlanması İşİ	19	Abdipaşa İ.Ö.O. Deprem Tahkiki İşİ
8	Dmo Kırtasiye Demirbaş Malzemeleri Alımı İşİ	20	Terkehaliller İ.Ö.O. Deprem Tahkiki İşİ
9	Bedil İ.Ö.O. İstinat Duvarı Projesi İşİ	21	Kocareis İ.Ö.O. Deprem Tahkiki İşİ
10	7 Eylül Anaokulu Mutfak Malzemeleri Teklif Değerlendirme İşİ	22	Kemal Sabriye OCAKÇI İ.Ö.O. Klima Satın alınması İşİ
11	Ulus Kumluca YİBO Deprem Tahkiki İşİ	23	Amasra Öğretmenevi Jeolojik Etüt Proje Hazırlama İşİ
12	Fatih İ.Ö.Okulu Deprem Tahkiki İşİ	24	Hizmet Binası Merkez Ve Ağdaci Köyü Lojman Binalarının Deprem Güçlendirme Binalarının Deprem Güçlendirme Tahkiklerinin Yapılması Ve Güçlendirme Projelerinin Hazzrlanması İşİ

2012 YILI FAALİYET RAPORU

51 ADET GEÇİCİ KABUL ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR.

SIRA NO	PROJE ADI	SIRA NO	PROJE ADI
1	Mustafa Kemal İ.Ö.O Deprem Güçlendirme İşi	16	Şükürler İ.Ö.O.Onarım İşi
2	Kurucaşile Futbol Sahası Işıklandırma İşi	17	Abdipaşa İ.Ö.O. Onarım İşi
3	Ariönü (Mugada) Ve Çakraz Sahiline Ahşap Iskele Yapılması İşi	18	Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. Onarım İşi
4	Hasankadi ASM Yapım İşi	19	Ağaköy İ.Ö.O. Onarım İşi
5	Kocareis İ.Ö.Okulu Onarım İşi	20	M.E.M. Lojmanları Onarım İşi
6	Esenyurt İlköğretim Okulu Onarım İşi	21	Gökkuşığı Onarım İşi
7	Akçali İlköğretim Okulu Onarım İşi	22	Ulus ÇPL Onarım İşi
8	Özbaşı İlköğretim Okulu Onarım İşi	23	Kız Meslek Lisesi Onarım İşi
9	Hasankadi İlköğretim Okulu Onarım İşi	24	Halk Eğitim Merkezi Onarım İşi
10	İMKB İ.Ö.Okulu Onarım İşi	25	Bartın Lisesi Onarım İşi
11	Kurucaşile Hisarpirireis İlköğretim Okulu Onarım İşi	26	İmam Hatip Lisesi Ana Bina Onarım İşi
12	Arıt Aydınlar İ.Ö.O. Onarım İşi	27	İmam Hatip Lisesi Ek Bina Onarım İşi
13	İstiklal İ.Ö.O. Onarım İşi	28	Cumhuriyet Anadolu Lisesi Onarım İşi
14	Ulus Zafer İ.Ö.O. Onarım İşi	29	Sürücülü Çöp Kamyonu Kiralanması İşi
15	Şehit Necdet Orhan YİBO Onarım İşi	30	Amasra Turizm Otelcilik Onarım İşi

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	PROJE ADI	SIRA NO	PROJE ADI
31	Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi Pansiyon İnşaatı	42	Cumhuriyet İlköğretim Okulu Onarım İşi
32	Merkez Teknik Lise Nve E.M.L. Onarım İşi	43	Terkehaliller İlköğretim Okulu Onarım İşi
33	Mustafa Kemal Ortaokulu Onarım İşi	44	Otistik Çocuklar İ.Ö.O. Temel Atma Ve Çevre İmalatları Yapım İşi
34	Akçali İlköğretim Okulu Onarım İşi	45	Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Bodrum Kat Ve Bekçi Kulubesinin Onarım İşi
35	Bilim Sanat Merkezi Onarım İşi	46	Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi
36	Ticaret Meslek Lisesi Onarım İşi	47	Epçiler Aile Sağlık Merkezi Bakım Ve Onarım İşi
37	Ulus 75 Yıl Onarım İşi	48	Ellibaş Aile Sağlık Merkezi Bakım Ve Onarım İşi
38	Abdipaşa Çpl Onarım İşi	49	Kurtköy Aile Sağlık Merkezi Bakım Ve Onarım İşi
39	Vali Tefik Başakar İlköğretim Okulu Onarım İşi	50	Merkez Toplum Sağlığı (Ketem) Bakım Ve Onarım İşi
40	Şehit Gürkan Çakır İlköğretim Okulu Onarım İşi	51	Ulus Ağaköy Sağlık Evi Bakım Ve Onarım İşi
41	Hendekyanı İlköğretim Okulu Onarım İşi		

2012 YILI FAALİYET RAPORU

27 ADET KESİN KABUL ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR.

SIRA NO	PROJE ADI	SIRA NO	PROJE ADI
1	Gazi İ.Ö.O Onarım İşi	15	Kurucaşile ÇPL Onarım İşi
2	Bartın Fen Lisesi Onarım İşi	16	Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Onarım İşi
3	4 Adet Onarım İşi (Erdoğan ÇAKIR)	17	Şiremirçavuş İ.Ö.O Onarım İşi
4	4 Adet Onarım İşi	18	Bartın Merkez İlköğretim Okulu Yapım İnşaatı İşi
5	Dalıca B.S.İ. Onarım İşi	19	Ahmetler İlköğretim Okulu Ek Bina Onarım İnşaatı İşi
6	Budakdüzü İ.Ö.O. Onarım İşi	20	Emniyet İlçe Kurucaşile, Amasra, Ulus Hizmet Binası Onarım İşi
7	Alibaş İ.Ö.O Onarım İşi	21	Kemer Polis Merkezi Onarım İşi
8	Abdipaşa İ.Ö.O Onarım İşi	22	Ulus ÇPL Onarım İşi
9	Kaymakamlık Lojmanı Onarım İşi	23	Amasra Turizm Otelcilik Anadolu Lisesi Onarım İşi
10	Şiremirçavuş İ.Ö.O Onarım İşi	24	Bartın Lisesi Onarım İşi
11	Karainler İ.Ö.O Onarım İşi	25	Bartın Köksal Toptan Lisesi Onarım İşi
12	Merkez İ.Ö.O Onarım İşi	26	Sürücülü Çöp Kamyonu Kiralaması İşi
13	Kumluca Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O .Onarım İşi	27	Kemer Polis Karakolu Çocuk Şube Müdürlüğü Bakım Onarım İşi
14	İlyas Geçidi İ.Ö.O Onarım İşi		

2012 YILI FAALİYET RAPORU

83 ADET YAPI DENETİM ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR.

SIRA NO	PROJE ADI	SIRA NO	PROJE ADI
1	Hasankadı Aile Sağlığı Merkezi	21	Hasankadı İlköğretim Okulu Onarım İşi
2	Kurucaşile Futbol Sahası Işıklandırma İşi	22	İMKB İlköğretim Okulu Onarım İşi
3	Çakaraz Bakım Evi Elekt. Tesisatı İmalatı İşi	23	Hisarpirireis İlköğretim Okulu Onarım İşi
4	Sütlüce İ.Ö.O. Onarım İşi	24	Huzurevi TV Sistemleri İşi
5	Şehit Ahmet TELLİ İ.Ö.O. Onarım İşi	25	Vali Tevfik BAŞAKAR İlköğretim Okulu Onarım İşi
6	Çakraz Bakım Evi Elektrik Tesisatı Yapım	26	Şehit Gürdal ÇAKIR İlköğretim Okulu Onarım İşi
7	Akçamescit Kapalı Spor Salonu İşi	27	Hendekyanı İlköğretim Okulu Onarım İşi
8	Kurucaşile İlyasgeçidi Onarım İşi	28	Cumhuriyet İlköğretim Okulu Onarım İşi
9	Karaman İ.Ö.O Onarım İşi	29	Terkehaliller İlköğretim Okulu Onarım İşi
10	Yeşilkaya İ.Ö.O Onarım İşi	30	Arıt Aydınlar İlköğretim Okulu Onarım İşi
11	Epçiler İ.Ö.O . Çevre Düzenleme İşi	31	Agaköy İlköğretim Okulu Onarım İşi
12	Köksal Toptan Kalorifer Teç. İşi	32	Abdipaşa İlköğretim Okulu Onarım İşi
13	Amasra Öğretmenevi Jeolojik Etüt Ve Prj Haz. İşi.	33	M.Akif ERSOY İlköğretim Okulu Onarım İşi
14	Amasra Kurucaşile Köy Sahil ve Plajlarına Foseptik İşi	34	Şükürler İlköğretim Okulu Onarım İşi
15	Yanaz İ.Ö.O Yapım İşi	35	Otistik Çocuklar İÖO Temel Atma Ve Çevre İm. İşi
16	Temel Eğitim Okulları Dep. Tah. Güçlendirme İşi	36	Kurucaşile Toplum Sağlığı Merkezi Lojmanı
17	Esenyurt İlköğretim Okulu Onarım İşi	37	Bartın Ağdacı Lojmanı Çatı Onarım İşi
18	Kocareis İlköğretim Okulu Onarım İşi	38	Davut FIRINCIOĞLU Anadolu Lisesi
19	Akçalı İlköğretim Okulu Onarım İşi	39	Anadolu Öğretmen Lisesi
20	Özbaşı İlköğretim Okulu Onarım İşi	40	Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	PROJE ADI	SIRA NO	PROJE ADI
1	Köksal TOPTAN Lisesi Onarım İşi	22	Halk Eğitim Merkezi
2	Şiremirçavuş Köyü İlköğretim Okulu Onarım İşi	23	S.Çavuşoğlu Fen Lisesi Pansiyon Onarım İşi
3	Kemal Sabriye OCAKÇI İlköğretim Okulu Onarım İşi	24	Merkez Teknik Lise Ve EML Onarım İşi
4	Umut İlköğretim Okulu Onarım İşi	25	Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Onarım İşi
5	Kız Meslek Lisesi Ve Anadolu Kız Meslek Lisesi Onarım İşi	26	Akçalı İlköğretim Okulu Onarım İşi
6	Hasankadı ÇPL Onarım İşi	27	Bilim Sanat Merkezi Onarım İşi
7	İstiklal İlköğretim Okulu Onarım İşi	28	Ticaret Meslek Lisesi Onarım İşi
8	Zafer İlköğretim Okulu Onarım İşi	29	Şehit Necdet ORHAN İlköğretim Okulu Onarım İşi
9	Gökkuşluğu Anaokulu Onarım İşi	30	Budakdüzü İ.Ö.O. Onarım İşi
10	Memur Lojmanları Onarım İşi	31	Yeşil Kart Bürosu Onarım İşi
11	Kız Meslek Lisesi	32	Amasra Tur. Otelcilik Meslek Lisesi Onarım İşi
21	Ulus ÇPL İşi	33	Bartın Lisesi Onarımı İşi


2012 YILI FAALİYET RAPORU

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT AÇIKLAMALAR
								NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1		5	Lojman Bakım Onarım Giderleri	Merkez			51.000,00	49.077,20	96	100	İdaremize ait lojmanların elektrik, boya, onarım, bakım v.b. çalışmaları yapılmıştır.
2		5	Hizmet Binası Bakım Onarım Giderleri	Merkez			30.000,00	28.144,79	94	100	İdaremize ait hizmet binasının elektrik, asansör bakımı, jeneratör, kalorifer v.b. bakım onarımları yapılmıştır.
3		5	Ahşap İskele Yapımı	Amasra Merkez	150.000,00	103.873,40	80.000,00	20.060,00	25	25	Proje hazırlanması işi ihale si tamamlanmış olup, yapım ihalesi KİK ' nun 39. maddesi gereğince iptal edilmiştir.
4		5	İl Özel İdaresi Hizmet Binalarının Deprem Güçlendirme Tahkiki ve Rapor Hazırlanması	Merkez	100.000,00		53.050,00	51.920,00	98	100	28/06/2012 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup, yüklenici firma tarafından hazırlanacak olan tahkik ve güçlendirme projelerinin hazırlanması ile ilgili raporlar beklenmektedir.
5		5	OSB Genişleme Alanı Gökırmak Taşkın Koruma Amaçlı Taş Tahkimatı Sedde İnşaatı Taş Temini	Merkez			200.000,00				2012-2013 Ek Yatırım ve Çalışma Programına alınmış olup, 21/01/2013 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecektir.


2012 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

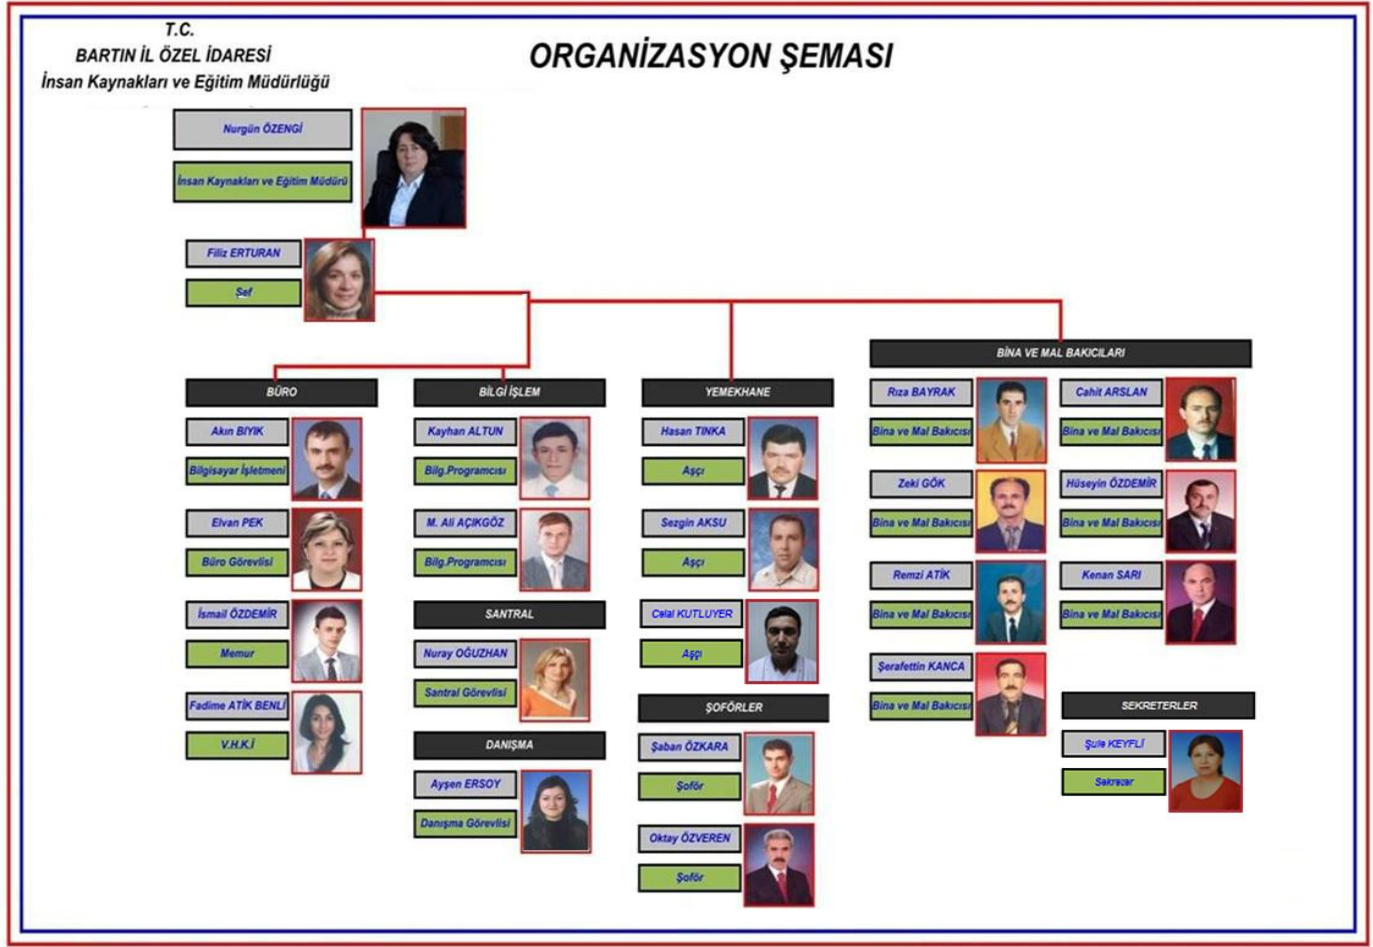


İl Özel İdaremizde Merkez ve 3 İlçe Özel İdaresi dâhil **119 mevcut memur kadrosu** bulunmakta olup, Bu kadroların 65'i Genel İdare Hizmetleri, 1'i Avukatlık Hizmetleri, 28'i Teknik Hizmetler, 10'u Sağlık Hizmetleri ve 15'i Yardımcı Hizmetlerdir. **Dolu kadro sayısı 51 ve boş kadro sayısı 68'dir.**

İdaremizde ayrıca, 113 daimi işçi 17 Sözleşmeli Personel kadro karşılığı çalıştırılmaktadır. Memur, işçi ve sözleşmeli personel **çalışan kişi sayısı toplamda 181 olup**, İl Özel İdaresi personel tablosu aşağıda gösterilmiştir.




2012 YILI FAALİYET RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUM CETVELİ



2012 YILI FAALİYET RAPORU


YILLARA GÖRE PERSONEL SAYILARI

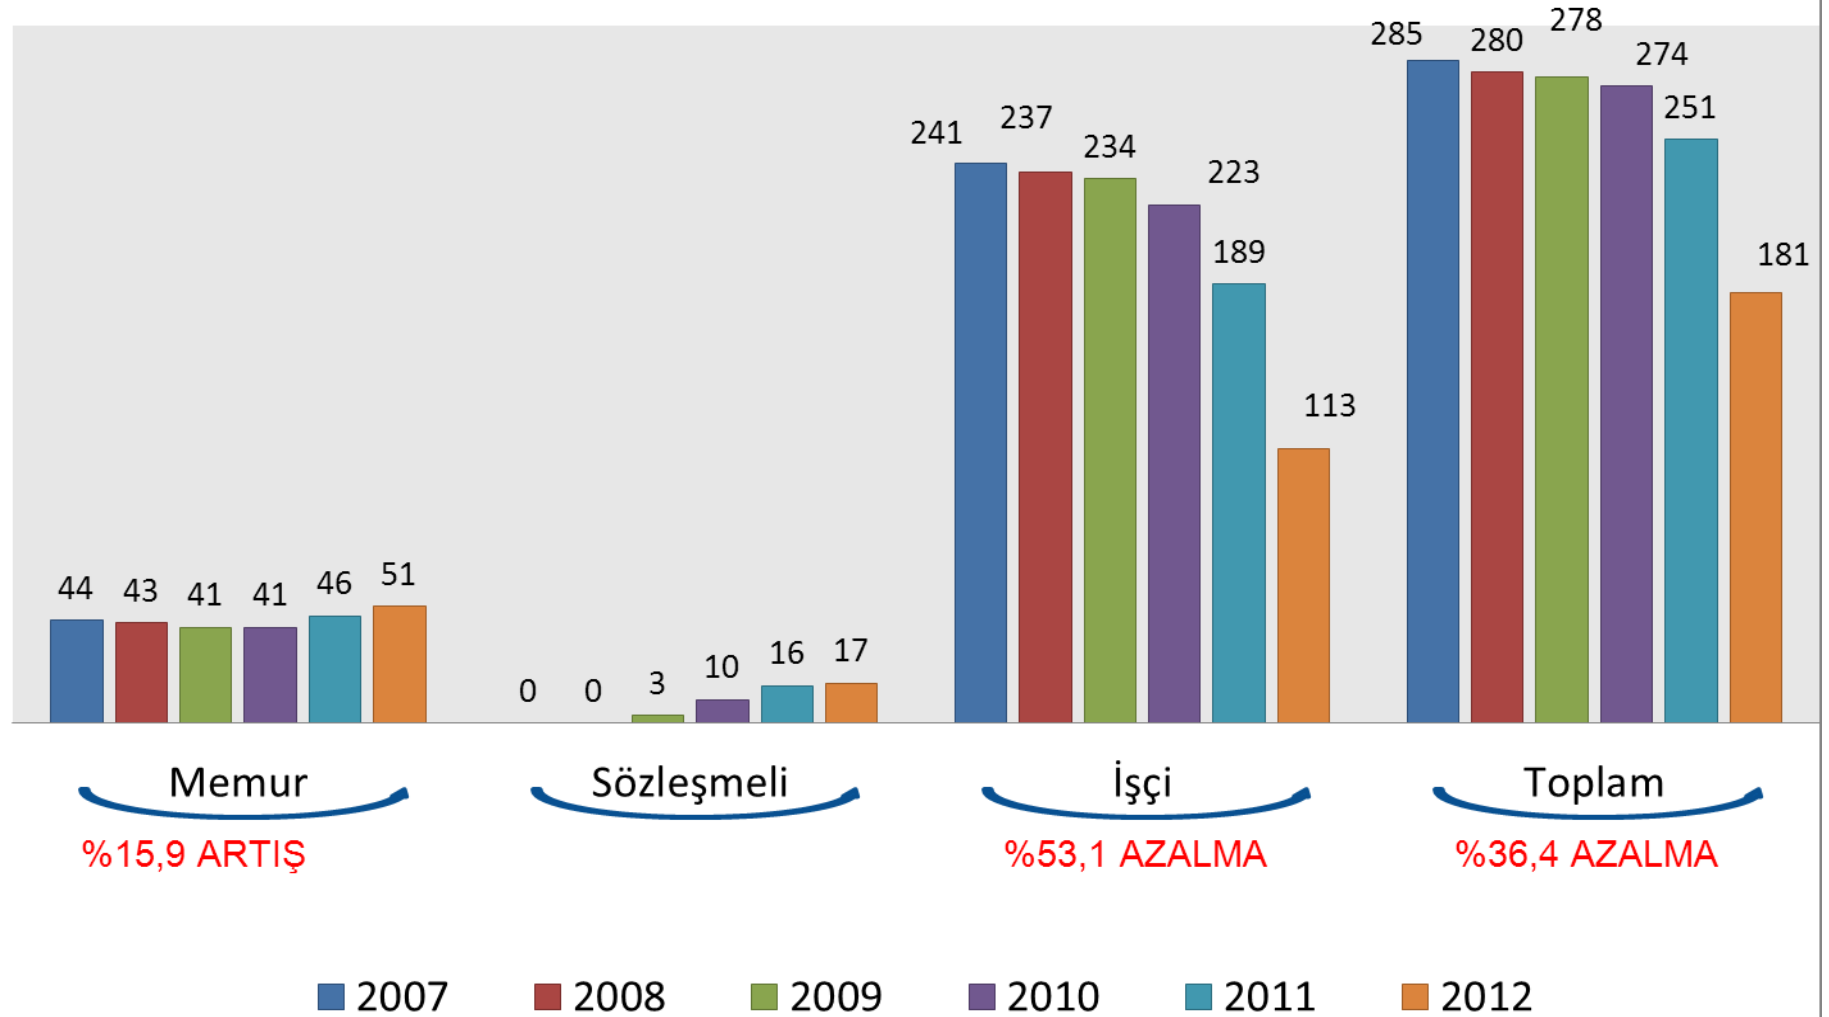


2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILINDA YAPILAN ANKETLER

GENEL OLARAK PERSONEL MEMNUNİYETİ







2012 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME CETVELİ

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		5	Mikro Kredi dağıtılması	İl Geneli	35.000,00	20.500,00	35.000,00	35.000,00	100	100	41 adet vatandaşımız başvuruda bulunmuş, komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu 30 adet vatandaşımıza toplam 35.000,00 TL.'lik mikro kredi verilmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI İTİBARI İLE PERSONEL EĞİTİM DURUMU



- Özürlü ve Eski Hükümlü Personel Durumu:

Mülga Köy Hizmetleri İl Müdüründen devredilen işçiler nedeniyle, 4857 sayılı İş Kanununun 30 ve 101.maddelerine göre çalıştırılması gereken özürlü ve eski hükümlüler İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilerek İş Kurumu ile yapılan koordineli çalışma sonucunda 9 özürlü 3 eski hükümlü personel alımı yapılmıştır.2010 yılı içinde çeşitli nedenlerden dolayı ayrılan 4 özürlü personelin yerine, arkeolog ve bilgisayar programcısı alımı gerçekleştirilmiş, ilgili yasa hükmü gereğince **Özürlü ve Eski Hükümlü personel açığımız bulunmamaktadır.**

2012 YILI FAALİYET RAPORU

- Hizmet Alımı:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince yapılan ihale sonucunda;

- 2 adet sekreter
- 5 adet temizlik İşçisi
- 4 adet kaloriferci
- 1 adet aşçı olmak üzere **toplam 12 adet personel** çalıştırılmıştır.

- Sözleşmeli Personel:

İdaremize 2012 yılında; 5393 sayılı kanunun 49 uncu ve 5302 sayılı kanunun 36 ıncı maddeleri gereğince;

- 1 adet Avukat
- 1 adet Mimar
- 1 adet Şehir Plancısı
- 10 adet Mühendis
- 2 adet Tekniker
- 2 adet Programcı olmak üzere **toplam 17 adet sözleşmeli personel** çalıştırılmaktadır.

- Memur Alımı:

İdareimizce Devlet Personel Başkanlığı'ndan personel talebinde bulunulmuş, ÖSYM tarafından KPSS sonucuna göre yerleştirilen ve idaremizce;

- 1 adet 6. derece Muhasebeci
- 1 adet 6. ambar Memuru
- 1 adet 10. derece Memur
- 1 adet 6. derece V.H.K.İ. personelin atamaları yapılmıştır.

- Bimer :



Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Başvurularında **2012 yılı için 229 başvuru alınmış ve 186 sı cevaplanmıştır. Bunlardan 17 sı ilgisi nedeniyle başka kurumlara gönderilmiş, 26'sı ise isim ve adres gibi eksikliklerden dolayı cevaplandırılmamıştır.**

2012 YILI FAALİYET RAPORU

- Mikro Kredi:

5302 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince hazırladığımız Uygulama Yönergesi çerçevesinde idareimizce 2012 yılında bütçemizden **35.000,00 TL.** ayrılmış, talepte bulunan 41 kişinin saha ziyaretleri yapılarak görevlendirilen komisyon tarafından **30 kişinin** talebi uygun görülmüştür.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu-İş-kur-İdaremiz arasına yapılan protokol sonucunda 30 kişiye 5 günlük eğitim verilmiş, akabinde söz konusu **30 kişiye 35.000,00 TL.**'nin dağıtımı sağlanmıştır.



2012 YILI FAALİYET RAPORU

MİKRO KREDİ DAĞITIM LİSTESİ

SIRA NO	ADI SOYADI	HANGİ İŞ İÇİN VERİLECEĞİ	MİKTARI
1	Elif ATILGAN	Unlu Mamuller	2.000,00
2	Yüksel GÜNDÜZ	El İşleri	2.000,00
3	Rahime ORHAN	El İşleri	2.000,00
4	Herman ÖZPEHLİVAN	El İşleri	1.500,00
5	Hanım TEKOL	El İşleri	1.500,00
6	Halime ERCAN	El İşleri	1.500,00
7	Seher YAŞAR	El İşleri	1.500,00
8	Saliha CENGİZ	El İşleri	1.000,00
9	Mürvet ŞANLI	El İşleri	1.000,00
10	Nevin KUŞ	Takı Tasarımı	1.000,00
11	Kerime KAYA	El İşleri	1.000,00
12	Gade ÇAPRAZ	El İşleri	1.000,00
13	Şaziye ÇAMŞUL	El İşleri	1.000,00
14	Gönül SAMUT	El İşleri	1.000,00
15	Gülserin ALAGÖZ	El İşleri	1.000,00
16	Nuran ARSLAN	El İşleri	1.000,00
17	Fatma ARSLAN	El İşleri	1.000,00
18	İlknur CAN	El İşleri	1.000,00
19	Hatice KARA	El İşleri	1.000,00
20	Saime DEDE	El İşleri	1.000,00
21	Ayfer TUĞ	El İşleri	1.000,00
22	Mihrican BALCI	El İşleri	1.000,00
23	Pınar ALAGÖZ	El İşleri	1.000,00
24	Esin UÇAR	El İşleri	1.000,00
25	Erdoğan OLGUN	Balık Ağı	1.000,00
26	Selma EREN	El İşleri	1.000,00
27	Günnur BOZTEPE	El İşleri	1.000,00
28	Hatice ERSOY	El İşleri	1.000,00
29	Arzu SEÇKİN	El İşleri	1.000,00
30	Hatice GENÇGÜL	El İşleri	1.000,00
TOPLAM			35.000,00

2012 YILI FAALİYET RAPORU

- Toplum Yararına Çalışma Projesi:

İl Özel İdaresi – Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) Kapsamında Yol Yapım ve Onarımında görev alacak 9 adet geçici işçi noter huzurunda yapılan kura çekimi yapılarak işe alınmıştır.



Proje süresi sonunda, İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler ile ilgili raporlar hazırlanarak Bartın Çalışma ve İş-kur İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

- Aday Memur Eğitimi:

Eylül 2011 ve Ocak 2012’de göreve başlayan aday memurların Temel ve Hazırlayıcı Eğitimleri tamamlanarak aday memurlara sınav uygulandı. 02.07.2012 – 02.09.2012 tarihleri arasında da staj eğitimleri uygulanmıştır.

Eğitimleri tamamlanan 5 adet aday memur 11.10.2012 tarihinde yapılan yemin töreni akabinde asli görevlerine başlatılmıştır.





- Hizmet İçi Eğitimler:

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine göre **2012 yılında 20 adet eğitim planlanmıştır;**

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 - Beslenme ve Kanseri Konulu Eğitim
 - Başarı Motivasyonu Eğitimi
 - 3 adet TSE Kalite Yönetim Temel Eğitimi
 - Ekip Çalışması
 - Stres ve Çözüm Yolları
 - E- İşleri TMY Modülü Eğitimi
 - E- İşleri Sistemi Projesi
 - E- İşleri Programı
 - Enerji Verimliliği
- konularında hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.

Buna göre;

2012 yılı içerisinde; toplam olarak 14 adet hizmet içi eğitim düzenlenerek, Hizmet İçi Eğitim Planımız % 70 oranında gerçekleştirilmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERSONELİN KATILDIĞI DIŞ EĞİTİMLER			
NEREDE ve KİMİN DÜZENLEDİĞİ	KATILAN PERSONEL	KONU	TARİH
Antalya \ İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	İbrahim KAYIŞ	E-İçişleri Projesi ve Bilim dünyasında yaşanan gelişmelerin kullanıcılara aktarılması	31.10./03.11.2012
Antalya \ İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Filiz ERTURAN Kayhan ALTUN	5018 Sayılı Kanun gereği oluşturulan yerel Yönetim Modülleri ile özellikle Sistem Teknik Ağ Altyapısı ve Güvenlik Politikaları	30.04-04.05.2012
Antalya \ İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Esra ÖZDEMİR Berkant SAATÇIOĞLU	Taşınmaz Mal Modülü ve Bütçe Modülü	09-11.01.2012
Ankara\ İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Mehmet ÇAYIR Fadime Hacer ERMİŞ	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	02-03-07.2012
Antalya \ İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü	İbrahim KAYIŞ	Mevcut Mevzuat ile Uygulamadaki aksaklıkları gidermeye yönelik eğitim semineri	12-14.12.2012
Ankara\ İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Mehmet ÇAYIR Fadime Hacer ERMİŞ	Analitik Muhasebe Modülü Eğitimi Semineri	27.02-03.03.2012 05.03-10.03.2012
Antalya \Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı	Zühal BUYURAN	Kamu İhale Mevzuatı	13-17.02.2012
Antalya \Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı	Tuğçe Gözde YURTBAY	Kamu İhale Mevzuatı	13-17.02.2012



- Memurlara İkramiye Verilmesi:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesine gereğince; Performansa Dayalı olarak 10 adet memur personelimizin ikramiye ödemeleri sağlanmıştır.

- Yalova-Bursa-Samsun-Amasya İl Özel İdarelerine Geziler:

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcımız Hasan Hüseyin UZUN başkanlığında Tarımsal Hizmetler Müdürümüz M. Levent ÇAM, İçmesuyu Birim Yetkilisi Seba EĞECİ, 2 Jeoloji Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Mimar, 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 Elektrik Teknikeri ve 1 Asfalt Plant Operatörü olmak üzere 12 kişilik heyetimiz Yalova İl Özel İdaresi ve Bursa İl Özel İdaresi ziyaret edildi.

2012 YILI FAALİYET RAPORU



Bartın İl Özel İdaresi olarak Genel Sekreterimiz İbrahim KAYIŞ başkanlığında birim müdürleri ve idaremiz personelleri ile Samsun ve Amasya İl Özel İdarelerine teknik ve idari inceleme gezisi düzenlendi.



- Canlı Yayın:

1 Ocak 2012- 31 Aralık 2012 arasında; web sitemizde, idaremiz çalışma ve performans planında yer alan **157 adet İhale canlı olarak yayınlanmış ve ayrıca sitemizde 275 adet doğrudan temin duyurusu yapılmıştır.**





- Dergi Basımı:


2012 yılı içerisinde; 3. ve 4. sayısı basılmış olan Bartın İl Özel İdare Dergisinin 5. sayısı hazırlanmış olup, dergi basım aşamasındadır.

Yürütülen Diğer Faaliyetlerimiz:

1. Her hafta rutin olarak Sayın Valimiz veya Genel Sekreterimiz başkanlığında yılı Çalışma ve Performans Programının takip edilmesi için yapılan toplantılarda sekretarya görevi yaparak Toplantı Kararlarının yazımı ve dağıtımını sağlandı.
2. İdareimizde görevli tüm personeli kapsayan dilek ve temennilerinde ortaya koyulduğu 2 adet toplantı organize edildi.
3. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili çalışma başlatıldı.
4. İdareimiz alacaklarının takibi için, Hukuk Müşavirliği, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak Bartın İl Özel İdaresi İcra Takip Haciz ve Satış Bürosu Görev ve Çalışma Yönergesi hazırlanarak yürürlüğe konuldu.
5. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi gereğince 01.01-30.06.2012 /01.07-31.12.2012 tarihlerini kapsayan iki adet Brifing Raporu hazırlanarak Valilik Makamına sunuldu.
6. Sayıştay Başkanlığınca İdareimiz 2012 yılı hesap iş ve işlemlerimizin denetimi için gelen Sayıştay Denetçilerimize Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak görev sorumluluk alanında bulunan faaliyetlerimizle ilgili Brifing hazırlanarak sunumu yapıldı.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KESİN HESABI

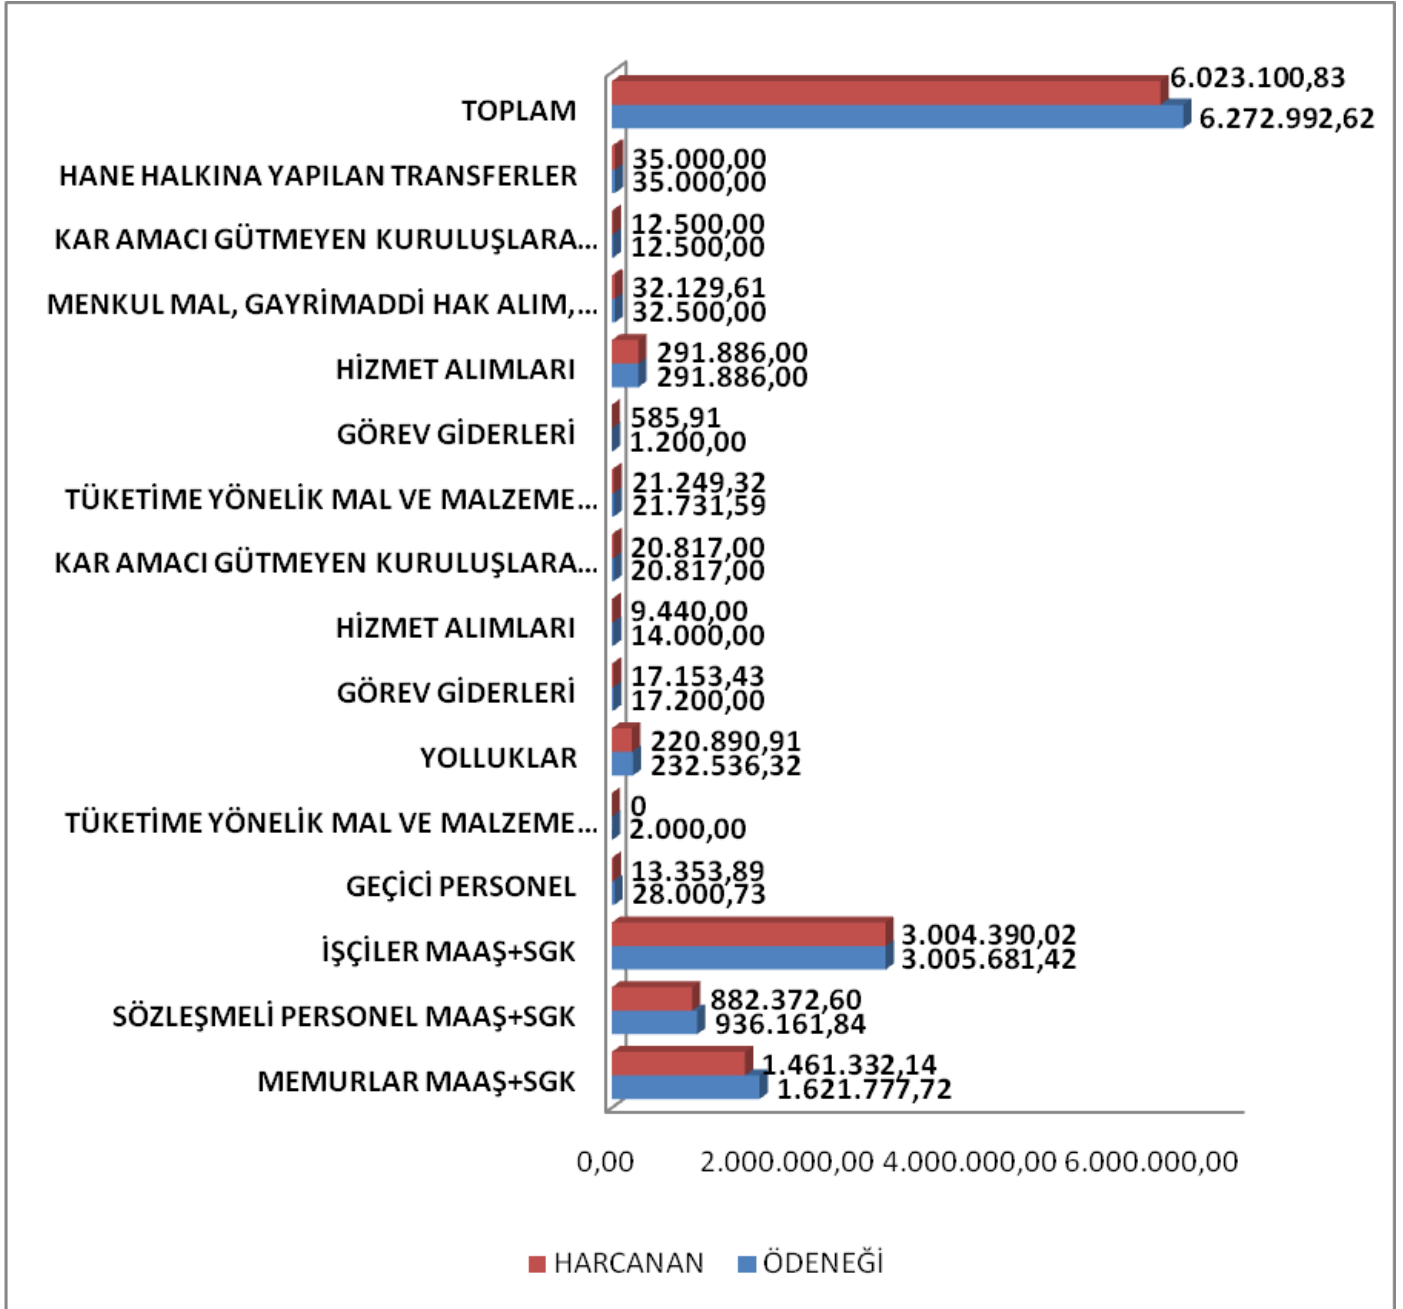


2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 23 adet doğrudan temin,
22/a maddesine göre 5 adet,
22/b maddesine göre 2 adet ve
19. maddesine göre 1 adet ihale yapılmıştır.


2012 YILI FAALİYET RAPORU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ



Yazı İşleri Müdürlüğü için 2012 yılında (Özel Kalem hariç) **404.000,00 TL.**'lik ödenek tahsis edilmiş ve bu ödenekten yılsonu itibarıyla **352.752,17 TL.**'lik harcama yapılmıştır.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KESİN HESABI



2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 8 adet doğrudan temin yöntemi ile alım yapılmıştır.

İl Genel Meclisi Sekreteryası:

- On bir üyeli ve on adet ihtisas komisyonu bulunan İl Genel Meclisi Ocak ayı başlangıcı ile Ağustos ayını tatil ilan etmiş aralık ayı itibari ile de **2012 yılında 73 oturumda toplam 74 konuyu karara bağlamıştır.**
- İl Genel Meclisinin 2012 yılında istatistikî olarak;

İhtisas Komisyonlarına Havale Edilen	:	54 Adet
İmarla İlgili Karar Sayısı	:	12 Adet
Mali Konularla İlgili Karar Sayısı	:	32 Adet
Eğitim ve Kültür İle İlgili Karar Sayısı	:	6 Adet
Tarifelerle İlgili Karar Sayısı	:	2 Adet
İnsan Kaynakları İle İlgili Karar Sayısı	:	5 Adet
Yönetim Hizmetleri İle İlgili Karar Sayısı	:	12 Adet
Müteferrik konular ile ilgili Karar sayısı	:	5 Adet
Valilik Makamınca İade edilen Karar sayısı	:	1 Adet

kayıtlara geçmiş, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda;

- Meclis'in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılması, gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulması, Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrinin takip edilmesi, Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılması, Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesi, Zabıtlara, uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Katip ve Başkanına imzalatılması, Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasının sağlanması ve takibi, Meclis kararlarının usulüne uygun olarak kamuya ve meclis üyelerine duyurulması, Meclis ve İhtisas Komisyonlarını çalışmalarına müteakip ödenecek huzur hakları ile ilgili puantajların hazırlanması ve ödeme işlemleri ile gerçekleştirme görevliliği ve harcama yetkililiği, Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasının sağlanması, Meclis Üyelerinin yoklama cetvellerinin düzenli bir şekilde tutulması,
- Meclis Başkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılması, Komisyonların diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapacağı yazışmaları düzenleyip koordine edilmesi, Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalanmasını ve Meclis Başkanlığına ulaştırılması görevler müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.
- İl Genel Meclis Üyelerinin 2 defa Antalya ilinde gerçekleştirilen Restorasyon ve Türk Mirası konulu fuar ile mevcut mevzuat uygulamaları konulu seminere katılımı sağlanmıştır.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SAYIN VALİMİZ BÜLENT SAVUR'UN İL GENEL MECLİSİNİ ZİYARETLERİ



Ulaştırma Hizmetleri:

- Kurumumuzun resmi evrak ulaşımında **6.998,75 TL.** pul alımı yapılmış, ulaştırma hizmetlerinin ifasında kullanılmıştır.

İletişim Hizmetleri:

- Kurumumuz iletişim alanındaki harcamalar 2012 yılı içerisinde 16 adet telefon abonesi, faks ve bilgilendirme sms hizmetleri için **18.237,29 TL.** harcanmıştır.

Hizmet Binası Temizlik İşleri:

- Kurumumuz hizmet binası temizlik alanında 2012 yılında **5.596,28 TL.** bedelle muhtelif malzeme alınmış, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen personel tarafından görev ifa edilmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Salonlar:

- Müdürlüğümüz görev alanları içerisinde bulunan salonlarda yılı içinde **14 kez** organizasyon yapılarak toplantı, seminer, konferans imkânı sağlanmıştır.



Eğitim:

- 2012 yılında İdareimizde aday memur olarak göreve başlayan personele Gizlilik, Yazışma Kuralları Ve Halkla İlişkiler Konulu seminer verildi.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

- 2012 yılında İdaremiz aday memurlarına 4483 sayılı kanun, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliği ve İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Arşiv Yönetmeliği kapsamında eğitimler verilmiştir.



Denetim:


- 2012 Yılında Valilik Makamı onayı ile, Merkez ve üç ilçenin Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin mali denetimi gerçekleştirilmiş, ayrıca 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında bir adet de ön inceleme yapılarak makama sunulmuştur.
- 2012 Yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 2009 yılı Sayıştay incelemesi sonucu, Amasra ve Kurucaşile ilçesi taşımali öğretim kapsamında inceleme yapılmış rapor tanzim edilerek Valilik makamına sunulmuştur.
- 2012 yılında 4734 sayılı İhale Kanunu kapsamında iki dosya hakkında raportörlük görevi gerçekleştirilmiştir.

Evrak Kayıt:

- 2012 yılında evrak giriş ve çıkış istatistikleri aşağıdaki cetvelde belirtildiği gibi gerçekleşmiştir.

EVRAK KAYIT ÇİZELGESİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
GELEN EVRAK	1.381	1.027	1.549	1.437	1.028	1.525	1.005	826	749	1.264	1.065	906	13.762
GİDEN EVRAK	1.103	636	774	927	1.054	942	1.108	757	863	786	1.117	892	10.959

2012 YILI FAALİYET RAPORU



Mal Alımı:

- Dayanıklı Tüketim Malzeme alımı: 2012 yılında İl Genel Meclis Üyelerimize grup odaları yapılarak, tefrişi ile birlikte tanzim edilerek hizmete sunulmuştur.



2012 YILI FAALİYET RAPORU


2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 83 adet doğrudan temin,
21/b maddesine göre 2 adet ve
19. maddesine göre 1 adet ihale yapılmıştır.

Özel Kalem:

- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ilkeleri çerçevesinde İlimiz Üst Yönetiminin gördüğü hizmetlerin bütçede tek kalem de toplanmasını sağlayan sistematığı ile başta temsil, ağırlama ve tören harcamaları olmak üzere üst yönetimin mal, hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirme görevliliğinin yürütümüne devam edilmiş, yapılan iş ve işlemlere dair harcamalar istatistikî olarak aşağıda belirtilmiştir.

ÖZEL KALEM 2012 YILI KESİN HESABI

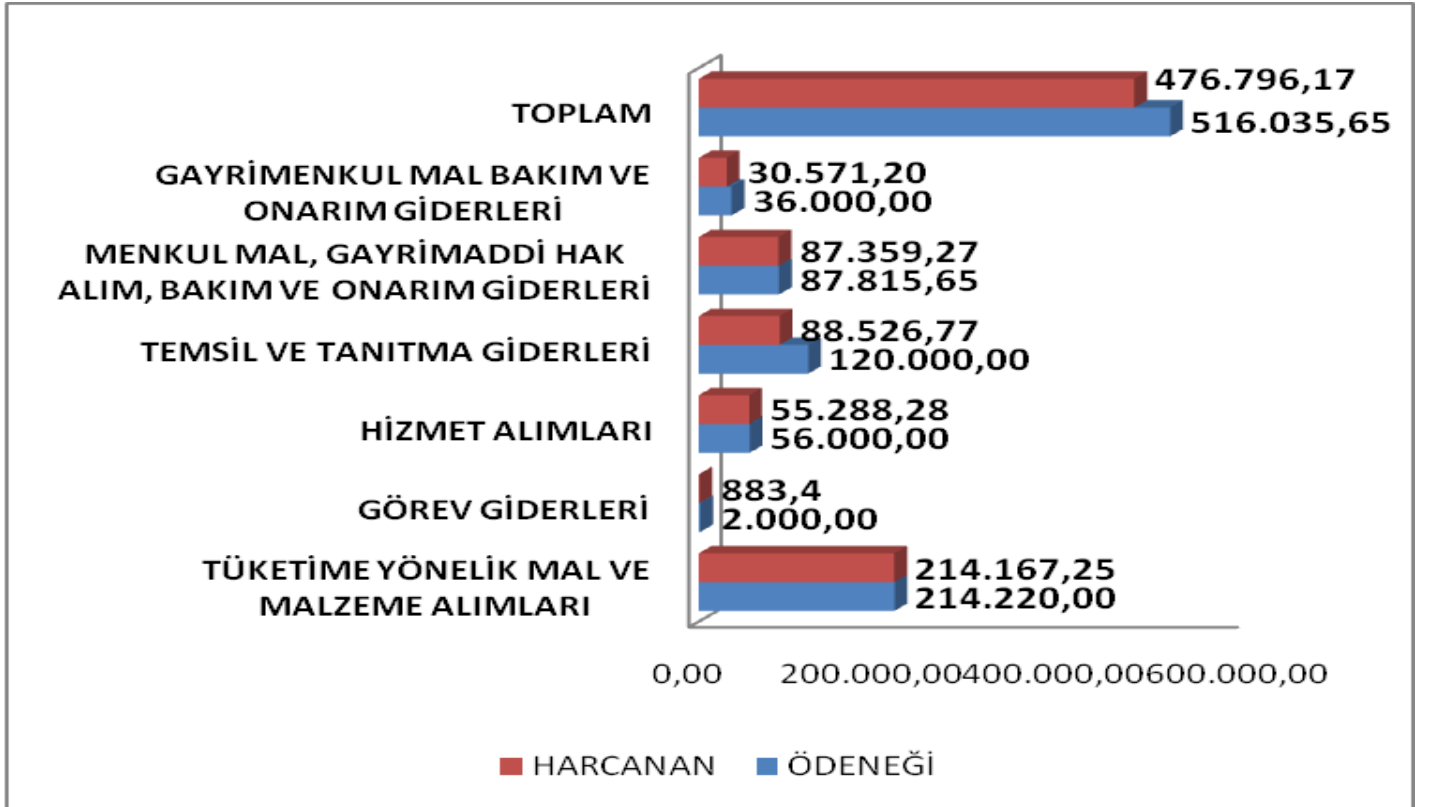

Üst Yönetim Faaliyetleri:

Araç Kiralama:

- Üst Yönetim kapsamında kullanılmak üzere 4 adet binek aracı kiralama (hizmet alımı) ihale iptali neticesinde doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiştir.
- Ankara'da düzenlenen "**9 Mayıs Avrupa Günü Şenliğine**" Avrupalı Eğitim Uzmanlarının Valiliğimiz koordinesinde katılım için 09.05.2012 tarihlerinde araç kiralama yapıldı.

2012 YILI FAALİYET RAPORU



Yüklenmeler:

Vali Evi boya ve badana işlemleri tamamlanırken küçük onarım kapsamındaki ihtiyaçlar giderildi.



2012 YILI FAALİYET RAPORU

- Müdürlük bünyesinde 2012 yılı Kasım ayında, Üst Yönetime ait araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt, Vali evinde kullanılmak üzere Kalorifer yakıtı alımı ihaleleri 138.090,00 TL. sözleşme bedeli olarak gerçekleştirilerek 2013 yılı ihtiyaçlarının karşılanması planlandı.
- Müdürlük bünyesinde 2012 Aralık ayında Vali Konağında bulunan Güvenlik Kuleleri yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.
- Üst Yönetim kullanımına dayanıklı tüketim malları kapsamında (TV, ses sistemi, termal fotoğraf baskı makinesi, kayıt cihazı ve aparatları) malzeme alımı gerçekleştirildi.

Medya Analizi:



Bartın Valiliği, Bartın İlçeleri, Bartın İl Özel İdaresi ve Küre dağları milli parkları ile ilgili basında çıkan haberlerin takibi, kupürlerin elektronik ortamda her gün sunulması, arşiv amaçlı kayıt altına alınması, raporlanması ve izlenebilmesi hizmetinin sözleşmeye bağlanması.

2012 YILI FAALİYET RAPORU



- Temsil Tören ve Ağırılama kapsamında 2012 yılında kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleşmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME CETVELİ

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		5	İl Genel Meclis Toplantı Salonunun Düzenlenmesi	Merkez	50.000,00		50.000,00				İl Özel İdaresi Hizmet Binası Deprem Güçlendirmesi Projesi nedeniyle salon düzenlemesi projesi gerçekleştirilememiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ

ORGANİZASYON ŞEMASI

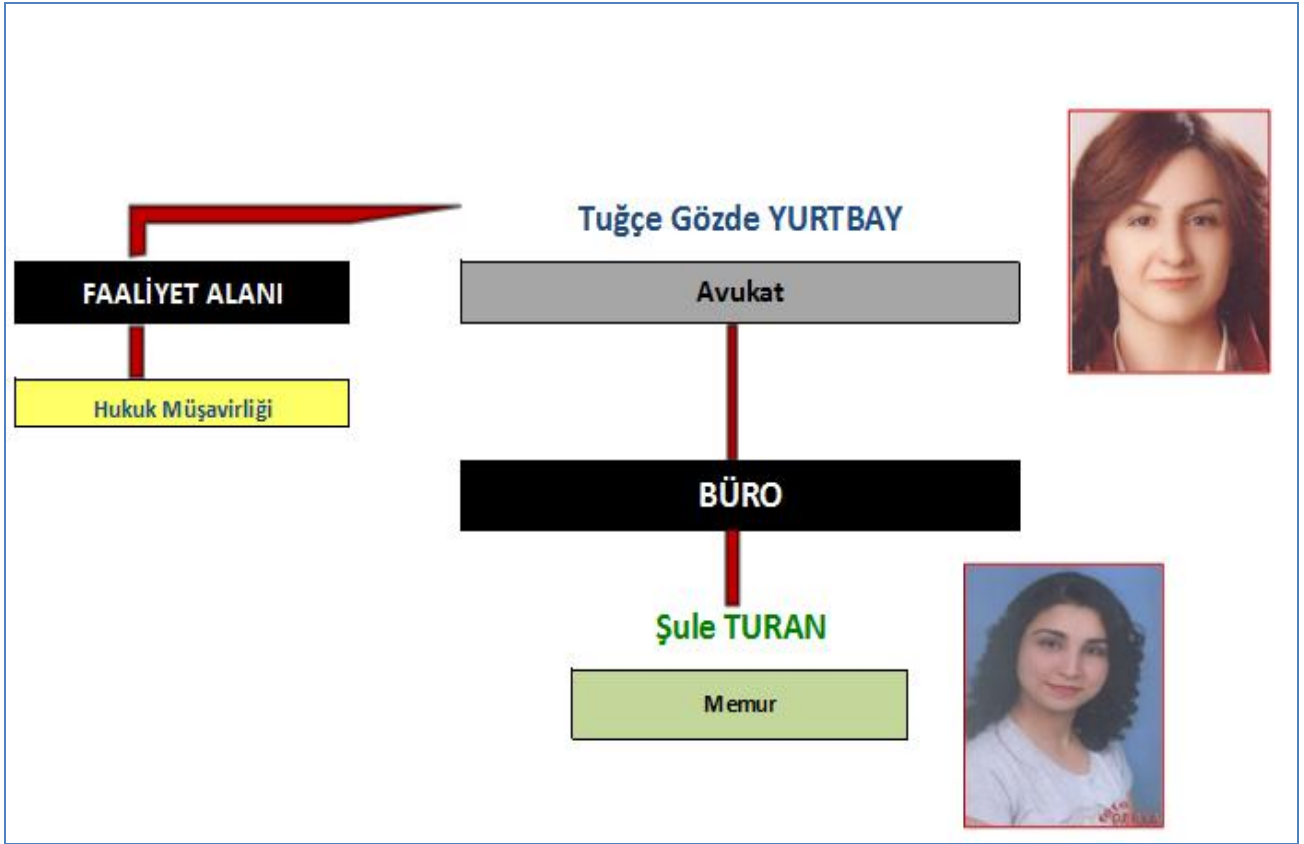

2012 yılı içinde Müşavirliğimize intikal edip, yürütülen iş ve işlemlerin analizi aşağıda belirtilmiştir.

- TAKİP EDİLEN DAVALAR:

2012 YILINDA AÇILAN DAVALAR:

Devam Eden : 34
Lehimize Biten : 2
Aleyhimize Biten : 7
Temyizde Olan : 1

olmak üzere TOPLAM: 44 adet dava 2012 yılında açılmıştır.

GEÇMİŞ YILLARDA AÇILIP 2012 YILINA DEVREDEN DAVALAR:

Devam Eden : 21
Lehimize Biten : 3
Aleyhimize Biten : 9
Temyizde Olan : 1

olmak üzere TOPLAM : 34 adet dava 2012 yılına devretmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

DAVALARIN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI:

- 3194 Sayılı İmar Kanunu Uygulamaları, Ecri misil İhbarnamesinin İptali	: 44
- Ücret Alacağı	: 8
- Meni Müdahale ve Kal	: 1
- Özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık	: 1
-Tazminat	: 3
- Kamu Malına Zarar Verme	: 1
- Markanın Hükümsüzlüğü	: 1
- Kamulaştırmasız El Atma ve Tescil	: 8
- Diğerleri	: 11
olmak üzere TOPLAM	: 78

- İCRA TAKİPLERİ:

2012 YILINA AİT İCRA TAKİPLERİ :

<u>ACILAN</u>	<u>DEVAM EDEN</u>	<u>İNFAZ</u>
2	1	1

ÖNCEKİ YILLARDAN 2012 YILINA DEVREDEN İCRA TAKİPLERİ:


<u>DEVAM EDEN</u>	<u>İNFAZ</u>
26	2

2012 yılında açılan ve geçmiş yıllardan devreden icra takibi sayısı toplamda 32 adettir.

EVRAK KAYIT BİLGİLERİ:

GELEN EVRAK..... : 469
GİDEN EVRAK..... : 290
HUKUKİ GÖRÜŞ.... : 17

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI KESİN HESABI



2012 YILI FAALİYET RAPORU

- İller Bankası ödenekleri çerçevesinde; Hasanefendi asfalt yama, Terkehaliller menfez yapımı, Topluca malzemeli bakım, Kumuca Zafer Abdaloğlu stabilize, Kirlikmüslümhoca betonarme yol yapım işleri olmak üzere toplam 5 adet proje tamamlanmış olup, Kalaycı-Sarıderesi-Aydınlar-Geriş-Epçiler kilit parke taşı işleri olmak üzere de toplam 5 adet proje ihale aşamasındadır.
- Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında asfalt programlarımızda İŞ-KUR vesilesiyle 9 adet geçici işçi çalıştırılmıştır.

İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARI

İLÇE	MERKEZ	ULUS	AMASRA	KURUCAŞİLE	TOPLAM TUL (KM)
1. KAT ASFALT	27	15	1	1	44
STABİLİZE	27	13,5	2,5	2	45
TABİİ MALZ. BAKIM	4,3	5,7			10
SICAK ASFALT BAKIM	3				3
MÜNFERİT İŞLER	Münferit İşler kapsamında 40 köyde mevsimsel ve bölgesel şartlar nedeniyle meydana gelen acil bakım işleri (heyelan, çökme v.b.) yapıldı.				
OSB KÖPRÜ YAPIMI	Organize Sanayi Bölgesi Köprü Yapımı tamamlanmıştır.				
STABİLİZE GREYDERLİ REGLAJ	3 km. Stabilize Greyderli Reglaj işi yapılmıştır.				3
KAR MÜCADELESİ	372 km. kar mücadelesi programı ilimizde fazla kar yağışı olduğundan 8.245 km. kar mücadelesi yapılmıştır.				8.245
BÜZ SANAT YAPISI	50 m Q 80' lık, 360 m Q 60' lık ve 455 m Q 40' lık geçme muflu beton büz alınarak yol altyapı ve standardının yükseltilmesinde kullanılmıştır.				
STANDARTLARI N YÜKSELTİLMESİ	10 km.' lik yolun standartlarının yükseltilmesi işi tamamlanmıştır.				
İLLER BANKASI	Hasanefendi asfalt yama, Terkehaliller menfez yapımı, Topluca malzemeli bakım, Kumuca Zafer Abdaloğlu stabilize, Kirlikmüslümhoca betonarme yol yapım işleri olmak üzere 5 adet proje tamamlanmış olup, Kalaycı-Sarıderesi-Aydınlar-Geriş-Epçiler kilit parke taşı işleri olmak üzere 5 adet proje ihale aşamasındadır.				

2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÖY-DES PROJESİ ÇALIŞMALARI

- Merkez İlçede; 17,3 km. stabilize, 16.876 km. sıcak asfalt bakım, 41,98 km. ssfalt tamiri ve 4 km. malzemeli bakım,
- Amasra İlçesinde; 16,5 km. asfalt tamiri,
- Kurucaşile İlçesinde; 6 km. asfalt tamiri,
- Ulus İlçesinde; 10,5 km. I. kat asfalt, 9,2 km. stabilize kaplama, 45 km. asfalt tamiri, 3 km. malzemeli bakım.
olmak üzere toplam 10,5 km. I. kat asfalt, 26,5 km. stabilize kaplama ve 114,480 asfalt yama yol yapımı projelendirilmiş olup,
- Sanat Yapıları 2x2.20 ebatında 28 adet Bax ve 1.50x1.50 ebatında 20 adet Bax alınarak köy yolları alt yapısında kullanılmıştır.
- Bu projelerden; Merkez İlçede 0,8 km. lik stabilize, 1,0 km. sıcak asfalt bakım ve 5 km. asfalt tamiri, Ulus İlçemizde 2 km. asfalt tamiri ve Amasra İlçemizde 0,7 km. asfalt tamiri yapımı mevsim şartlarının uygun olmaması nedeniyle durdurulduğundan gerçekleştirilememiştir. Ancak; hava şartlarının uygun hale gelmesine müteakip tamamlanacaktır.

KÖY-DES PROJESİ KAPSAMINDA TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR

İLÇE	1. KAT ASFALT (KM)	2. KAT ASFALT (KM)	STABİLİZE (KM)	SICAK ASFALT BAKIM (KM)	ASFALT TAMİRİ (KM)	MALZ. BAKIM (KM)	TOPLAM (KM)
MERKEZ	0	0	6,5	15,876	41,980	4	78,356
ULUS	10,5	0	9,2	0	43	3	65,7
AMASRA	0	0	0	0	15,8	0	15,8
KURUCAŞİLE	0	0	0	0	6	0	6
TOPLAM	10,5	0	25,7	15,876	106,78	7	165,856

NOT: - 31.12.2011 tarihi itibariyle, stabilize Köydes Projesinden 846 km., İl Özel İdaresinden 702 km. olmak üzere toplam 1.548 km. yol çalışması yapılmış, 2012 yılında ise 31.12.2012 tarihi itibariyle Köydes Projesinden 34 km., İl Özel İdaresinden 55 km. olmak üzere toplam 89 km. ilave stabilize yol çalışması yapılarak genelde 1.637 km. stabilize yol miktarına ulaşılmıştır.

- 31.12.2011 tarihi itibariyle, asfaltta Köydes Projesinden 615 km., İl Özel İdaresinden 544 km. olmak üzere toplam 1.159 km. yol çalışması yapılmış, 2012 yılında ise 31.12.2012 tarihi İl Özel İdaresinden 47 km. olmak üzere ilave asfalt yol çalışması yapılarak genelde 1.219 km. asfalt yol miktarına ulaşılmıştır.


2012 YILI FAALİYET RAPORU

ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ

MAKİNANIN CİNSİ		İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ	VALİLİK HİZMETLERİ
BİNEK ARAÇ	BİNEK OTOMOBİL	6	4
	BİNEK ARAZI ARACI	2	0
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI	AMBULANS	0	0
	MİNÜBÜS	1	0
	OTOBÜS (KÜÇÜK)	1	0
	OTOBÜS (BÜYÜK)	0	0
KAMYONET	750 KG LİK	0	0
	PİKAP	9	0
	KAMYONET (AKARYAKIT TANKERİ)	1	0
	3,5 TONLUK	0	0
KAMYON	5 TONLUK	0	0
	10 TONLUK	11	0
	20 TONLUK	18	0
	KASALI	0	0
	ÇÖP KAMYONU	2	0
	VİDANJÖR	1	0
İŞ MAKİNALARI	GREYDER	10	0
	DOZER	2	0
	KEPÇE	6	0
	SİLİNDİR	6	0
	PALETLİ EXCAVATÖR	2	0
	KANAL KAZICI	4	0
	KOMPRESÖR	0	0
	ROLEY TANK	1	0
	TREYLER (SEMİ-KASALI)	4	0
	SU TANKERİ-ARAZÖZ	2	0
	ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	2	0
	ASFALT FİNİŞERİ	1	0
	SEYYAR JEN. KAY. MAK.	0	0
	TREYLER ÇEKİCİ	2	0
	FORK-LİFT	1	0
	KONKASÖR	0	0
	KAMP TREYLER	4	0
	JENERATÖR	2	0
	ASFALT TAMİR BAKIM ARACI	1	0
	SEYYAR TAMİR ARACI	1	0
	GENEL TOPLAM	105	4

2012 YILI FAALİYET RAPORU

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KESİN HESABI

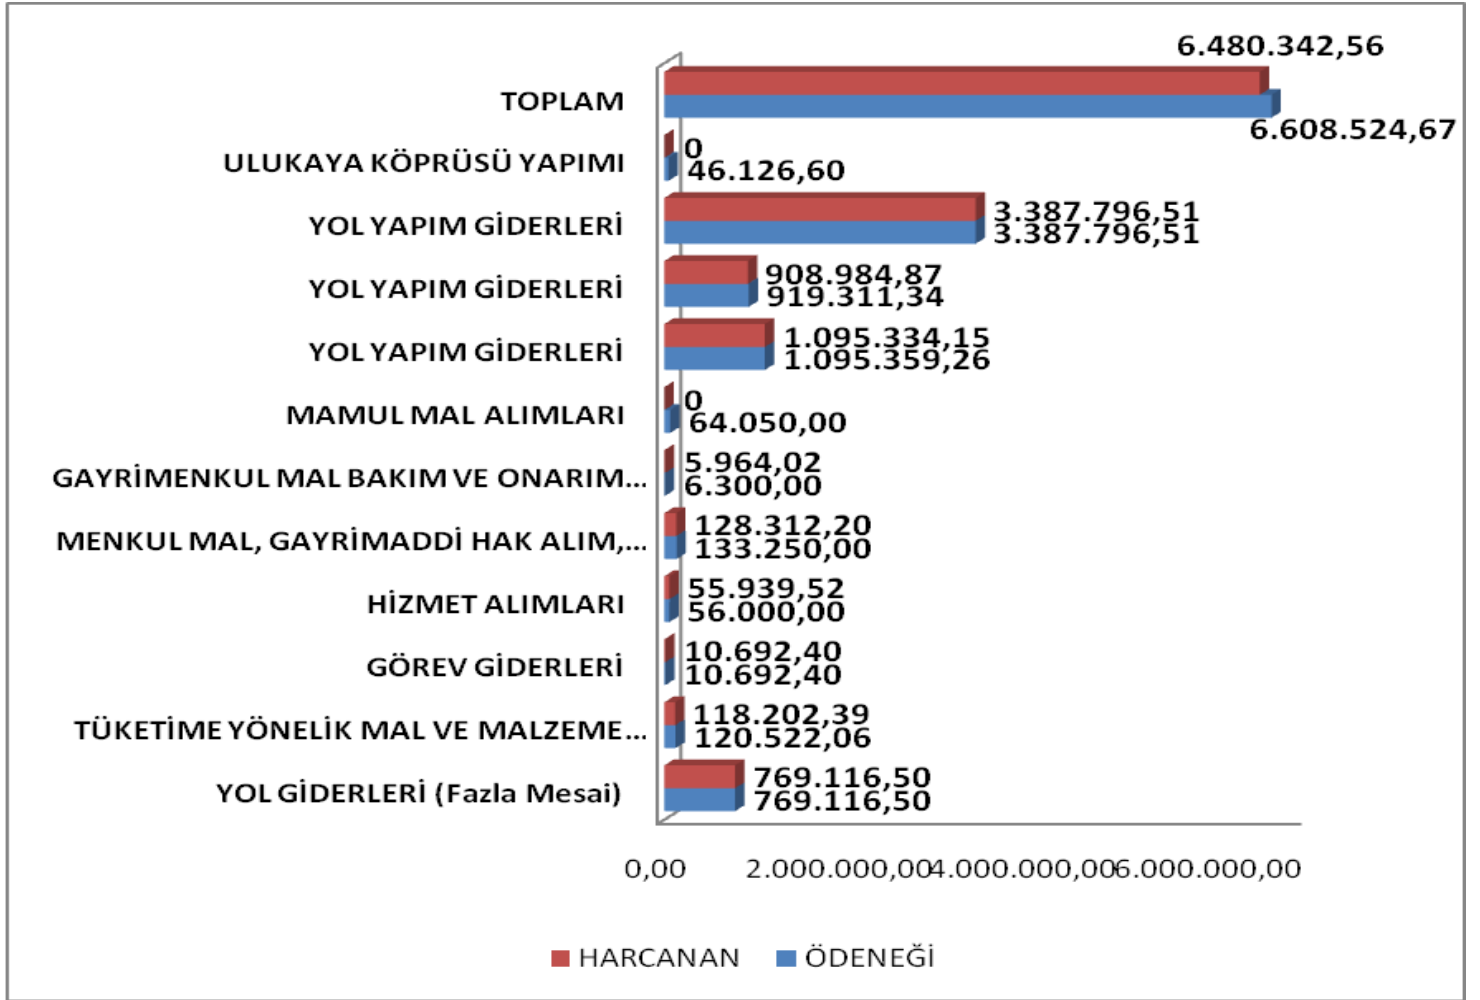

2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 241 adet doğrudan temin,

21/b maddesine göre 2 adet

21/f maddesine göre 6 adet ve

19. maddesine göre 3 adet ihale yapılmıştır.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DİĞER FAALİYETLERİ

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
S.NO	FAALİYET	MİKTARI	AÇIKLAMALAR
1	Hurda Araç Teslim Alınması	128 adet	Hurda araç teslimi ile ilgili başvuru formu idaremiz web sitesinde vatandaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2.maddesi ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı sonu itibariyle şahıslardan 112 adet hurda araç müdürlüğümüz tarafından teslim alınmıştır.
2	Araç Muayene İşleri	Araç Parkı	Müdürlüğümüz makine parkına kayıtlı olan tüm araçların trafik muayene işlemleri yapılmıştır.
3	Araç Sigorta İşleri	Araç Parkı	Müdürlüğümüz makine parkına kayıtlı olan tüm araçların trafik sigorta işlemleri yapılmıştır.
4	2012 Yılı Makine Ekipman Kira Bedelleri	Muhtelif	İl Genel Meclisince karar altına alınan makine ve ekipman kira bedellerine göre kiralama işlemleri yapılmıştır.
5	Makine Maliyet	Muhtelif	Müdürlüğümüz araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve yedek parça giderlerini gösterir tablolar Aylık ve Üç Aylık olarak makine maliyet biriminde düzenli olarak kontrol altında tutulmaktadır.
6	Madencilik	1 adet	Hammadde Üretim Belgesi verilme iş ve işlemleri yapılmıştır.
7	Kaçak Akaryakıt Teslim alınması	138.000 lt.	27.05.2007 tarih ve 26.534 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince 109.112 kg. kaçak akaryakıt müdürlüğümüz tarafından TÜPRAŞ A.Ş. ye teslim edilerek tasfiyesi sağlanmıştır.
8	Kaçak Akaryakıt Depolama Alanı	80.000 lt.	27.05.2007 tarih ve 26.534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre teslim alınan kaçak akaryakıt için takriben 80.000 Lt. stok kapasiteli depolama alanı üretilmiş olup, bunun 60.000 Lt.'ye tekabül eden 6 adet tankının montajları tamamlanarak hizmete alınmıştır.
9	T.Y.Ç.P.- İşkur Projesi	1 Proje	Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında tarafımızdan hazırlanan proje doğrultusunda yapılan sözleşme ile 1 dönem çalışma tamamlanmıştır.
10	Asfalt Plentine Bakım Yapılması	Muhtelif	Müdürlüğümüz asfalt plentinin yeni sezon öncesi bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır.
11	Yol Yardım Ekibi Kurulması	1 adet	Arazi çalışmalarında zaman kaybını asgariye indirmek için acil yol yardım ekibi kurulmuştur.
12	Kalibrasyon Ayarları	Muhtelif	Şantiye bünyesindeki kalibrasyon ayarı gerektiren alet ve makinelerde gerekli çalışmalar başlatılmış olup, periyodik olarak devam ettirilmektedir. Akaryakıt pompalarının dış şantiyeler de dahil olmak üzere tüm kalibrasyon işlemleri yaptırılmıştır.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER VE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
								NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1.	Ulaştırma	1.	1.Kat Asfalt Yapımı (47 km.)	İl Geneli	2.538.000,00		2.538.000,00	2.487.240,00	98	98	49 proje kapsamında 44 km. 1. kat asfalt yapımı tamamlanmıştır..
2.	Ulaştırma	2.	Stabilize Yapımı (45 km.)	İl Geneli	990.000,00		990.000,00	643.500,00	65	100	51 proje kapsamında 45 km. stabilize yapım işi tamamlanmıştır.
3.	Ulaştırma	3.	Tabii Malzemeli Bakım (10 km.)	İl Geneli	50.000,00		50.000,00	49.500,00	99	99	8 proje kapsamında 10 km. tabii malzemeli bakım işi tamamlanmıştır.
4.	Ulaştırma	4.	Standardın Yükseltilmesi Onarım (10 km.)	İl Geneli	130.000,00		130.000,00	130.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
5.	Ulaştırma	5.	Stabilize Greyderli Reglaj Yapımı (3 km.)	İl Geneli	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
6.	Ulaştırma	6.	Kar Mücadelesi (372 km.)	İl Geneli	93.000,00		93.000,00	93.000,00	100	100	İlimizde Ocak-Şubat-Mart aylarında yağın yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 8.245 km. köy yolu yeniden ulaşıma açılmıştır.
7.	Ulaştırma	7.	Büz-Sanat Yapıları	İl Geneli	14.000,00		14.000,00	14.000,00	100	100	Tamamlanmıştır.
8.	Ulaştırma	1.	Organize Sanayi Bölgesi Köprü Yapımı	İl Geneli	3.000.000,00	775.451,34	2.224.548,66	1.692.682,17	76	100	Geçici kabul yapılmıştır.
9.	Ulaştırma	3.	Köprü ve Tünel Etüt ve Proje Giderleri	İl Geneli	200.000,00		200.000,00	0,00	0	0	2012 yılı birim fiyatları ile 531.000,00 TL. ek ödeneye ihtiyaç duyulduğundan işe başlanılamamıştır.











2012 YILI FAALİYET RAPORU




2012 YILI FAALİYET RAPORU



2012 YILI FAALİYET RAPORU

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

ORGANİZASYON ŞEMASI

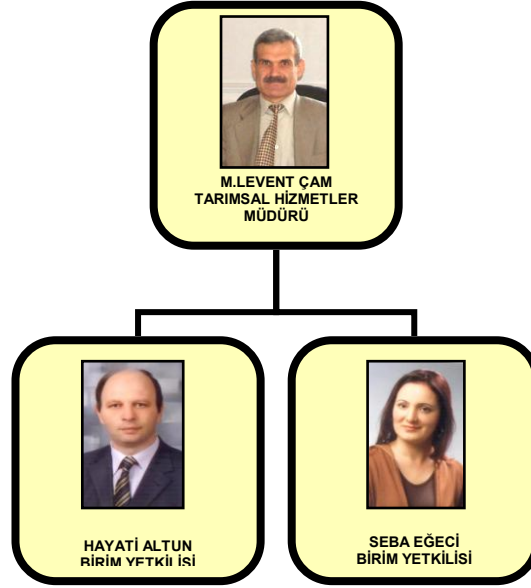

2012 yılı Çalışma ve Yatırım Programı ve Performans Planında 11 adet proje hedeflenmiş, 1 adet ek proje (Çakraz Kanalizasyon Yapım İş) olmak üzere toplam 12 adet projeden;

- Yem Alımları:
- Meyvecilik ve Çilekçiliği Geliştirme:
- Deneme Demonstrasyon ve Organik Tarım
- Canlı Hayvan Alım Bakım ve Diğer Giderler
- Park Bahçe (Çocuk Oyun Grubu Alımı)
- İçme suyu ve Kanalizasyon Tesis Yapımı
- Sahil Yolu Düzenlemesi
- Köy Meydanı ve Mezarlık Yapımı
- Yolcu Bekleme Durağı ve Bank Yapımı
- İl Özel İdaresine ait Binaların Çevre Düz. Yap.
- Küçük Ölçekli Gölet Yapımı (Etüt Proje Fizibilite Çalışmaları)
- Çakraz Kanalizasyon Yapım İş: olmak üzere,

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Yem Bitkileri Tohum Desteği:

Bartın ilinde Hayvancılığa destek amacıyla İl Özel İdaresi olarak üreticilere yem bitkisi tohum desteği sağlanması amaçlanmıştır.

Silajlık Mısır Tohumu:

24.000 kg. alınmış olup, 503 adet çiftçiye dağıtılmıştır.



Çocuk Oyun Parkı Kurulması:

Merkez ilçede 11, Amasra'da 3, Kurucaşile'de 1, Ulus'da 5 adet olmak üzere toplam **20 adet çocuk oyun parkı hizmete sunulmuştur.** Önümüzdeki yıllarda da uygulamalar devam edecektir.

ÇOCUK PARKI KURULAN KÖYLERİMİZ	
İLÇE ADI	KÖY ADI
MERKEZ İLÇE	Büyük kıran, Bayır yüzü, Gözpınarı, Karasu, Yeşilyurt, Karaya kup, Usta oğlu, Yeşil kaya, Akçalı, Gökçe kıran, Ak göz
AMASRA İLÇESİ	Yukarısal, İnciğez, Kocaköy
ULUS İLÇESİ	İğneciler, Eseler, Konak, Akören söküler, Sarnıç
KURUCAŞİLE İLÇESİ	Kapı suyu

2012 YILI FAALİYET RAPORU



Otobüs Durağı Kurulması:

Merkez ilçede 12 adet, Amasra İlçemizde 1 adet, Kurucaşile İlçemizde 2 adet, Ulus İlçemizde 3 adet olmak üzere **toplam 18 adet otobüs durağı hizmete sunulmuştur**. Önümüzdeki yıllarda da uygulamalarımız devam edecektir.

OTOBÜS DURAĞI KURULAN KÖYLERİMİZ	
İLÇE ADI	KÖY ADI
MERKEZ İLÇE	Budak düzü,Karahüseyinli Gr.,Çiftlik,Kutlubeytabaklar Gr. Epçiler Gr.,Serdar,Akpınar,Çukur buk, Ecikler Gr. Sütluce Elli baş, Aşağı dere- Öz başı Gr.
AMASRA İLÇESİ	İnpiri-Makaracı-İnceğiz Kavşağı
ULUS İLÇESİ	Kadıköy Gr.,Kozanlı Gr.,Zafer köyü
KURUCAŞİLE İLÇESİ	Dizler mezeci, Çayırılı Mahallesi Gr. Yolu

2012 YILI FAALİYET RAPORU



İÇMESUYU HİZMETLERİ

İÇMESUYU BORUSU YARDIMI YAPILAN KÖYLERİMİZ		
İLÇE ADI	KÖY SAYISI	VERİLEN MİKTAR
MERKEZ İLÇE	24	18.260 mt.
AMASRA İLÇESİ	3	2.636 mt.
ULUS İLÇESİ	7	3.062 mt.
TOPLAM	34	23.958 mt.

İÇMESUYU BORUSU YARDIMI YAPILAN KÖYLERİMİZ	
İLÇE ADI	KÖY ADI
MERKEZ İLÇE	Gürgen pınar, Geriş, Özbaşı, Mamak, Kümesler, Kayadibikavlak, Sülek, Uluköy, Hocaoglu, Akçamescit, Hıdırlar, Güzelcehisar, Çiftlik, Ellibaş, Kaman, Karamazak, Çukurbük, Karahüseyinli, Sötlüce, Ustaoglu, Bakraçboz, Şarköy, Uğurlar, Epçilerkadi
AMASRA İLÇESİ	Ali obası, İnpiri, Esenler
ULUS İLÇESİ	Ulu köy, Ulu kaya, Kalecik, Ballicak, Eseler, Kozanlı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

İÇMESUYU HİZMETLERİ



İLÇE ADI	KÖYÜN ADI	YAPILAN İŞİN CİNSİ
ULUS İLÇESİ	Dodurga Köyü	ENH. Motopomp, Terfi Binası, Terfi Hattı
ULUS İLÇESİ	Isırganlı Köyü	4000 metre 50/63-10 PE-100 ve 3500 metre 32/40-16 PE-100 boru verildi
ULUS ve MERKEZ İLÇE	Dodurga Köyü Karamazak Köyü Şabankadı Köyü	600 metre 32/40-10 PE-100 1000 metre 40/50-10 PE-100 3800 metre 50/63-10 PE-100 boru ve 2 adet 50/63 Basınç Düşürücü vana verildi.
TOPLAM	3	

Suyu Yetersiz Alanlara Su Taşıma Yapılması:

İçme suyu takviyesi yapmak amacıyla; idaremiz tankeriyle su taşıma işi yapıldı.




2012 YILI FAALİYET RAPORU

Mevsimsel olarak yeteri kadar yağış alınamaması nedeniyle oluşan kuraklıktan dolayı azalan su kaynaklarının en aza indiği yaz aylarında içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya olan köylerimize ve okullarımıza içme suyu takviyesi yapmak amacıyla İdaremiz tankeri ve Kiralık tankerle 1240 ton sutaşıma işi yapıldı

İÇMESUYU TAKVİYESİ YAPILAN KÖYLERİMİZ	
İLÇE ADI	KÖY ADI
MERKEZ İLÇE	Göz pınar 120 ton, Karamazak 100 ton, Hacı osmanoğlu 60 ton, Baş oğlu 100 ton, Tuzcular 60 ton, Ulugeçikadı 80 ton, Çakır demirci 40 ton, Akmanlar 20 ton, Serdar 40 ton, Ulugeçitambarcı 120 ton, Kutlubeytabaklar 80 ton, Küçükkızılkum 100 ton, Kutlubeydemirci 60 ton, Çakır kadı 20 ton, Karahüseyinli,20 ton, Çiftlik 20 ton, Esenyurt 40 ton, Kışla 20 ton, Çukur ambarcı 20 ton
ULUS İLÇESİ	Aşağı dere 20 ton, Sarnıç 20 ton

Hayvan Hastalıkları Ve Zararlıları İle Mücadele:

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2012 Yılı Yatırım Programındaki “Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele Projesi” kapsamında, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bulaştırıcı kenelere karşı yetiştiricilerimizin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını ilaçlamak üzere 920 kutu kene ilacı alımı yapıldı. İdaremiz tarafından alınan Kene İlacı Veteriner Hekimler tarafından yerinde uygulanmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilmiştir.



Çakraz Kanalizasyon Projesi:

Bartın'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Çakraz'ın Kanalizasyon ihalesi müdürlüğümüzce yapılmış olup, 2013 yılı içerisinde inşaatın yapım işine başlanacaktır.




2012 YILI FAALİYET RAPORU

Köy Mezarlıklarına Çevre Düzenlemesi Yapılması:

2012 YILINDA MEZARLIKLARINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILAN KÖYLER	
İLÇE ADI	KÖY ADI
MERKEZ İLÇE	Budak düzü (200m2 parke yol, Kapı),Topluca (200m2 parke yol, Kapı),Epçilerkadı (200m2 parke yol, Kapı), Dır azlar (4000mtel örgü, 416 adet beton direk, 850 kg Çimento)
AMASRA İLÇESİ	Göçgündemirci (260 mtel örgü, 80 adet beton direk)
ULUS İLÇESİ	Kıyıklar-Akören söktüler-Ceyüpler (15 ton Çimento, 64m3 Kum-Çakıl, 1500 kg Demir) Ulu kaya (200m2 parke yol, Kapı)
KURUCAŞİLE İLÇESİ	İlyas geçidi,(200m2 parke yol, Kapı)

Parkeli Yürüyüş Yolu Yapılması işi

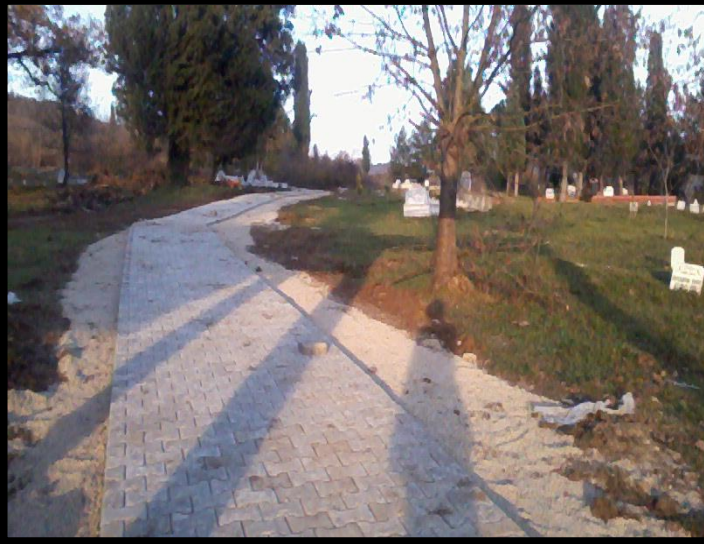

Koruma Duvarı Yapılması işi



Mezarlık Kapısı Yapılması işi

2012 YILI FAALİYET RAPORU

İŞ YERİ RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

İşyeri Ruhsatı:

2012 yılı 31 Aralık ayı sonu itibarı ile **102 adet işyerine iş yerine ruhsatı verilmiştir.**


Denetim:

İdaremizce ruhsat verilen işyerlerinin denetimleri yapılmaktadır. İdaremizce denetimler Ruhsat vermeden önce 1. Denetim ve ruhsat verdikten sonra da 2. Denetim olmak üzere yapılmaktadır.

2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 32 adet doğrudan temin,
21/f maddesine göre 3 adet ve
19. maddesine göre 1 adet ihale yapılmıştır.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KESİN HESABI

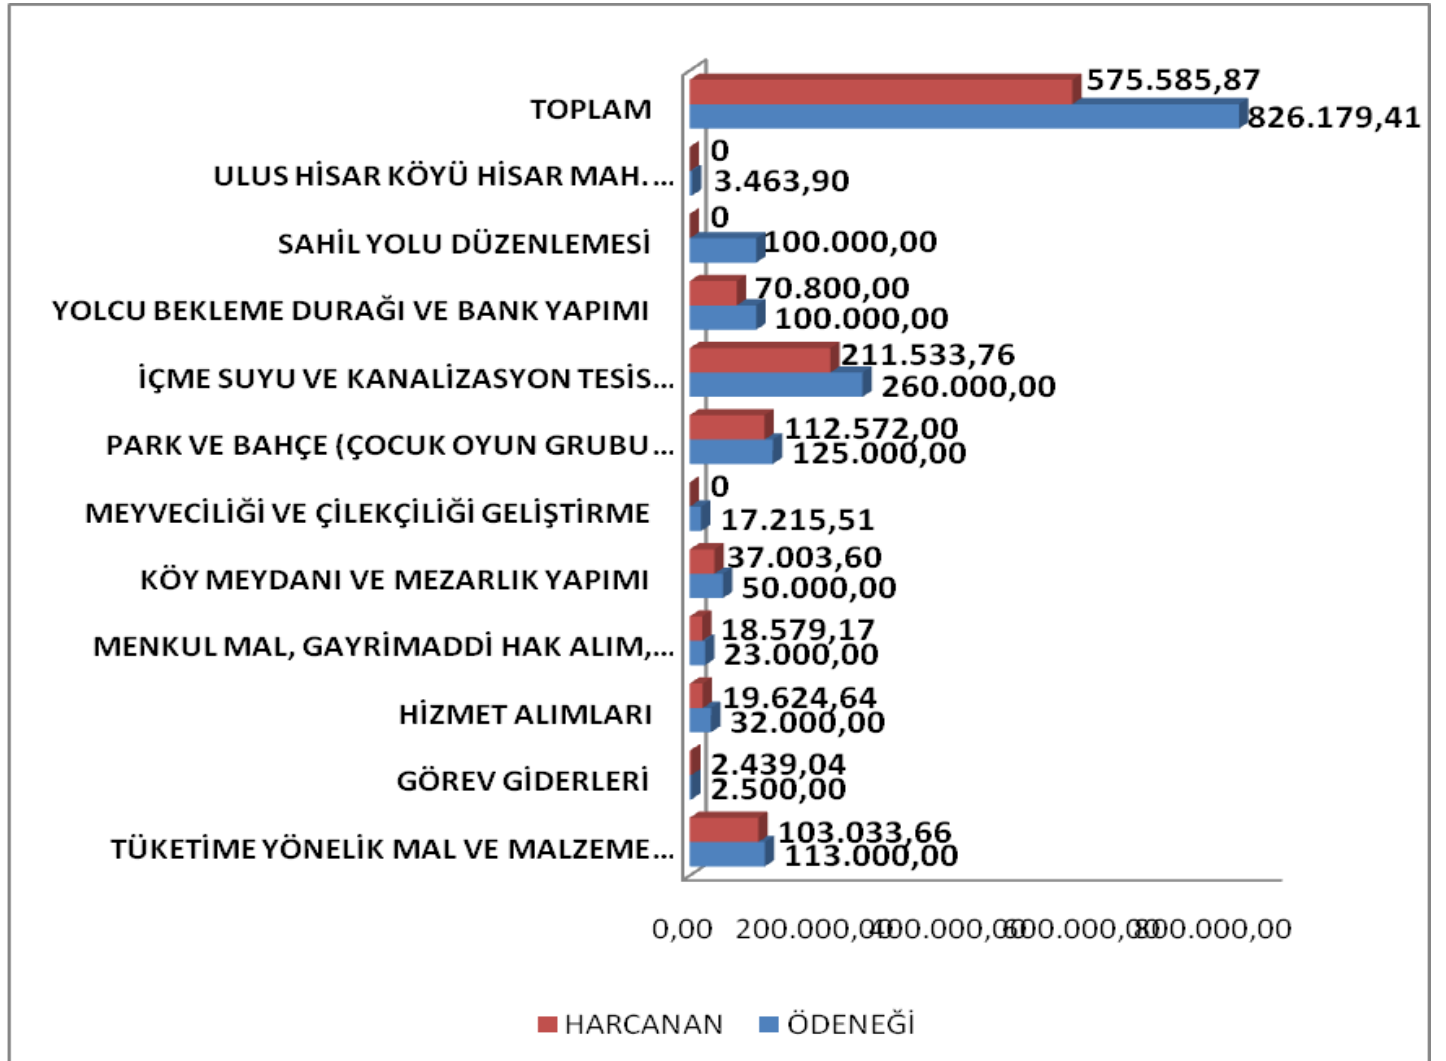


2012 YILI FAALİYET RAPORU

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
								NAKDİ HARC. (')	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.01	YEM ALIMLARI	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ	90.000,00		90.000,00	84.840,00	94,27	100	24.000 kg Silajlık Mısır Tohumu 503 kişiye dağıtılmıştır.
2	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.02	MEYVECİLİK VE ÇİLEKÇİLİĞİ GELİŞTİRME	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ							Meclis kararı ile yatırım programından çıkarılmıştır.
3	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.03	DENEME DEMONSTRASYON VE ORGANİK TARIM PROJESİ	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ							Meclis kararı ile yatırım programından çıkarılmıştır.
4	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.04	CANLI HAYVAN ALIM, BAKIM VE DİĞER GİDERLERİ	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ	10.000,00		10.000,00	9.737,00	97,37	100	İlimizde kene ile mücadele kapsamında 460 litre kene ilacı alım işi gerçekleştirilmiş olup Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
5	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.05	PARK VE BAHÇE (ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI)	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ	125.000,00		125.000,00	112.572,00	90,06	100	20 adet çocuk parkı alınmış olup kurulum çalışmaları tamamlandı.
6	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.06	İÇME SUYU VE KANALİZASYON TESİS YAPIMI	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ	220.000,00		220.000,00	211.503,64	96,14	100	Kanal kazıcı kiralama Trafo, Pano Alımı Afet borusu Alımı (12Köy) Kanal kazıcı kiralama Muhtelif Boru, Fittings Alımı Su Tankeri Kiralama Muhtelif Boru Alımı (10Köy) Çakraz Kanalizasyon Proje işi yapıldı.
7	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.07	SAHİL YOLU DÜZENLEMESİ	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ	100.000,00		100.000,00	0	0	50	Devam ediyor. İmar planındaki sorunların giderilmesi beklenmektedir.
8	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.08	KÖY MEYDANI VE MEZARLIK YAPIMI	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ	50.000,00		50.000,00	44.319,12	88,64	100	Köy yerlerinin düzenli ve planlı yerleşim alanlarına sahip olması için 9 adet köy tespit edildi ve malzemelerin teslim edilmiştir.
9	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.09	YOLCU BEKLEME DURAĞI VE BANK YAPIMI	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ	100.000,00		100.000,00	70.800,00	70,8	100	Otobüs Duraklarının montajları yapılmıştır.
10	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.10	İL ÖZEL İDARESİNE AİT BİNALARIN ÇEV. DÜZ. YAP.	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ	5.000,00		5.000,00	2.493,34	49,87	100	Motorlu Tırpan Alımı yapıldı. Muhtelif Çiçek Alımı yapıldı. Çim Bıçma Makinesi Alındı.
11	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.11	KÜÇÜK ÖLÇEKLİ GÖLET YAPIMI İÇİN (ETÜT PROJE VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI)	BARTIN İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ	2.000,00		2.000,00	0	0	100	Köylerimizin içme, kullanma ve tarımsal sulama amaçlı suların temin edilmesi için gölet proje çalışmaları için teknik gezi yapıldı.
12	Diğer Kamu Hizmetleri	38.00.12	Çakraz Kanalizasyon Yapım işi	ÇAKRAZ	1.000.000,00		1.000.000,00	0	0	0	İhale yapıldı sözleşme aşamasındadır.

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ



2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;
22/d maddesine göre 134 adet Doğrudan Temin,
21/b maddesine göre 11 adet,
21/f maddesine göre 4 adet ve
19. maddesine göre 17 adet ihale yapılmıştır.

1- EĞİTİM HİZMETLERİ:

- ▶ İlköğretim ve Anaokullarımıza 1314 Ton Taş Kömürü alınarak dağıtımı yapılmıştır.
- ▶ Taşımali İlköğretim Lise (1-2) kapsamında 2382 Öğrenciye Taşıma Hizmeti Alımı yapıldı.
- ▶ 1933 Ortaöğretim Öğrencisine Yemek Hizmeti Alımı Yapıldı.
- ▶ 6128 öğrencinin 38 Taşıma merkezine taşınması Hizmet Alımı İhalesi yapıldı.İşe başlandı devam ediyor.
- ▶ 18 Adet İlköğretim Okulumuzun temizlik ihtiyacını karşılamak üzere personel hizmet alımı yapılmıştır.
- ▶ İlimizde meydana gelen Afet nedeni ile 15 adet Okulun Çatı Onarımı bitti.
- ▶ 46 Adet İÖÖ nun küçük onarımları Doğrudan Temin Kapsamında Yapılmıştır.(Kalorifer , Elektrik,İnşaat onarımları)
- ▶ TOKİ İlköğretim Okulu ve Kemal Sabriye Ocakçı İlköğretim Okulu Öğretmenler Odası donatım ve düzenlemesi yapıldı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Akcamescit İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu Yapımı:

İl Özel İdaremiz 2012 yılı Çalışma ve Performans Programında yer alan Akcamescit İÖO Kapalı Spor Salonu Yapım İşi İnşaatı tamamlanmıştır. Yaklaşık 950 m² kapalı spor salonu, yine nizami ebatlarda yüzeyi özel beton olan basketbol-voleybol sahası ile 500 m² çim sahadan oluşan (antrenman sahası) Akcamescit İÖO Kapalı Spor Salonu 2012–2013 Eğitim Öğretim yılında hizmete girmiştir.



2012 YILI FAALİYET RAPORU

Merkez Ve İlçelerimizdeki İlköğretim Okullarımızın Deprem Tetkikleri:

Temel Eğitim Okulları Deprem Tetkiki ve Güçlendirme Proje Yapımı kapsamında İlimiz merkez ve İlçelerimizdeki İlköğretim Okullarından 11 adet okul binasının deprem tetkik çalışmaları bitirilmiştir.

İlimizde;

Merkez İlçede:

- ▶ Hendekyanı İlköğretim Okulu,
- ▶ İnönü İlköğretim Okulu ,
- ▶ Gölbucağı Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlköğretim Okulu,
- ▶ Terkehaliller İlköğretim Okulu,
- ▶ Fatih İlköğretim Okulu,
- ▶ Kocareis İlköğretim Okulu

Amasra İlçesi:

- ▶ Köksal Toptan İlköğretim Okulu

Kurucasile İlçesi:

- ▶ Sarıderesi İlköğretim Okulu

Ulus İlçesi:

- ▶ Ulus Kumluca YİBO
- ▶ Ulus Zafer İlköğretim Okulu,
- ▶ Ulus Abdüpaşa İlköğretim Okulu,
- ▶ Ayrıca İdareimizce Kaleşah İlköğretim Okulu ile Merkez Ellibaş Ortaokulunun deprem tetkikleri yaptırılmış ve Ellibaş Ortaokulunun Deprem Güçlendirmesi ve Onarım İşine 25.01.2013 tarihinde başlanacaktır.

İl Özel İdaresi Nurgül-Rıza Güney Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Yapımı:

- ▶ İdareimizce Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Temel İnşaat (Subasman Seviyesi) ve Çevre Düzenlemesi yapım işi bitirilmiş ve 217.120,00 TL' harcama yapılarak, tamamlanmak üzere hayırsever vatandaş Rıza GÜNEY'e 27.12.2012 teslim edilmiş ve 5 ay içerisinde bitirilmesi sağlanacaktır.



2012 YILI FAALİYET RAPORU

İL GENELİNDE 50 ADET TEMEL EĞİTİM-LİSE OKULLARININ BAKIM VE ONARIMLARI:

Şehit Necdet Orhan Yibo Onarımı	İstiklal İlköğretim Okulu Onarımı
Kumluca Yibo Onarımı	Gökkuşluğu Anaokulu Onarımı
Kocareis İlköğretim Okulu Onarımı	Milli Eğitim Lojmanları Deprem Tahkiki ve Onarımı
Esenyurt İ.Ö.O. Çevre Düzen.Ve Onarımı	Anadolu Öğretmen Lisesi Deprem Tahkik ve Onarımı
İmkb İ.Ö.O. Onarımı	Köksal Toptan Lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı
Hasankadı İ.Ö.O Onarımı	Bartın Lisesi Deprem Tahkiki Ve Onarımı
Akçalı İ.Ö.O. Çevre Düz Ve Onarımı	Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi Deprem Tahkiki Ve Onarımı
Terkehaliller İ.Ö.O Onarımı	Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı
Hendekyanı İlköğretim Okulu Onarımı	Cumhuriyet Lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı
Aydınlar İ.Ö.O.Çevre Düz. Ve Onarımı	Merkez Teknik Lise Ve Eml Deprem Tahkiki ve Onarımı
Ağaköy İlköğretim Okulu Onarımı	Ticaret Meslek Lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı
Özbaşı İlköğretim Okulu Onarımı	Kız Meslek Lisesi Ve And. Kml Deprem Tahkiki ve Onarımı
Yeşilkaya İlköğretim Okulu Onarımı	Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesi Deprem Tahkiki Ve Onarımı
Ulus Zafer İlköğretim Okulu Onarımı	Kızılelma Çpl Deprem Tahkiki Ve Onarımı
Kurucaşile Karaman İlköğretim Okulu Onarımı	Hasankadı Çpl Deprem Tahkiki Ve Onarımı
Hisar Pirireis İlköğretim Okulu Onarımı	Amasra Otelcilik Ve Tur. Mes. Lisesi
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Onarımı	Deprem Tahkiki Ve Onarımı
Şehit Ahmet Telli İlköğretim Okulu Onarımı	Abdipaşa Çpl Deprem Tahkiki ve Onarımı
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Onarımı	Ulus Çpl Deprem Tahkiki Ve Onarımı
Sütlüce İlköğretim Okulu Onarımı	Merkez Halk Eğitim Merkez Ve Aso Onarımı
Gürgenpınarı İ.Ö.O. Çevre Düzenlemesi	Kurucaşile Halk Eğitim Merkezi Onarımı
Epçiler İlköğretim Okulu Çevre Düzenlemesi	Umut İlköğretim Okulu Deprem Tahkiki Ve Onarımı
Vali Tevfik Başakar İ.Ö.O. Çevre Düz Onarımı	İmam Hatip Lisesi Ek Bina Proje Yapımı Ve Onarımı
Mustafa Aydede Anaokulu Çevre Düzenlemesi İşi	Ulus 75. Yıl İlköğretim Okulu Onarımı
Şehit Gürdal Çakır İlköğretim Okulu	Abdipaşa İlköğretim Okulu Onarımı
İlyasgeçidi İlköğretim Okulu Onarımı	

2012 YILI FAALİYET RAPORU

ONARIMI TAMAMLANAN OKULLAR



2012 YILI FAALİYET RAPORU

ONARIMI TAMAMLANAN OKULLAR



2012 YILI FAALİYET RAPORU

İlimizde Meydana Gelen Fırtına Nedeniyle Zarar Gören 15 Okulun Çatı Onarımı:

İlimizde 12.08.2012 tarihinde meydana gelen fırtına nedeniyle zarar gören 15 adet okulumuzun çatı onarımları tamamlanmıştır. Söz konusu proje için **683.145,64 TL'lik bir harcama yapılmıştır.**

- Ş.ÇAVUŞOĞLU FEN LİSESİ VE PANSİYON BİNASI
- MERKEZ TEKNİK LİSE VE EML
- M.KEMAL ORTAOKULU
- AKÇALI İ.Ö.O.
- BİLİM SANAT MERKEZİ
- TİCARET MESLEK LİSESİ
- BARTIN LİSESİ
- KIZ MESLEK LİSESİ
- ŞEHİT NECDET ORHAN YİBO
- KEMAL SABRİYE OCAKCI İ.Ö.O.
- CUMHURİYRT ANADOLU LİSESİ
- ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
- ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
- İMAM HATİP ANADOLU LİSESİ EK BİNA
- İMAM HATİP ANADOLU LİSESİ ANA



2012 YILI FAALİYET RAPORU

TOKİ İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLER ODASI DONATIM VE DÜZENLEMESİ



2012 YILI FAALİYET RAPORU

YANAZ İLKÖĞRETİM OKULU



İL ÖZEL İDARESİ MUSTAFA AYDEDE ANAOKULU KIŞ BAHÇESİ



ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU YAPIMI:

İL Özel İdaresi 2012 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı ve Performans Planında yer alan Atatürk İlköğretim Okulu Yapım ihalesi 10.12.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.



2- KÜLTÜR ve TURİZM HİZMETLERİ:

- İl sınırları içinde gerek tarihi, gerek arkeoloji ve doğa turizmi yönünden ele alınması gereken;

2012 YILI FAALİYET RAPORU

- Fırınlı Köyü sınırları içerisindeki tarihi kale,



- Çaybükü, Akıncılar , Karayakup mevkiindeki Davuttepe Höyüğü,
- Sipahiler Köyündeki mağara,



► Çeştepe köyündeki höyük,

- Saraylı- Karasu köyündeki Gölbaşı Gölü,



2012 YILI FAALİYET RAPORU

- Mugada, Kızılkum, Hatipler Köylerinin Turizme kazandırılmasına ait etüd proje fizibilite çalışmaları için komisyon oluşturularak çalışmalar bitirilmiştir.



- Kültür ve Turizm alanında tanıtılması için görsel ve yazılı tanıtıcı yayın alımı gerçekleştirilmiştir.
- İlimiz Amasra İlçesinde Bulunan tarihi Akrapol Kazı Alanına ait Arkeolojik kazı alanının ot temizliği ve çevre emniyetinin sağlanması için tel örgü ile çevrilmesi işi tamamlanmıştır.

3- SPOR HİZMETLERİ:

- Kurucaşile Futbol Sahası Işıklandırılması işi projesi tamamlanarak, spor alanındaki hizmetlerimiz devam etmektedir.



Kurucaşile Futbol Sahası Işıklandırılması İşi

2012 YILI FAALİYET RAPORU



- Faal olan Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardımı yapılmıştır.






4- EMNİYET HİZMETLERİ:

- İlimiz Merkez Kozcağz Beldesine Jandarma Kamera Güvenlik Sistemi Yapımı ihalesi yapılmış ancak ihale iptal edilmiştir. Söz konusu projenin gerçekleştirilebilmesi için yeniden ihale çalışmalarına başlanılmıştır.



2012 YILI FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KESİN HESABI

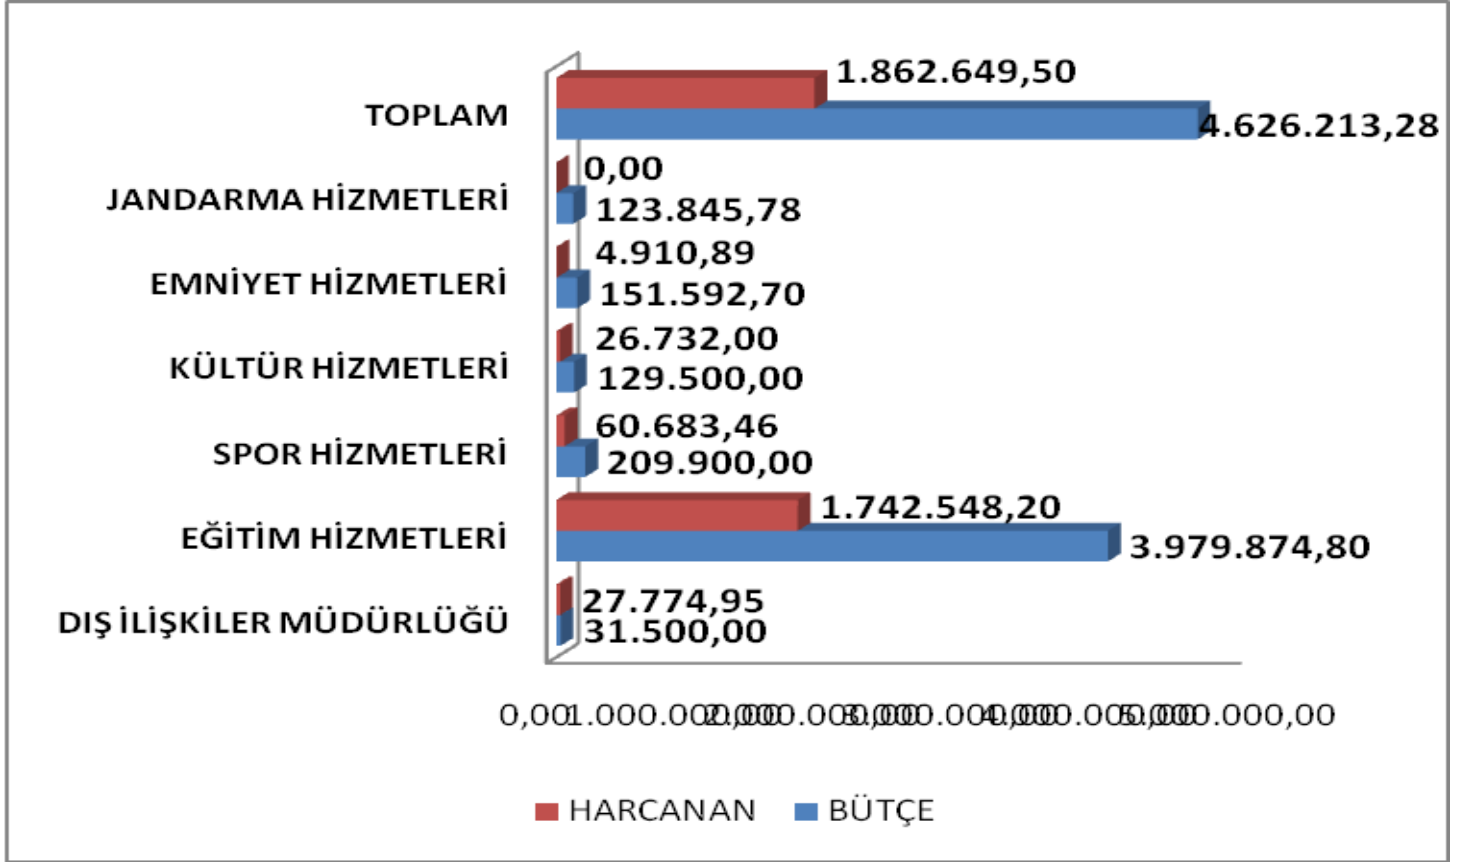

2012 YILI FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI YATIRIM İZLEME CETVELLERİ								
	EĞİTİM	SPOR	KÜLTÜR	EMNİYET	JANDARMA	BELEDİYELER	ÇEVRE	TOPLAM
BİTEN PROJE	56	1	2			4		63
DEVAM EDEN PROJE	2		1					3
YER TESLİMİ AŞAMASINDA								
SÖZLEŞME AŞAMASINDA								
İHALE AŞAMASINDA	8				1			9
KABÜL AŞAMASINDA	2							2
YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLIĞINDA								
PROJE AŞAMASINDA								
İPTAL EDİLMİŞ PROJE SAYISI	10	10					1	21
BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI	1							2
TOPLAM	79	11	3		1	4	1	99

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİK İ Gerç. %	
1	EĞİTİM		5	ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU	Merkez	2.700.000,00		577.000,00				10/12/2012 tarihinde ihalesi yapılmış olup, şikayet olması nedeniyle Kamu İhale Kurumuna itirazın şikayet süresi beklenilmektedir.
			8					2.265.975,00	46.020,00	2		
2	EĞİTİM		5	APDİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU EK BİNA YAPIMI	Ulus	500.000,00		150.000,00		0		İl Genel Meclisinin 03/07/2012 tarih ve 41 sayılı kararı ile proje değişikliği yapılarak, Apdipaşa ÇPL ve Kapalı Spor Salonu yapımına esas 03/01/2013 tarihinde zemin etüdü ve proje ihalesine çıkıldı.
			8		Ulus	500.000,00		200.000,00		0		
3	EĞİTİM		5	İLKÖĞRETİM KURUMLARI DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIMI (Ellibaş İ.Ö.O)	Merkez	500.000,00		211.000,00		0		Sözleşmesi imzalanmış olup, 25/01/2013 tarihinde işe başlanılacaktır.
			8					344.000,00		0		
4	EĞİTİM		5	İLKÖĞRETİM KURUMLARI DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIMI (Fatih İ.Ö.O)	Merkez	500.000,00		300.000,00		0		10 adet İÖO. Deprem güçlendirme tahkiki kapsamında yapılmış olup, muayene kabul aşamasındadır.
			8					0,00				
5	EĞİTİM		5	DEPREM GÜÇLENDİRME TAHKİKİ VE PROJE YAPIMI	Merkez	100.000,00		100.000,00		0		10 adet İÖO.' nun ihalesi yapılarak işe başlanılmış olup, muayene kabul aşamasındadır.
			8					30.000,00		0		
6	EĞİTİM		5	ŞEHİT NECDET ORHAN YİBO ONR	Merkez	40.000,00		30.276,50	30.276,50	75	100	Bitti. Ayrıca, fırtına nedeniyle zarar çatı acil onarım ödeneği ile onarıldı.
			8									
7	EĞİTİM		5	KUMLUCA YİBO ONR	Ulus	50.000,00		74.216,04	51.098,59	69	100	Bitti
8	EĞİTİM		5	KOCAREİS İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Merkez	70.000,00		30.000,00	30.000,00	100	100	Bitti
			8					25.000,00	22.612,03	90		
9	EĞİTİM		5	ESEN YURT İ.Ö.O. ÇEVRE DÜZEN.VE ONR	Merkez	40.000,00		30.000,00	30.000,00	100	100	Bitti
			8					4.000,00	2.176,83	54		
10	EĞİTİM		5	İMKB İLKÖĞRETİM OKULU ONR.	Merkez	80.000,00		73.000,00	73.000,00	100	100	Bitti
			8					20.868,20	2.763,29	13		

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİK İ Gerç. %	
11	EĞİTİM		5	HASANKADI İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Merkez	50.000,00		50.000,00	38.016,43	76	100	Bitti
			8					1.548,00		0		
12	EĞİTİM		5	ŞAHİN ŞAHİN İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Merkez	15.000,00						İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı Kararı iptal edildi.
			8			5.000,00						
13	EĞİTİM		5	AKÇALI İ.Ö.O. ÇEVRE DÜZ VE ONR.	Merkez	30.000,00		21.695,55	21.695,55	100	100	Bitti
			8					7.500,00	5.544,79	74		
14	EĞİTİM		5	TERKEHALİLLER İ.Ö.O. ONR	Merkez	20.000,00		10.000,00	3.782,51	38		27.07.2012 tarihinde ihalesi yapılmış, 23.08.2012 tarihinde işe başlanılmış olup, onarım devam etmektedir.
15	EĞİTİM		5	HENDEKYANI İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Merkez	30.000,00		33.577,55	21.015,59	63	100	Bitti
16	EĞİTİM		5	AYDINLAR İ.Ö.O.ÇEVRE DÜZ. VE ONR.	Merkez	40.000,00		30.097,04	30.031,00	100	100	Bitti
			8									
20	EĞİTİM		5	AĞAKÖY İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Ulus	50.000,00		30.000,00	30.000,00	100	100	Bitti
			8					7.000,00	4.678,11	67		
18	EĞİTİM		5	ÖZBAŞI İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Merkez	50.000,00		30.000,00	22.989,57	77	100	Bitti
			8									
19	EĞİTİM		5	YEŞİLKAYA İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Merkez	40.000,00		20.000,00	14.396,00	72	100	Bitti
			8									
20	EĞİTİM		5	ULUS ZAFER İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Ulus	50.000,00		24.869,74	23.570,11	95	100	Bitti
			8					7.000,00	7.000,00	100		

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	SEKTÖR ÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
21	EĞİTİM		5 8	KURUCAŞİLE KARAMAN İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Kurucășile	40.000,00		20.000,00	13.080,28	65	100	Bitti
22	EĞİTİM		5 8	KURUCAŞİLE HİSAR PİRİREİS İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Kurucășile	50.000,00		30.998,75 13.500,00	30.998,75 10.352,96	100 77	100	Bitti
23	EĞİTİM		5 8	AMASRA KALEŞAH İLKö. OKULU ONR	Amasra	70.000,00		20.000,00 54.369,99		0 0		İl Genel Meclisinin 49 sayılı Kararı ile iptal olmuştur.
24	EĞİTİM		5 8	MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Ulus	40.000,00		23.273,99 19.788,00	23.273,99 19.788,00	100 100	100	Bitti
25	EĞİTİM		5	ŞEHİT AHMET TELLİ İLKÖĞRETİM ONR	Amasra	20.000,00		20.000,00	9.676,00	48	100	Bitti
26	EĞİTİM		8	ÇOCUK EĞİTİM PARKI	Merkez	50.000,00		0,00				İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı Kararı ile iptal olmuştur.
27	EĞİTİM		8	İLKÖĞRETİM OKULU SPOR SALONU YAPIMI (AKÇAMESCİT KAPALI SPOR SALONU)	Merkez	1.480.825,00	19.175	1.138.618,00	1.063.711,27	93	100	Bitti
28	EĞİTİM		5 8	ANAOKULU YAPIMI	Merkez	690.000,00		200.000,00 490.000,00		0		İl Genel Meclisinin 02/10/2012 tarih ve 53 sayılı Kararı ile iptal olmuştur.
29	EĞİTİM		8	ŞÜKÜRLER İLKÖĞRETİM OKULU ONR	AMASRA	40.000,00		26.000,00	23.600,00	91	100	Bitti
30	EĞİTİM		8 5	CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU ONR	Merkez	45.000,00		35.000,00	25.349,87	72	100	Bitti

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜ N ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
31	EĞİTİM		5	SÜTLÜCE İLKÖĞRETİM OKULU ONR.	Ulus	20.000,00		20.000,00	10.620,00	53	100	Bitti
32	EĞİTİM		5	GÜRGENPINARI İ.Ö.O. ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Amasra	23.000,00		23.000,00	15.823,80	69	100	Bitti
33	EĞİTİM		5	SARIDERESİ İ.Ö.O. ONARIMI	Kurucaşile	20.000,00		20.000,00		0		İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
34	EĞİTİM		5	EPÇİLER İLKÖĞRETİM OKULU ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Merkez	15.000,00		15.000,00	14.986,00	100	100	Bitti
35	EĞİTİM		5	VALİ TEVFİK BAŞAKAR İ.Ö.O. ÇEVRE DÜZ.ONARIMI	Merkez	30.000,00		30.000,00	29.999,44	100	100	Bitti
36	EĞİTİM		5	MUSTAFA AYDEDE ANAOKULU ÇEVRE DÜZENLEMESİ	Bartın	30.000,00		30.000,00	29.783,20	99	100	Bitti
37	EĞİTİM		5	BİLİM SANAT MERKEZİ BİNASI YAPIMI	Bartın	1.100.000,00		100.000,00	4.225,00	0		Binanın yapılacağı arsanın yola terk yoldan ihdas ve tevhit işlemleri tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.
			8					1.300.000,00				
38	EĞİTİM		8	OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZİ İNŞAATI	Bartın	500.000,00		35.000,00	35.000,00	100	100	Protokol gereğince Temel Su basman seviyesine getirilerek hayırsever vatandaşımıza teslim edildi.
			5					200.000,00	199.112,00	100		
39	EĞİTİM		8	ŞEHİT GÜRDAL ÇAKIR İÖO ONR	Merkez	80.000,00		78.250,00	76.582,37	98	100	Bitti
40	EĞİTİM		8	KURUCAŞİLE İLYASGEÇİDİ İÖO ONR.	Kurucaşile	30.000,00		16.200,00	16.166,00	100	100	Bitti

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜ N ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
41	EĞİTİM		8	ULUS 75.YIL İÖO ONR	Ulus	30.000,00		30.000,00	28.326,17	94	100	Bitti
42	EĞİTİM		8	APDİPAŞA İÖO ONR	Ulus	50.000,00		10.000,00	20.000,00	200	100	Bitti
			5					20.000,00	9.613,99	48		
43	EĞİTİM		5	İSTİKLAL İÖO ONR	Merkez	50.000,00		17.000,00	17.000,00	100	100	Bitti
			8					33.000,00	28.226,34	86	100	
44	EĞİTİM		8	GÖKKUŞAĞI ANAOKULU ONR.	Merkez	23.613,00		23.613,00	23.357,59	99	100	Bitti
45	EĞİTİM		8	BARTIN ÖĞRET.EVİ DEPR.GÜÇLN.VE ONR.	Merkez	63.124,00		388.443,80		0		İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
46	EĞİTİM		8	MİLLİ EĞİTİM LOJ.ONR.	Merkez	41.871,00		41.871,00	41.253,53	99	100	Bitti
47	EĞİTİM		8	ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ DEPREM TAHKİKİ VE ONARIMI	Merkez	80.000,00		80.000,00	18.754,92	23	100	Bitti. Ayrıca, fırtına nedeniyle zarar gören çatı acil onarım ödeneği ile onarıldı.
48	EĞİTİM		8	KÖKSAL TOPTAN LİSESİ DEPREM TAHKİKİ VE ONARIMI	Merkez	26.010,05		26.010,05	7.375,00	28	100	Bitti
49	EĞİTİM		8	BARTIN LİSESİ DEPREM TAHKİKİ VE ONARIMI	Merkez	20.000,00		20.000,00	8.968,00	45	100	Bitti. Ayrıca, fırtına nedeniyle zarar gören çatı acil onarım ödeneği ile onarıldı.
50	EĞİTİM		8	DAVUT FIRINCIOĞLU ANADOLU LİSESİ DEPREM TAHKİKİ VE ONARIMI	Merkez	20.000,00		20.000,00	11.446,00	57	100	Bitti

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜ N ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
51	EĞİTİM		8	Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı	Merkez	150.000,00		150.000,00	6.136,00	4	100	Bitti. Ayrıca, fırtına nedeniyle zarar gören çatı acil onarım ödeneği ile onarıldı.
52	EĞİTİM		8	Cumhuriyet Lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı	Merkez	100.000,00		100.000,00		0	100	Bitti. Ayrıca, fırtına nedeniyle zarar gören çatı acil onarım ödeneği ile onarıldı.
53	EĞİTİM		8	Amasra Lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı	Amasra	26.000,00		26.000,00		0	100	2013 yılında ihalesi yapılacaktır.
54	EĞİTİM		8	Mrk Teknik Lise ve EML Deprem Tahkiki ve Onarımı	Merkez	150.000,00		150.000,00	129.410,86	86	100	Bitti
55	EĞİTİM		8	Ticaret Meslek Lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı	Merkez	50.000,00		50.000,00	45.659,40	91	100	Bitti. Ayrıca, fırtına nedeniyle zarar gören çatı acil onarım ödeneği ile onarıldı.
56	EĞİTİM		8	Kız Meslek Lisesi ve And. KML Deprem Tahkiki ve Onarımı	Merkez	20.380,60		20.380,60	16.765,39	82	100	Bitti
57	EĞİTİM		8	Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı	Merkez	50.000,00		50.000,00	11.505,00	23	100	Bitti
58	EĞİTİM		8	Kızılelma ÇPL Deprem Tahkiki ve Onarımı	Merkez	20.000,00		20.000,00	16.225,00	81	100	Bitti
59	EĞİTİM		8	Hasankadı ÇPL Deprem Tahkiki ve Onarımı	Merkez	20.000,00		20.000,00	8.758,54	44	100	Bitti
60	EĞİTİM		8	A.Otelcilik ve Tur. Mes. Lisesi Deprem Tahkiki ve Onarımı	Amasra	65.000,00		65.000,00	59.000,00	91	100	Bitti

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜ N ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRA M YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
61	EĞİTİM		8	Kurucaşile ÇPL Deprem Tahkiki ve Onarımı	Kurucaşile	50.000,00		50.000,00		0	100	İhalesi yapılmış olup, geçerli teklif çıkmamıştır.
62	EĞİTİM		8	Abdipaşa ÇPL Deprem Tahkiki ve Onarımı	Ulus	40.000,00		40.000,00	28.326,17	71	100	Bitti
63	EĞİTİM		8	Ulus ÇPL Deprem Tahkiki ve Onarımı	Ulus	35.000,00		35.000,00	35.000,00	100	100	Bitti
64	EĞİTİM		8	Merkez Halk Eğitim Mrk. ve ASO Onarımı	Merkez	32.326,00		32.326,00	31.253,98	97		Bitti
65	EĞİTİM		8	Kurucaşile Halk Eğitim Merkezi Onarımı	Kurucaşile	24.402,00		17.636,00	9.145,00	52		Bitti
66	EĞİTİM		8	Umut İlköğretim Okulu Deprem Tahkiki ve Onarımı	Merkez	36.689,38		21.837,38	12.390,00	57	100	Bitti
67	EĞİTİM		8	İmam Hatip Lisesi Ek Bina Proje Yapımı ve Onarımı	Merkez	56.130,22		356.129,22		0		İl Genel Meclisinin 03/10/2012 tarih ve 54 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
68	EĞİTİM		8	Amasra Öğretmenevi Yapımı	Amasra	3.000.000,00		1.400.000,00	21.004,00	2		05/02/2013 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
69	EĞİTİM		8	Apdipaşa Ç.P.L. Spor Salonu Yapımı	Ulus	1.000.000,00		500.000,00				03/01/2013 tarihinde ihalesi yapılarak karar aşamasındadır.
70	EĞİTİM		8	Bedil İÖO Bahçe Duvarı Yapımı	Merkez	245.000,00		150.000,00	6.490,00			Bitti
71	EĞİTİM		5	Yanaz İÖO Yapımı	Merkez	656.000,00		88.200,00	88.200,00	100		İş devam etmektedir.
			8					450.000,00	88.764,47	20		

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜ N ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRA M YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
72	EĞİTİM		8	Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Yapımı	Merkez	50.000,00						İl Genel Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 51 sayılı kararı ile iptal edilerek proje değişikliği yapılmıştır.
73	EĞİTİM		8	Kaleşah Temel Eğitim Okulu Yapımı	Amasra							İl Genel Meclisinin 49 sayılı kararı ile programa alınarak proje ihalesi hazırlıklarına başlanıldı.
74	EĞİTİM		8	Merkez Anaokulu Yapımı	Merkez							İl Genel Meclisinin 28/12/2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
75	EĞİTİM		8	Vilayet Hizmet Birliği Ağdacı İÖO Yapımı	Merkez	50.000,00						25/01/2013 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
76	EĞİTİM		8	Kemal Sabriye Ocakçı İÖO Çatı Onarımı	Merkez	15.050,00		15.000,00	15.000,00	100		İl Genel Meclisinin 07/12/2012 tarih ve 73 sayılı kararı ile yatırım programına alınmıştır. Fırtına nedeniyle zarar göre çatı acil onarım ödeneği ile onarıldı.
77	EĞİTİM		8	Mustafa Kemal Ortaokulu Çatı Onarımı	Merkez	22.737,54		22.738,00	22.738,00	100		İl Genel Meclisinin 07/12/2012 tarih ve 73 sayılı kararı ile yatırım programına alınmıştır. Fırtına nedeniyle zarar gören çatı acil onarım ödeneği ile onarıldı.
78	EĞİTİM		8	Bilim Sanat Merkezi Çatı Onarımı	Merkez	37.230,00		37.230,29	37.230,29	100		İl Genel Meclisinin 07/12/2012 tarih ve 73 sayılı kararı ile yatırım programına alınmıştır. Fırtına nedeniyle zarar gören çatı acil onarım ödeneği ile onarıldı.
79	EĞİTİM		8	İmam Hatip Lisesi Yemekhane + Ortaokulu Proje Yapımı	Merkez	356.129,22		356.129,22				25/01/2013 tarihinde ihalesi yapılacaktır.


2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	SEKTÖRÜ N ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	SPOR		8	Bartın Sentetik Çim Yüzeyli Işıklandırma Yapımı	Merkez	200.000		100.000				İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
2	SPOR		8	Spor Tesisi Bakım ve Onarımı Yapmak	İl Geneli	75.000		75.000				İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
3	SPOR		8	Gençlik Merkezi Binası Yapımı	Merkez	75.000		75.000				İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
4	SPOR		5	Kumluca Spor Sahası	Ulus	100.000		25.000				İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
			8	Sentetik Çimlendirme				75.000				
5	SPOR		8	Zafer Köyü Futbol sahası Çimlendirilmesi	Ulus	40.000		40.000				İl Genel Meclisinin 28/12/2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
6	SPOR		5	Gürgenpınarı Köyü Futbol sahası Çimlendirilmesi	Merkez	40.000		40.000				İl Genel Meclisinin 28/12/2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
7	SPOR		5	Serdarı Köyü Futbol sahası Çimlendirilmesi	Merkez	40.000		40.000				İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
8	SPOR		8	Amasra Futbol Sahası Çimlendirmesi	Amasra	100.000		100.000				İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
9	SPOR		5	Kurucaşile Futbol Sahası Işıklandırılması	Kurucaşile	37.500		37.500	37.000	100	100	Bitti
10	SPOR		8	Kurucaşile Futbol Sahası Çimlendirmesi	Kurucaşile	200.000		200.000				İl Genel Meclisinin 28/12/2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
11	SPOR		5	Spor Tesisi Kompleksi	İl Geneli	52.000		2.000				İl Genel Meclisinin 06/12/2012 tarih ve 71 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
			8	Fizibilitesi				50.000				

2012 YILI FAALİYET RAPORU

SIRA NO	SEKTÖR ÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARC.	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	ÇEVRE ORMAN		8	Orman ve Su İşleri Hizmet Binası Onarımı	Merkez	91.740,00		91.700,00				İl Genel Meclisinin 28/12/2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
2	EMNİYET		5	Jandarma Kamera Güvenlik Sistemi Yapımı	Merkez	375.000,00		123.846,00				21/12/2012 tarihinde ihalesi yapılmış olup, geçerli teklif çıkması nedeniyle iptal olmuştur.
			8					152.323,00				
3	KÜLTÜR		5	İlimizde Tanıtıcı Etkinlikler Yapmak	Merkez	30.000,00		30.000,00	21.107,00	70		Bitti
4	KÜLTÜR		5	Turizm alanında olmayan turistik yerlerin kültür ve turizme kazandırılması için etüd proje ve fizibilite yapılması işi	Merkez	10.000,00		10.000,00		0		Bitti
5	KÜLTÜR		5	Arkeolojik Kazı Çalışmaları	Amasra	130.000,00		80.000,00	40.710,00	0		Ot temizleme, çevre tel örgü yapımı işi tamamlanmış, kök kurutma işi devam ediyor.
			8					48.772,09		83		
6	KÜLTÜR		8	Kozcağız Belediyesi Meydanı Çevre Düzenleme işi	Kozcağız	30.000,00		30.000,00	26.243,20	87		Bitti
7	KÜLTÜR		8	Amasra Belediyesi Atatürk Meydanı Düzenleme işi	Amasra	40.000,00		40.000,00	30.208,00	76		Bitti
8	KÜLTÜR		8	Kumluca Belediyesi Kilit Parke Alımı İşİ	Kumluca	30.000,00		30.000,00	29.996,78	100		Bitti
9	ÇEVRE ORMAN		8	Orman ve Su İşleri Hizmet Binası Onarımı	Merkez	91.740,00		91.700,00				İl Genel Meclisinin 28/12/2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
10	EMNİYET		5	Jandarma Kamera Güvenlik Sistemi Yapımı	Merkez	375.000,00		123.846,00				21/12/2012 tarihinde ihalesi yapılmış olup, geçerli teklif çıkması nedeniyle iptal olmuştur.

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ FAALİYETLERİ

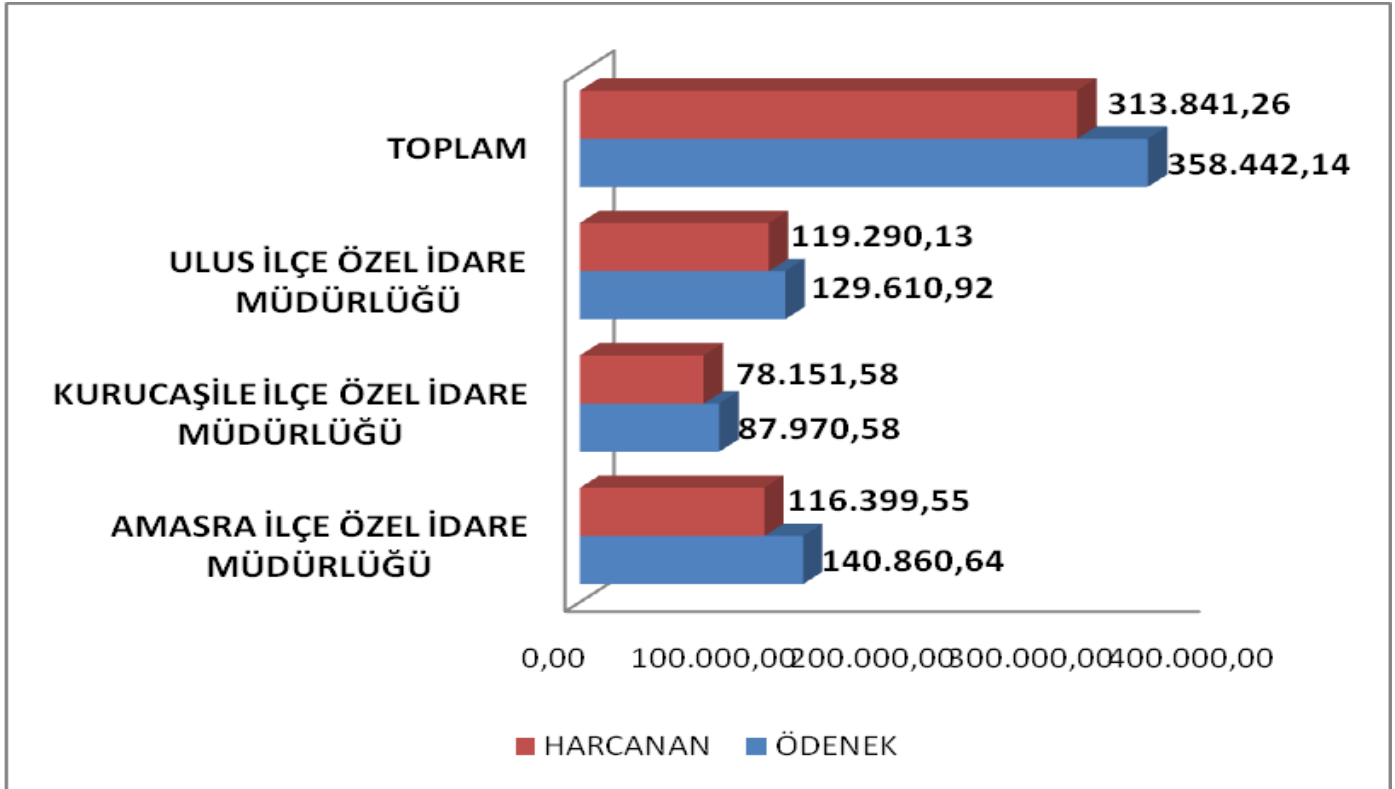

A) AMASRA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ:

2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 9 adet doğrudan temin,
21/f maddesine göre 2 adet ihale yapılmıştır.

B) KURUCAŞİLE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ:

2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 15 adet doğrudan temin,
21/f maddesine göre 2 adet,
21/b maddesine göre 2 adet ihale yapılmıştır.

C) ULUS İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ:

2012 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

22/d maddesine göre 20 adet doğrudan temin,
21/f maddesine göre 1 adet,
21/b maddesine göre 2 adet ve
19. maddesine göre 1 adet İhale yapılmıştır.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

- İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ:

1- 99/13681 Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik ve 25208 sayılı Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin uygulanacağı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005/9 sayılı Genelgesi ve 27.12.2004 tarih ve 82169 sayılı yazılarıyla bildirilen Belediye sınırları dışında kalan ve ruhsat almak isteyen ilgili işyerlerinin ruhsatlandırılmasında, yangın lara karşı alınması gereken önlemlerin kontrolü Müdürlüğümüzce yapılmakta, işyeri açmak isteyen vatandaşlarımıza ruhsat aşamasında Yangın Güvenlik Raporu Müdürlüğümüzce verilmektedir.

2012 Yılında 130 Adet “Yangın Güvenlik” Raporu verilmiştir.

2- İlimiz hassas bölgesi içinde olup yıllık personel ortalaması 100 veya daha fazla olan ve bunların dışında kalıpta Valilik Makamınca planlama kapsamına alınması uygun görülen birimler tespit edilmiş, tespiti yapılan toplam **36 birimin Sivil Savunma Planlarını hazırlamaları sağlanmıştır.**

3- Müdürlüğümüz envanterinde bulunan Arama ve Kurtarma aracımız ve 8 Arama Kurtarma Teknisyenimiz ile sıkışmalı trafik kazalarına müdahale edilmektedir.

Arama Kurtarma Aracımız ve Personellerimiz ile 2012 yılında toplam 35 olaya müdahale edilmiştir.

4- Çeşitli kurumlarca hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının inceleme ve onay aşamasında Müdürlüğümüz personelleri görev yapmaktadır.

2012 yılında toplam 11 adet Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının inceleme ve onayı tamamlanmıştır.

5- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2012 Mali Yılı Yatırım Programında bulunması nedeniyle, Evini Yapana Yardım Projesi (EYY) kapsamında ilimize gönderilen ödenekten 3 adet hak sahibi vatandaşımıza ödeme yapılmıştır.

Ödeme Tutarı 76.000,00 TL dir.

6- Van ili ve ilçelerinde meydana gelen depremde dolayı söz konusu bölgeye Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından İlimizdeki Çelikerler Çelik Konstrüksiyon İnş. San. Tic.Ltd. Şti. den yapılan taşımalık alımı sonucu ilgili Şirketin yapımını 30.12.2011 tamamlamış olduğu 250 adet konteynır sevkiyatına ilave olarak verilen 300 adet konteynır siparişinin Müdürlüğümüzce **Muayene ve Kabulleri yapılmıştır.**

7- Van ili ve ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası bölgede yürütülen Hasar Tespit-Kesin Hasar Tespit-Hak sahipliği ve Yer seçimi çalışmalarında görev almak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Olurları ile Van İline çeşitli zamanlarda 7 personelimiz görevlendirilmiştir.

8- Van ili ve ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası bölgede kurulan konteynır kentlerin düzenini sağlamak için yürütülecek çalışmalarda görev almak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Olurları ile Van İlinde 5 personel görevlendirilmesi yapılmıştır.

9- İlimizde 12.08.2012 tarihinde meydana gelen fırtına afeti nedeniyle zarara uğrayan konutlar için yapılan hasar tespitleri sonucu Bartın Merkez ve Merkez köylerde tespit edilen **162** afetzede için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Müdürlüğümüzce 400.000,00 TL ödenek talep edilmiş, İlimize gönderilen **100.000,00 TL** acil yardım ödeneğinden son harcama süresi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 18.10.2012 tarih ve 06771 sayılı yazıları ile bildirdiği 30.11.2012 son ödeme tarihine kadar başvuru yapan **160** afetzedeye toplam **94.600,00 TL** ödeme yapılmıştır.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

10- 2009/27344 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131. maddesi (a) fıkrasında "Özel yapı, bina tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından" (b) fıkrasında "Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyetlerce denetlenir." hükmü mevcuttur. Bu hüküm gereğince İlimizde Yönetmelik esaslarına göre sondajlama usulü ile resmi kurumların yanı sıra öncelikle kalabalık insan yükünün bulunduğu hayati önemi haiz olan hastane, yurt, pansiyon ve anaokullarında **(Toplam 24 Birimde)** yangın denetimleri yapılmış, denetime ilişkin raporlar ilgili birimlere gönderilmiştir.

11- 6/624 Karar Sayılı Tüzüğün 28/c maddesi ve 91/1434 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifinin 11/d maddesi doğrultusunda İlimizde Kamu Hizmeti yürüten Kurum ve Kuruluşların Seferberlik ve Savaş Haline yönelik çalışmalarını yerinde görmek, varsa eksik ve aksaklıkların giderilmesi için planlama kapsamına alınan kamu-özel kurum ve kuruluşlarda denetim yapılmış, **(Toplam 27 Birimde)** denetime ilişkin raporlar ilgili birimlere gönderilmiştir.

12- 88/13543 Sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) fıkrası gereğince; İlimiz Merkez ve bağlı İlçelerinde faaliyet gösteren hayati öneme haiz, kısmen veya tamamen kapanmaları ve yıkılmaları halinde hayatı olumsuz yönde etkileyecek Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarından "SABOTAJLARA KARŞI KORUMA VE ÖNLEME" planını yapması gerekenleri tespit etmek ve planı hazırlayan Kurum ve Kuruluşların planlarını tetkik etmek amacı ile İl Sabotaj Komisyonu teşkil edilmiş, teşkil edilen bu komisyonca sondajlama usulüne göre sabotaj Planlamasına tabi birimlerin **(Toplam 47 Birimin)** denetimleri yapılmıştır.

13- İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğin 26/b maddesinde; Belediye İtfaiye Teşkillerinin gereği gibi işleyip işlemediği ve personelin çalışmaları Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve Valilerin görevlendireceği Vali Yardımcıları veya Sivil Savunma Müdürleri (İl Afet ve Acil Durum Müdürleri) tarafından denetlenir hükmü mevcuttur.

Bu hüküm gereğince; İlimiz Merkezi ve Merkeze bağlı Belde Belediye Başkanlıkları İtfaiye Teşkilatları ile Amasra, Ulus, Kurucaşile Belediye Başkanlıkları İtfaiye Teşkilleri denetiminin Müdürlüğümüzce yapılmış, raporlar Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmiştir.**(Toplam 9 Belediye Başkanlığının denetimi yapılmıştır.)**

14- MY 5-3 Savaş Hasar Onarım Planları Hazırlanma Yönergesi gereğince, günümüz savaşlarında geri bölgedeki hayati öneme haiz tesis ve yapılarda meydana gelebilecek muhtemel hasarın giderilmesine esas olarak hazırlanması gerekli olan **B Grubu Savaş Hasar Onarım Planlarını** hazırlama sorumluluğu bulunan il birimlerine planlarının gözden geçirilmesini, gerekli güncellenmenin yapılmasını, (mali portreler de hem TL, hem de Euro bazında tespit yapılması) planlarda değişiklik olup olmadığı konusunda Müdürlüğümüze bilgi verilmesi amacı ile yazı yazılmış, planlarında değişiklik bulunan **Toplam 29 Birimin birimlerin planlarını güncellemeleri sağlanmıştır.**

15- Müdürlüğümüze çeşitli sebeplerle (heyelan, evlerinde çatlak vs.) dilekçeli müracaat eden 75 vatandaşımızın dilekçelerine istinaden Teknik Personellerimizce yerinde tespit yapılmış, **tespit raporları ilgili birimlere gönderilmiştir.**

16- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 20.04.2011 tarih ve 2512 sayılı yazısı ile olası afetlerde ülke çapında Hasar Tespit Çalışmalarına katılacak Teknik Personellerin tespiti ile her yıl bu tespitlerin güncelliğinin takibi ve ilgili listelerin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilmesi istenilmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Bu amaçla, Kurumlara ve Belediye Başkanlıklarına yazı yazılmış, İlimiz ve İlçelerimiz birimlerinde görev yapan **Toplam 42 Adet Mimar, İnşaat Mühendisi ve İnşaat Teknikerlerine** ait bilgiler Başkanlığımıza bildirilmiştir.

17- 2011 yılı KPSS Sonuçlarına göre İl Afet ve Acil Durum Yerleştirme Sonuç Belgelerine göre atamaları yapılarak göreve başlamış olan 6 aday personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 55. Maddesi ve İçişleri Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Müdürlüğümüzce hazırlanan Eğitim Programı doğrultusunda Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitimleri verilmiş, Stajları tamamlanmış, asaletleri tasdik edilmiştir.

18- İlimizde Kamu hizmeti yürüten Kurum ve Kuruluşların Seferberlik ve Savaş Haline yönelik çalışmalarını herhangi bir aksaklığa mahal vermeden daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi açısından Kurum ve Kuruluş planlamalarından sorumlu Sivil Savunma Amirlerinin Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarına ilişkin eğitimleri **15-16 Kasım 2012** günü **10.00 – 12.00** saatleri arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yapılması planlanmış ve **35 birim personeline eğitim verilmiştir.**

19- 2012 yılı içerisinde İlimiz Merkezinde bulunan toplam 24 adet İlköğretim, Lise ve dengi okullarda öğrencilerimizin Sivil Savunma ve Afetler konusunda bilinçlendirilmesi, alınacak koruyucu, kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerin öğretilmesi amacı ile eğitim verilmesi planlanmış, **bu okullarımızda yaklaşık 1850 öğrenciye eğitim verilmiştir.**

20- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanununun 11 ve Ek-8 inci maddeleri ile 6/3150 Karar Sayılı "Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü"nün 3 ve 25 inci maddeleri uyarınca hazırlanan ve amacı Sivil toplum örgütleri, özel ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin, sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi için devletin resmi güçleri yanında bu hizmetlere, gönüllü olarak katılımlarının sağlanması, gerekli organizasyonların yapılması ve eğitilmelerini sağlamak olan **Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi'** çerçevesinde Müdürlüğümüzde gönüllü olarak kayıtlı bulunan;

Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Merkez Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünde bulunan Toplam 13 gönüllü öğretmene Merkez Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü Toplantı Salonunda **20.12.2012** günü **16.30-18.30** saatleri arasında eğitim verilmiştir.

21- İlimiz Merkez İlçesine bağlı Özbaşı Köyü Hepler Mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle hak sahibi kabul edilen 19 afetzede ile Aşağıdere Köyü Yağbaltı Köyünde Meydana gelen heyelan nedeniyle hak sahibi kabul edilen 7 afetzede için Merkez İlçeye bağlı Kozcağz Beldesinde yeni yerleşim yeri olarak seçilen tapuda Kozcağz Köyü, Evaltı Mevkii, 488 no'lu parselde kayıtlı 11.580,00 m2 yüzölçümü mülkiyet şahıslara ait taşınmazın **Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.**

22- İl Özel İdaresi gider bütçesi ile birimimize **2012 yılında 190.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu ödenek ile giderlerimiz karşılanmıştır.

23- Valilik Makamının 28.04.2010 gün ve 478 Sayılı Olurları ile bir Olağan Üstü Hal ve afet durumlarında İl sınırları dahilinde ve gerekirse komşu İl Valilerinin yardım çağrısı üzerine en seri biçimde olay mahalline intikal ederek can ve mal kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetleri ile bozulan alt yapıyı (elektrik, telefon, su ve kanalizasyon) onarmak ve afet halini alarak yangınları söndürmek amacı ile Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Karayolları 156. şube Şefliği, DSİ, 233. Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Telekom İl Müdürlüğü, BEDAŞ İşletme Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğünün görevlendirdiği personellerden oluşturulan ilimiz Afetler Acil Yardım Ekibi Eğitimi

2012 YILI FAALİYET RAPORU

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binasında **19-20-21 ARALIK 2012** tarihlerinde **10.00-12.00** saatleri arasında yapılmış, **toplam 55 kişiye eğitim verilmiştir.**

24- a) Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi.

b) Başbakanlık Alarm Kod Kelimeleri Anlamları Yönergesi

İlgi (a) Genelge ve İlgi (b) Yönerge gereğince; İlimiz Alarm Kod İşlem Görevlilerine her yıl bir plan dahilinde eğitim yaptırılması gerektiğinden eğitim 22-23 Kasım 2012 tarihlerinde 10.00-12.00 saatleri arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılmış, **Toplam 39 Kurum personelinin eğitimi gerçekleştirilmiştir.**

25- 2010 yılı Mart ayı içerisinde Çubukbeli Köyü Aşağı Mahallesinde meydana gelen heyelan olayı, teknik elemanlarca çoğu kez incelenmiş ve genel hayata etkili olmadığı kanaatine varılmış, son olarak 14.01.2011 tarihinde etüt edilmiş ve 03.03.2011 tarihinde de jeolojik etüt raporu düzenlenmiştir. Raporda Çubukbeli Köyü, Aşağı Mahallesi'nde meydana gelen heyelanın genel hayata etkili nitelikte olduğu ve heyelandan 4 konutun etkilendiği, 9 konutun etkilenme ihtimali olduğu ve toplamda 13 konutun nakli gerektiği belirtilmiştir.

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 01.08.2011 tarih ve 5315 sayılı yazısı ile “7269 sayılı Kanuna 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 29. Maddesi ve Afet Sebebiyle Haksahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre” afetzedelerin Hak sahipliği çalışmalarına başlanması gerektiği ifade edilmiştir.

Müdürlüğümüz incelemesinde Jeolojik Etüt Raporunda Belirtilen alan alan, 7269-1051 Sayılı Yasanın 2’nci maddesi gereğince 22.08.2011 gün ve 2011/2175 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge ilan edilmiştir.

Hak sahipliği inceleme komisyonu tarafından hak sahibi olan afetzedeler 03.07.2012 tarihinde belirlenmiş listeler Başbakanlığa onaya **gönderilmiştir.**

Süreç halen devam etmekte olup Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın gönderecek olduğu onaylı hak sahibi isim listesinin ardından vatandaşların açık borçlandırma işlemleri yapılacak ve sonrasında yeni yerleşim yeri seçimi çalışmalarına başlanacaktır.

26- 2012 yılı mart ayı içerisinde Hasankadı Beldesi, Şabankadı, Merkez ve Gerişli Mahallelerinde meydana gelen heyelan olayı, teknik elemanlarca 22.03.2012 tarihinde etüt edilmiş ve 15.06.2012 tarihinde de jeolojik etüt raporu düzenlenmiştir. Raporda Şabankadı Mahallesi'nde 2 konutun heyelandan etkilendiği ve 3 konutun etkilenme ihtimali olduğu ve nakli gerektiği, Merkez mahallesi'nde 4 konutun etkilendiği ve nakli gerektiği, Gerişli mahallesi'nde 3 konutun etkilendiği ve nakli gerektiği belirtilmiştir.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 26.07.2012 tarih ve 5266 sayılı yazısı ile “7269 sayılı Kanuna 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 29. Maddesi ve Afet Sebebiyle Hak sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre” **afetzedelerin hak sahipliği çalışmalarına başlanması gerektiği ifade edilmiştir.**

13.09.2012 tarih ve 988 sayılı Hasankadı Belediyesi’ne gönderilen yazımız ile 22.05.2007 gün ve 8732 sayılı genelge esasları çerçevesinde 15.06.2012 tarihli **jeolojik etüt raporuna itiraz hakkı bulunan ve afetzede isim listesinde adı bulunmayan vatandaşların 1 ay içerisinde dilekçeyle başvurularının alınması gerektiği ifade edilmiştir.**

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 15.10.2012 tarih ve 6666 sayılı yazısı ile 15.06.2012 tarihli jeolojik etüt raporu eki krokilerde belirtilen alan, 7269-1051 Sayılı Yasanın 2'nci maddesi gereğince 24.09.2012 gün ve 2012/3742 Sayılı **Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge ilan edilmiştir.**

23.10.2012 tarih ve 1152 sayılı Bartın Tapu Müdürlüğüne gönderilen yazımız ile 24.09.2012 gün ve 2012/3742 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile **Afete Maruz Bölge ilan edilen alanlara Tapu Müdürlüğünce Şerh konulması gerektiği ifade edildi.**

23.10.2012 tarih ve 6663 sayılı Bartın Tapu Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile Afete maruz bölge kararı alınan alanlara şerh konulduğu belirtildi.


Süreç halen devam etmekte olup jeolojik etüt raporuna yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra hak sahipliği çalışmalarına başlanacaktır.

27- İlimiz merkezi ilçe, belde ve köylerinde muhtelif zamanlarda gerçekleşmiş bulunan afetler dolayısıyla yapılan tespitlerde Kontrol Etütleri Programına alınarak zaman zaman kontrol edilmesinin uygun görüldüğü 70 yer kontrol etütleri programı doğrultusunda yeniden ele alınarak tespitleri yapılmış, hazırlanan jeolojik etüt raporları Başbakanlığa gönderilmiştir.

2012 YILI İÇİNDE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN;

22/d maddesine göre 49 adet doğrudan temin yapmıştır.

AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KESİN HESABI

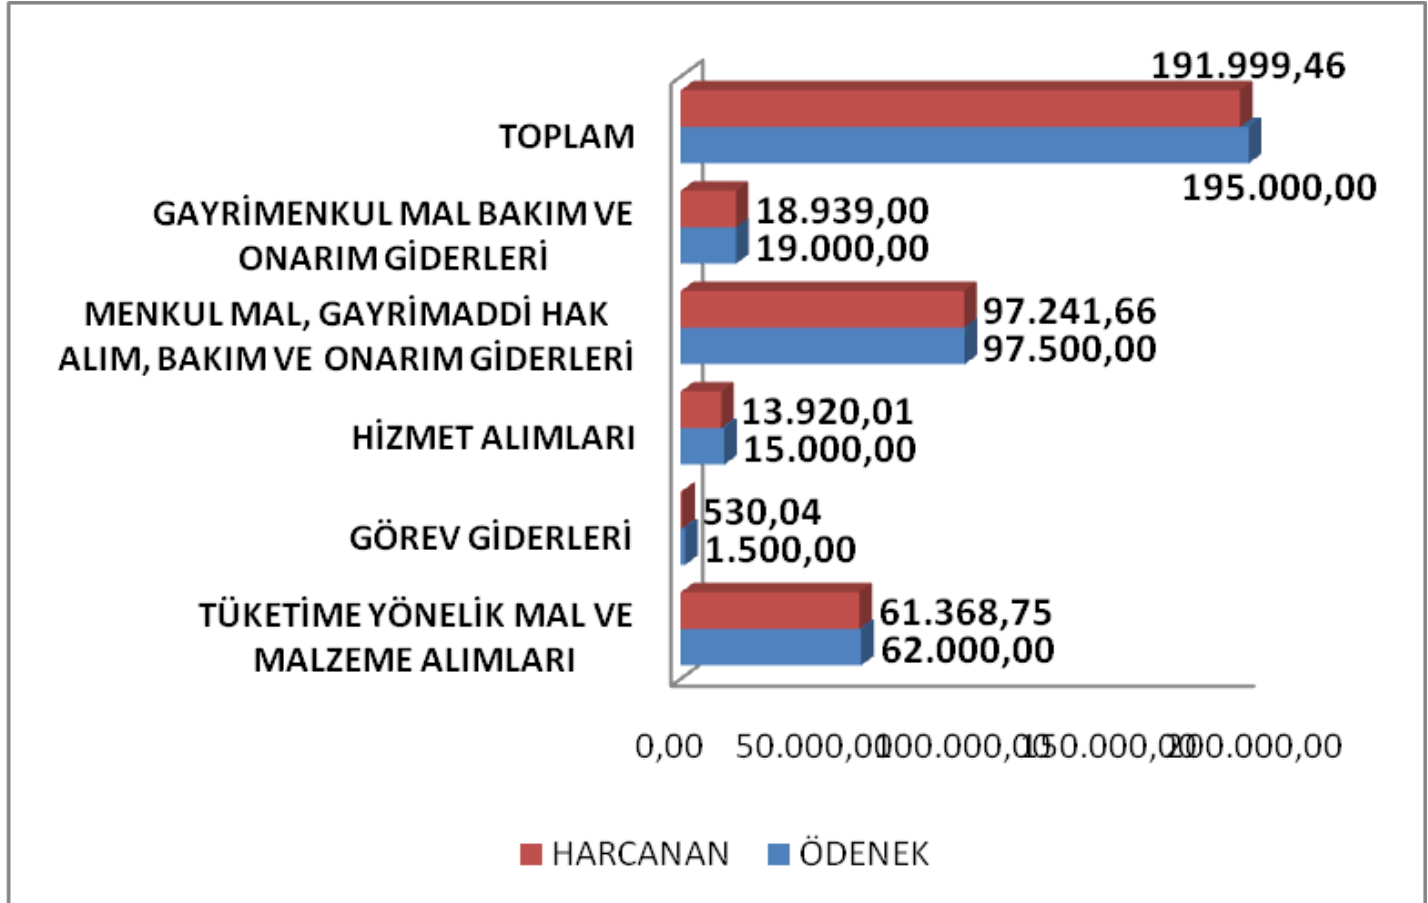

2012 YILI FAALİYET RAPORU

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME CETVELİ

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	FİNANS TİPİ	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR			UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
									NAKDİ HARC. (TL)	NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ		5	EYY Konutları Arıt-Şahin-Yeniköy	Merkez	178.000,00	56.600,00	84.000,00	76.000,00	90	90	5 Konuttan 3 tanesi tamamlanmış olup, 2 tane konut %90 seviyesinde inşaatları tamamlanmıştır

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme (%)	Hedeften Sapma (%)
HARCAMA BİRİMİ :	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	İnsan sağlığını ön planda tutan, çevre ile uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Stratejik plan döneminde tüm köy yollarını, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ulaştırma (1.Kat Asfalt Yapımı (44 km.)) Ulaştırma (Tabii Malzemeli Bakım (10 km.)) Ulaştırma (Stabilize Yapımı (45 km.)) Ulaştırma (Stabilize Greyderli Reglaj Yapımı (3 km.)) Ulaştırma (Kar Mücadelesi (372 km.)) Ulaştırma (Büz Sanat Yapıları) Ulaştırma (Münferit İşler) Ulaştırma (Organize Sanayi Bölgesi Köprüsü geçici) Ulaştırma (Köprü ve Tünel Etüt ve Proje Giderleri)-2013				100 100 90,8 100 100 100 100 100	9,2 100
Göstergenin Kaynağı	İl Özel İdaresi 2012 yılı stratejik plan ve çalışma programı					
Performans Sonuçlarının Analizi	2012 yılı çalışma programında bulunan 9 adet projenin; 9 adedinde istenilen hedeflere ulaşılmıştır. 1 Adet projede % 9,2 oranında sapma olmuş, 1 adet projeye hiç başlanılamamıştır.					
Sapmanın Nedeni	Olumsuz hava şartları nedeniyle hedefte % 9,2 oranında sapma meydana gelmiştir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem						

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU								
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR						
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleştirme	Hedeften Sapma %	
HARCAMA BİRİMİ :	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ							
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirmek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmek							
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Bartın'da yem bitkileri üretiminin artırılması, Yem bitkilerini geliştirme projesi kapsamında elde edilen ot veriminin miktarının artırılması			0%	%100	%100		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satın alınan Tohum Miktarı	6.500 kg	10.475 kg.	10.000				
	A- Yonca							
	B-Mısır Tohum	23.500 kg	15.575 kg	14.100	24.000	24.000		
	Dağıtılan Kişi Sayısı							
	A-Yonca	151	274	246				
	B-Mısır	337	241	236		503		
	2008 yılında sahipli hayvanların kontrol altına alınması için tasma yaptırılması	-	-	-	-	-		
	Gerçekleşen proje sayısı	1	-	-	-	-		
Göstergenin Kaynağı	Yıllık çalışma programında yer alan verilerin toplanması sonucu elde edilmiştir.							
Performans Sonuçlarının Analizi	Stratejik Plan ve Çalışma Programında Her yıl için %2-%5 artış uygulanması hedeflenmiş ve bu hedefe ulaşılmıştır.							
Sapmanın Nedeni								
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem								

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU							
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR					
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009	2010	2011	2012	2012	Hedeften
HARCAMA BİRİMİ :	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Gerçekleştirme	Sapma %
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artısını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.						
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Bartın'da İhracata uygun Pazar değeri olan ürünlere önem verilecektir.		100%	100%	100%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satın Alınan Çilek Fidesi ve Meyve Fidanı Miktarı	1.760	-	-	-	-	
	A- Kiraz Fidanı	78.000	78000	-		-	
	B- Çilek Fidesi	22	-	-		-	
	Kurulan Bahçe Sayısı (Dekar)					-	
	A- Kiraz	13	13	-		-	
	B- Çilek	2	1	-		-	
Göstergenin Kaynağı	Yıllık çalışma programında yer alan verilerin toplanması sonucu elde edilmiştir.						
Performans Sonuçlarının Analizi	2012 yılında talep olmamıştır.						
Sapmanın Nedeni							
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem							

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU							
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR					
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009	2010	2011	2012	2012	Hedeften
HARCAMA BİRİMİ :	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleştirme	Hedef	Gerçekleştirme	Sapma %
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.						
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Merkez ve ilçe köylerde çağdaş yaşama alanları Çocuk oyun alanları ve Pazar yerleri çalışmaları yapılacaktır.				%100	%117,6	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satın Alınan Çocuk Parkı Miktarı						
	A- Oyun Grubu						
	Kurulan Park Sayısı	10	35	28	17	20	%17,6
	A-Oyun Grubu						
	Gerçekleşen proje sayısı						
	Kurulan Pazaryeri Sayısı						
	Gerçekleşen proje sayısı	4	-	-		-	
	Satın Alınan Otobüs Durağı Miktarı	-	-	-	18	18	
	Kurulan Park Sayısı						
Göstergenin Kaynağı	Yıllık çalışma programında yer alan verilerin toplanması sonucu elde edilmiştir.						
Performans Sonuçlarının Analizi	Stratejik Plan ve Çalışma Programında Her yıl için 10 adet park kurulması hedeflenmiş ve bu hedefe ulaşılmıştır. 2012 yılı çalışma programında 18 adet otobüs durağı kurulması planlanmış ve bu hedefe ulaşılmıştır.						
Sapmanın Nedeni	Talebe istinaden yeni ilave alım yapıldığından hedefte artı yönlü sapma olmuştur.						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem							

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU							
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR					
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009	2010	2011	2012	2012	Hedeften
HARCAMA BİRİMİ :	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleştirme	Hedef	Gerçekleştirme	Sapma %
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Merkez ve ilçe köylerde içme suyu kanalizasyon tesis yapım bakım ve onarımları tesis geliştirme çalışmaları yapılacaktır.						
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacaktır			100%	100%	119,7%	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Satın Alınan Boru Miktarı	75.515	72.190	45.069	20.000	23.958	%19,7
	A- İçme suyu Borusu						
	Boru Dağıtılan Köy Sayısı	62	72	60		34	
	A- İçme suyu Borusu						
	Devlet-Vatandaş İşbirliği ile yapılan Tesis sayısı						
	A- İçme suyu	-	4	1			
	İhale ile yapılan Tesis sayısı						
	A-İçme suyu	-	12	2			
Göstergenin Kaynağı	Yıllık çalışma programında yer alan verilerin toplanması sonucu elde edilmiştir.						
Performans Sonuçlarının Analizi	Stratejik Plan ve Çalışma Programındaki Her yıl uygulanacak hedeflere ulaşılmıştır.						
Sapmanın Nedeni	Talebe istinaden yeni ilave alım yapıldığından hedefte artı yönlü sapma olmuştur.						
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem							

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2010	2011	2012	2012	Hedeften
HARCAMA BİRİMİ :	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(Sağlık Hizm.)	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Gerçekleşme	Sapma
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kırsal- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Sağlık Merkezi Binası yapımı ve mevcut binaların bakım ve onarımlarının yapılması, mal, malzeme v.b. ihtiyaçların karşılanması ve dolayısıyla da sağlık hizmetlerinde etkinliğin artırılması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Yılı içinde yapılan Toplum ve Aile sağlığı merkezi sayısı 2- Yılı içinde onarım yapılan sağlık merkezi sayısı 3- Acil sağlık malzeme alımı		1 4	1 2 1	1	100% 100% 100 %
Göstergenin Kaynağı	Stratejik plan ve çalışma programı					
Performans Sonuçlarının Analizi	2012 yılı çalışma ve performans programında bulunan işler % 33,3 oranında tamamlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni	1- Acil Sağlık Hizmetleri için Mal ve Malzeme alımı:Sağlık Bakanlığında Ödenek gelmediğinden ,İl Genel Meclisinin 28.12.2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile proje iptaline karar verilmiştir. 2- Köy Sağlık Evlerinin Onarımı :Sağlık Bakanlığında Ödenek gelmediğinden ,İl Genel Meclisinin 28.12.2012 tarih ve 74 sayılı kararı ile proje iptaline karar verilmiştir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem						

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2010	2011	2012	2012	Hedeften
HARCAMA BİRİMİ :	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Çevre Hizm.)	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Gerçekleşme	Sapma %
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Çevrenin Korunması, temizliğini ve iyileşmesini sağlayarak, halkımıza daha iyi ve temiz yaşanabilir bir çevre sunmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	1- Çevrenin korunması ve iyileştirmesi için ortam kirlenmesinin önlenmesi ve atık yönetimi çalışmalarının etkinleştirilmesi. 2- Çevreye duyarlı kamuoyu bilincinin oluşturulması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Köylerimizdeki çöplerin düzenli olarak toplanması ve çöp toplama alanına dökülmesi sağlamak. 2- Çöp aracı kiralanması ve çöp poşeti temin edilmesini sağlamak. 3- Plajların ilaçlanması sağlamak 4- Çöp bidonu ve konteynır almak		1	1	1	100%
Göstergenin Kaynağı	Stratejik plan ve çalışma programı		1	1	1	100%
Performans Sonuçlarının Analizi	Belirtilen hedefler % 100 gerçekleştirilmiştir.			8	8	100 %
Sapmanın Nedeni				68	68	100%
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem						

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU							
BÜTÇE YILI	:	2012	YILLAR				
DAİRESİ	:	İL ÖZEL İDARESİ	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma %
HARCAMA BİRİMİ	:	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Sosyal Hizmet)					
STRATEJİK AMAÇ 1	:	Korunmaya,bakıma veya yardıma muhtaç aile çocuk sakat,yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine süratli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:		Sosyal hizmetlerin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi sağlanarak, kişilerin sosyal hizmete gönüllü katılımları sağlanacaktır. 2-Yaşlıların sosyal yaşama uyumunu artırmaları ve günlük gereksinimlerini karşılamalarının sağlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		1- Sosyal Hizmet Gönüllülüğü sistemi			100%	100%	
		2- Sosyal Hizmet Gönüllülüğünü tanıtıcı program, reklâm, röportaj ve söyleşiler yayınlanacaktır.			100%	100%	
		3- Huzurevi binası onarımı			100%	100%	
Göstergenin Kaynağı		Stratejik plan ve çalışma programı					
Performans Sonuçlarının Analizi		2012 yılı çalışma ve performans programında bulunan işler % 100 oranında tamamlanmıştır.					
Sapmanın Nedeni							
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem							

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2012	YILLAR				
DAİRESİ:	İL ÖZEL İDARESİ	2010 Gerçek.	2011 Gerçek.	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedekten sapma %
HARCAMA BİRİMİ:	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ 1:	Kent ve çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması, kaçak yapılaşmanın önüne geçerek, mimari özelliklere bağlı estetik kaygı gözeterek yapılaşmanın aynı düzeyde sağlanması, İl Genelinde üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulamasının sağlanması.				-1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın Fiziki Gerçekleştirilmesi tamamlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda onay aşamasındadır.	
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	İl Merkezini de içine alan 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın tamamlanması. Köy yerleşimlerinin düzenli olması için yapılan köy yerleşik alan tespit çalışmalarının tamamlanması. Kırsal yerleşimlerde İmar Planları hazırlanarak yapılaşmanın planlı olması konusunda çalışmalar sürmekte, çarpık yapılaşma ve kaçak yapılaşmanın engellenmesi büyük ölçüde sağlanmış ve mimari estetiğe ve yerel mimariye özen gösterilmesi hedefinin devamlılığı sağlanacaktır.				-Yöresel Mimariye uygun proje hazırlanması projesi tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. -İmar Planı için gerekli olan halihazır harita ve jeolojik etüt raporu hazırlanmış, 1/25000 ÇDP onayına müteakip imar planı yapımına başlanılacaktır.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1- Koruma Amaçlı İmar Planı 2- 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 3- Yöresel Mimariye Uygun Proje Hazırlanması 4-Gelişmiş olan 10 adet köyün planlarının yapılması 5- İmar Planı Yapımı 6- Köy yerleşik Alan Tespiti Çalışmaları				%0 İptal %100 İptal %66 %0	
Göstergenin Kaynağı	İl Özel İdaresi 2012 yılı Stratejik Plan ve Çalışma Programı					
Performans Sonuçlarının Analizi	2012 yılı çalışma programında bulunan 5 adet projenin 2 adedinde hedefe ulaşılmış, 2 adedi iptal edilmiş, 1 adedi ise başlamamıştır.					
Sapmanın Nedeni	2012 yılında Müdürlüğümüzce İmar Planı Yapımı Projesi kapsamında altlık olarak kullanılacak Halihazır Harita ve jeolojik Etüt Raporu tamamlanmış, 1/25000 ölçekli ÇDP onayına müteakip imar planı yapımına geçilecektir. Merkez İlçe 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onay aşamasındadır. Ulus İlçesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağından iptal edilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı Projesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Onaylanmadığından dolayı başlanılamamıştır. Köy Yerleşik Alan Tespitleri ile ilgili olarak hazırlama ve onay yetkisi belirsizliğinden dolayı yapılamamıştır.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem						

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2009	2010	2011	2012	Hedeften
HARCAMA BİRİMİ :	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Gerçekleşme	Sapma
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kamunun ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina yapımı ve onarımı, tesisat,bakım ve onarım çalışmaları yürütülecektir.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Hizmet ve Lojman Binaları ile kalorifer jeneratör, asansör ve makinaların bakım ve onarımları yapılarak en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Lojman Binaları Bakım Onarımı Hizmet Binası Bakım Onarım Ahşap İskele Yapımı İşi İl Özel İdaresi Hizmet Binası,Lojman ve Ağdacı Lojman Binasının Deprem Güçlendirme Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması İşi OSB Genişleme Alanı Gökırmak Taşkın Koruma Amaçlı Taş tahkimatı sedde İnşaatı Taş temini				100% 100% 100%	
Göstergenin Kaynağı	İl Özel İdaresi 2012 Yılı Stratejik Plan ve Çalışma Programı					
Performans Sonuçlarının Analizi	2012 Yılı çalışma programında bulunan 5 Adet projenin 4 ünde hedefe ulaşılmıştır. 1 proje İl Genel Meclisi kararıyla programdan çıkarılmıştır.					
Sapmanın Nedeni	Proje Hazırlanması işi ihalesi 20.060,00 TL. Bedelle tamamlanmış olup, Yüklenici firma tarafından projeler teslim edilmiştir. Yapım ihalesi KİK' nun 39.maddesi gereğince iptal edilmiş olup,. İl Genel Meclisinin 28/12/2012 tarih ve 74 Sayılı Kararı ile çalışma ve performans programından çıkartılmıştır. OSB Genişleme Alanı Gökırmak Taşkın Koruma Amaçlı Taş tahkimatı sedde İnşaatı Taş temini işi aralık ayında ek programa alınmış olup projenin ihale hazırlıkları tamamlanmıştır. 21 Ocak 2013 de ihale edilecektir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem						

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU								
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR						
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ							
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak							
PERFORMANS HEDEFİ 1.1:	Yoksulların seçimi ve mikro kredi verilmesi	12	39	21	14	30	30	%0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Finans kaynağı Verilecek Krediler İdare tarafından verilen kredilerle ihtiyaç sahiplerinin ekonomik düzeyde katkı ve üretime yöneltilmesi. Memnuniyet Oranı							
Göstergenin Kaynağı	Öz Kaynak							
Performans Sonuçlarının Analizi	30 adet kişiye toplam 35.000,,00 TL Mikro Kredi verilmiştir.							
Sapmanın Nedeni	Başvurular içinde uygun olmayan müracaatların tespit edilmesi.							
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem	Basın aracılığıyla daha çok kişiye ulaşılması.							

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU								
BÜTÇE YILI	2012	YILLAR						
DAİRESİ	İL ÖZEL İDARESİ	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma %
HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İÜDÜRLÜĞÜ							
STRATEJİK AMAÇ 2 :	Kurumda tüm çalışanların yetkinliklerini, bilinç düzeylerini, organizasyon ve yönetim kabiliyetlerini, kişisel gelişimlerini, araç ve gereç kullanma artırmak, bilinç düzeylerinin Liderlik uygulamalarını üst düzeye çıkarmak amacıyla, işlerin zamanında etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için yöneticilerin otoritelerini, yaptırım güçlerini ve iş yaptırma yeteneklerini artırmak							
PERFORMANS DEFİ 2.1:	Beş yılın sonunda tüm personeli eğitilmiş ve bilgili kişiler haline getirmek,			20	10	20	14	%30
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Eğitim ihtiyaçları, personel önerileri ve personel anket kararı Eğitim planı ve kayıtları, personel memnuniyetleri yönetim beceri seviyesi Eğitimli ve yetkin yönetici, iş kalitesinde artış, memnuniyeti yüksek personel Eğitim planına tam uyum, şeffaf personel anketleri düzenleme Eğitim değerlendirmesi yapmak ve kaliteyi yükseltmek, personel anketler ve önerilerinde iyileştirmeler yapmak,							
Göstergenin Kaynağı	2009 – 2013 Yılları Stratejik Eylem Planı							
Performans Sonuçlarının Analizi	14 adet Hizmet içi Eğitim tamamlanmıştır.							
Sapmanın Nedeni	Dış Eğitimcilerin programa katılamaması							
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem								

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU								
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR						
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefften Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ							
STRATEJİK AMAÇ 3 :	İdarenin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle her türlü yatırım projelerinde halka yakınlaşmasını sağlamak, yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, kurumun tanıtım ve iletişim etkinliklerini başarıyla gerçekleştirmek							
PERFORMANS HEDEFİ 3.1:	Her yıl il özel idaresini tanıtan dergi hazırlamak.					3	3	%0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Halkta tanınırlık durumu Halkta tanınırlığın yüksek düzeyi çıkması Halktan tanınırlık çalışması yapılarak tanınırlığın yükseltilmesi Tanınırlık anketlerinin ve faaliyetlerinin etkin yapılması Tanınırlık faaliyetleri için toplantılarda yönetiminde görüşünü alarak doğru zaman ve süreci belirlemek							
Göstergenin Kaynağı	Öz Kaynak							
Performans Sonuçlarının Analizi	2012 Yılında 3 Adet Dergi Basılmıştır.							
Sapmanın Nedeni	-							
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem	-							

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedekten Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (Eğitim Hizmetleri)					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	Mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek. Okul binası ve ek derslik ihtiyacının tamamını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak Eğitim Kompleksi yapmak. İlköğretim okullarının mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Yeni Okul binası yapımı ile mevcut bina, tesislerin, bakım ve onarımını yapıp % 100 kullanılabilir hale getirmek. Eğitim Kalitesini artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Her yıl en az 10 okul binası onarmak.	43	51	28	56	
	Her yıl en az 1 okul binasına deprem güçlendirme uygulamak.	0	1	2	0	
	Plan sonuna kadar 1 adet okul yapmak.	1	0	2	1	50
	Her yıl 1 adet anasınıfı yapmak	1	0	1	0	100
	Plan sonuna kadar her ilçeye 1 adet Trafik Eğitim Parkı yapmak.	0	0	1	0	100
Göstergenin Kaynağı	İl Özel İdaresi 2012 Yılı Çalışma (Yatırım) Programı ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Yapım Programı.					
Performans Sonuçlarının Analizi	Okul onarımlarında hedeflenen sayının üzerinde onarım yapılmıştır. Deprem Güçlendirme Onarımı yapılamamıştır.. 1 Adet Okul Binası yapımı tamamlanmamıştır. Trafik eğitim parkı yapılamamıştır.					
Sapmanın Nedeni	Okul onarımlarında çalışma programına alınan proje sayısı ve dış kaynaktan beklenen ödenekten fazla ödeneğin gelmesi ile projeler % 50 artışla tamamlanmıştır. Trafik Eğitim Parkı yapımı alt yapı sorunu nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Anasınıfı arsa sorunu nedeni ile gerçekleştirilememiştir. Zemin etüdü ve proje ihalesi gerçekleştirilmiş,proje ve yaklaşık maliyet hazırlanması işinin belli bir süreyi kapsamaması nedeniyle Deprem güçlendirme ve onarımı işi ile okul yapımı 2012 yılında gerçekleştirilememiştir..					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem	Okul Onarımı performans göstergesinin hedeflenen değeri aşması daha fazla okula hizmet götürüldüğü anlamına geldiğinden ve bu durum kamu yararı sağladığından önlem alınmasına gerek yoktur. Trafik Eğitim Parkı yapılması için bu performans göstergesinin hedeflenen değeri, kaynak ihtiyacı ve alt yapı eksiklikleri giderildiğinde revize edilebilecektir. Anasınıfı yapımı için alt yapı eksiklikleri revize edilebilecektir.					

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR ve Turizm Hizmetleri)					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	İlimizin, folklorik, kültürel ve doğal değerleri ile henüz yeterince değerlendirilemeyen alternatif turizm potansiyelini de harekete geçirerek turizmi çeşitlendirmek; turizm kaynakları ve turistik olanakları sürdürülebilir kullanımla yılın her mevsiminde turizme hizmet verilebilir duruma getirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde etkin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek. Böylece, yerli ve yabancı turist sayısını her yıl % 10 artırarak ve turistlerin ildeki kalış sürelerini uzatarak turizmin gelişmesini sağlamak ve sektörün ekonomiye katkısını artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	Mevcut kültürel ve doğal değerlerin bulundukları ortamları turistik ziyarete uygun hale getirerek turizmde yeterli düzeyde yararlanılmasını sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Amasra Bedesteni Rolöve Restorasyon Restitüsyon Elektrik Proje Yapımı	-	-	-	-	100
	Kültür Merkezi Deprem Güçlendirme ve İkmal İnşaatı		1	-	-	0
	Çakraz Yerleşim Merkezi Kanalizasyon Yapım İşİ	-	-	-	-	-
	Ulus Apdipaşa Ovaçayı Kordon Boyu Yürüyüş Projesi	1	-	-	-	-
	Ulus Kocagöz Konağı restorasyon	1	-	-	-	-
	Amasra Müzesi Onarımı	1	-	-	-	-
	Amasra'da Kazı ve Ören Yerleri Yapımı		-	1	-	100
	Arıt Belediyesi Kilit Parke Alımı		1	-	-	0
	Kütüphanelere Yayın Alımı		-	-	-	100
	İlimizi tanıtıcı etkinlikler yapmak			1	1	
	Turizm alanında olmayan turistik yerlerin kültür ve turizme kazandırılması için etüd proje ve fizibilite yapılması işİ			1	1	
	Kozcağz Belediyesi Meydanı Çevre Düzenleme işİ			1	1	
	Amasra Belediyesi Atatürk Meydanı Düzenleme işİ			1	1	
	Kumluca Belediyesi Kilit Parke Alımı işİ			1	1	
	Hasankadı Belediyesi Kilit Parke Alımı işİ					
Göstergenin Kaynağı	İL Özel İdaresi 2011 Yılı Çalışma (Yatırım) Programı.					

2012 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Sonuçlarının Analizi	Kumluca ve Hasankadı Belediyesi Kilit Parke Alımı işi,Kozcağız Belediyesi Meydan Çevre Düzenleme işi,Amasra Belediyesi Atatürk Meydanı Düzenleme işi tamamlanmıştır. Arkeolojik kazı gerçekleşmemiştir. Kültür ve turizm alanında olmayan yerlerin turizme kazandırılması amacıyla kurulan etüd ve fizibilite komisyonunca gerekli incelemeler yapılarak rapor hazırlanmıştır.
Sapmanın Nedeni	Amasra Bedesteni Rolöve Restorasyon Restitüsyon Elektrik Proje Yapımı Kültür Bakanlığınca yeterli ödenek gönderilmediğinden gerçekleştirilememiştir-.Arkeolojik kazı çalışması yapılacak alanın ot temizliğine başlanmış,iklim koşulları nedeniyle sonuç alınamadığından uygun şartlarda ot temizliği tamamlanacaktır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem	Bu performans göstergesinin hedeflenen değeri, kaynak ihtiyacı ve alt yapı eksiklikleri giderildiğinde revize edilebilecektir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefte Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (Spor Hizmetleri)					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	İlimizde spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymak,spor tesisi sayılarını ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltmak,mevcut spor tesislerimizi günümüz şartlarına uygun hale getirmek için bakım, onarım ve tamiratlarının yapılarak hizmete sunup,daha çok federasyon spor faaliyeti organize edip ,ilimize maddi ve manevi spor turizmi girdisini artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	İlimizde her branşta yetişen elit sporcuları teşvik etmek amacıyla ödüllendirmek öncelikli spor dallarını (Futbol Atletizm, Güreş, Voleybol, Basketbol, Tenis, Masa Tenisi, Bocce, ve Uzak Doğu Sporları) önem verilerek Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda İlimizin performansının ve kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Buna göre; 20 olan spor tesisi sayımızı 30'a, 26 olan kulüp sayısını 30'a, 4381 olan lisanslı sporcu sayısını 5.500'e, 150 olan Gençlik Merkezi Aktif üye sayısını 300'e çıkarmayı hedeflemekteyiz.					
	Gürgenpınarı Futbol Sahası yapımı		1	-		0
	Kozcağız Futbol Sahası Çimlendirilmesi		1	-		0
	Kurucaşile Futbol Sahası Işıklar ve Çimlendirilmesi		0	1	1	100
	Serdar Köyü Futbol Sahası Yapımı		1			0
	Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu Jeneratör Alımı		1			0
	Kumluca Futbol Sahası Çim.Işık.		0	1		100
	Bartın Sen.Çim Yüz.Futbol Sahası Işıklandırma		0	1		100
	Spor Tesisleri yapımı		0	-		100
	Spor Tesisleri Bakım Onarımı		0	1		100
	Gençlik Merkezi Binası Yapımı		0	1		100
	Zafer Köyü Futbol Sahası Çimlendirmesi			1		100
	Gürgenpınarı Futbol Sahası Çimlendirmesi			1		100
	Serdar Köyü Futbol Sahası Çimlendirmesi			1		100
	Amasra Futbol Sahası Çimlendirmesi			1		100
	Spor Tesisleri Kompleksi Fizibilitesi			1		100
Göstergenin Kaynağı	İL Özel İdaresi 2011 Yılı Çalışma (Yatırım) Programı.					
Performans Sonuçlarının Analizi	Kurucaşile Futbol Sahası Işıklandırması gerçekleştirilmiştir. Bartın Sen.Çim Yüz.Futbol Sahası Işıklandırma Spor Tesisleri Bakım Onarımı Gençlik					

2012 YILI FAALİYET RAPORU

	Merkezi Binası Yapımı Zafer Köyü Futbol Sahası Çimlendirmesi Gürgenpınarı Futbol Sahası Çimlendirmesi Serdar Köyü Futbol Sahası Çimlendirmesi Amasra Futbol Sahası Çimlendirmesi Spor Tesisi Kompleksi Fizibilitesi dış kaynaktan ödenek tahsis edilmemesi nedeniyle yatırım programından çıkartılmıştır.
Sapmanın Nedeni	Bartın Sen.Çim Yüz.Futbol Sahası Işıklandırma Spor Tesisleri Bakım Onarımı Gençlik Merkezi Binası Yapımı Zafer Köyü Futbol Sahası Çimlendirmesi Gürgenpınarı Futbol Sahası Çimlendirmesi Serdar Köyü Futbol Sahası Çimlendirmesi Amasra Futbol Sahası Çimlendirmesi Spor Tesisi Kompleksi Fizibilitesi projeleri Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından Ödenek gönderilmemesi nedeni ile gerçekleştirilememiştir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem	Bu performans göstergesinin hedeflenen değeri, kaynak ihtiyacı eksiklikleri giderildiğinde revize edilebilecektir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU						
BÜTÇE YILI :	2012	YILLAR				
DAİRESİ :	İL ÖZEL İDARESİ	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefte Sapma %
HARCAMA BİRİMİ :	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (EMNİYET)					
STRATEJİK AMAÇ 1 :	İlimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) MOBESE kurmak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1:	İlin asayiş ve güvenliğine katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğu izlemek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek,gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesi hız ihlali yapan araçların tespiti, trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığı ile plakaların emniyet bilgi sisteminden sorgulanarak çalıntı vb. konularını değerlendirmek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde polis, halk ilişkilerini zedelemekten yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olmak gibi uygulamaların tamamını sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) Kurulumu	-	1	-		0
	Emniyet Müdürlüğü 20 daireli Polis Lojmanı Onarımı	1	-		-	-
	Emniyet Müdürlüğü 100 daireli Polis Lojmanı Onarımı	1	-	-	-	-
	Emniyet Binaları bakım Onarımı	1	1	1	0	100
	Jandarma Kamera Güvenlik Sistemi	0	1	1	0	100
	İlçe Kamera Güvenlik sistemi yapımı	-	0	1	0	100
Göstergenin Kaynağı	İl Özel İdaresi 2011 Yılı Çalışma (Yatırım) Programı.					
Performans Sonuçlarının Analizi	Jandarma Kamera Güvenlik Sistemi ve Emniyet Binaları Bakım Onarımları işi gerçekleştirilememiştir.					
Sapmanın Nedeni	Jandarma Kamera Güvenlik Sistemi işi ihalesi yapılmış,geçerli teklif olmaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir.. Emniyet Binaları Bakım Onarımları Emniyet Genel Müdürlüğünden ödeneklerin yıl sonu gönderilmesi nedeniyle gerçekleştirilmemiştir.					
Sapmaya Karşı Alınacak Önlem	Bu performans göstergesinin hedeflenen değeri, kaynak eksiklikleri giderildiğinde revize edilebilecektir.					

2012 YILI FAALİYET RAPORU

3- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	9	1

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	10	10	0

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	10	0

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	5	2	3

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	5	4	1

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	78	77	1

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLLENEN FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	0

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLLENEN FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
İL AFET VE ACİL DURUM EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	0

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ			
BİRİMİ	HEDEFLLENEN FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SAYISI	ULAŞILAMAYAN FAALİYET SAYISI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1

4- PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

31.12.2012 tarihi itibari ile, İl Özel İdaresinin 2012 Yılı Programı ile Ek Programında toplam 147 adet hedefimiz olup, yıl içerisinde 26 adet hedefimiz ödenek yetersizliği, arsa temin edilememesi, kamulaştırma yapılamaması, zemin etüdü ve proje yapılamaması, Bakanlıktan aktarılan ödeneklerin yıl sonu itibari ile gelmesi gibi sorunlar nedeni ile gerçekleşmesi mümkün olmadığından İl Genel Meclisi Kararıyla programdan çıkarılmıştır.

Sonuç olarak;

İl Özel İdaresi tarafından tüm birimler itibariyle toplam 121 adet hedef belirlenmiş olup, devam eden işlerle beraber 114 adet hedef gerçekleşmiş, 7 adet hedefe ulaşılammıştır. Yıl sonu itibariyle; devam eden işlerle beraber gerçekleşen hedef oranı % 94 ve gerçekleşmeyen hedef oranı ise % 6 olarak tespit edilmiştir.

2012 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN İCMALI

BİRİMİ	HEDEFLenen FAALİYET SAYISI	GERÇEKLEŞEN (Devan Edenler Dahil) FAALİYET SAYISI	ULAŞILA MAYAN FAALİYET SAYISI	ORANI %
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	78	77	1	99
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	9	1	90
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	5	2	3	40
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	10	10	0	100
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	5	4	1	80
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	0	100
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	10	0	100
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1	0
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	0	100
TOPLAM	121	114	7	94

BAŞLANILAMAYAN PROJELER:

- 1- 1/1.000 Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı
- 2- 1/25.000 lik Çevre Düzeni Planı Yapımı
- 3- Gelişmiş Olan 10 adet Köyün Planlarının Yapımı
- 4- Toki Köprü Yapımı
- 5- Köprü -Tünel Etüt ve Proje Yapımı
- 6- Bilim Sanat Binası Yapımı
- 7- Meclis Salonu Düzenlemesi Yapımı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

B- ZAYIFLIKLAR

GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER
❖ Üst Yönetimin (Vali) desteği	❖ İl Özel İdaresi Gelirleri Yasasının çıkarılmaması nedeniyle kıt bütçe imkanlarıyla hizmet verilmesi.
❖ Kırsal Altyapıya yönelik yatırımlarının, İl Özel İdare kaynakları ile Başbakanlığımız tarafından yürütülen KÖYDES projesi kapsamında uygulanması.	❖ İl Nüfusunun % 66 oranında İl Özel İdaresinin doğrudan hizmet verdiği kırsal alanda yaşaması, dolayısıyla hizmet götürülmesi gereken ünite sayısının ve verilecek hizmet sayısının çok fazla olması nedeniyle maliyetlerin yüksek olması.
❖ Karar alma ve icra yetkisine sahip olunması	❖ Öz gelirlerin yetersiz olması nedeniyle kıt bütçe imkanlarıyla hizmet verilmesi.
❖ Kamusal altyapı için gerekli makine ve ekipmanın bakım onarımlarının yapılarak ve yeni makine ve ekipman alınarak araç ve makine parkının yenilenmesi nedeniyle % 80 oranında ekipmana sahip olunması.	❖ Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü ile Mülga İl Özel İdare Müdürlüğünün birleşmesinden dolayı, nitelik ve nicelik olarak hizmet alanı ve çeşidi itibarıyla artan giderlere karşılık, İl Özel İdaresi gelirlerinin yetersiz düzeyde olması.
❖ İl Özel İdaresi mevcut kadro sayısının az olmasına rağmen, tüm personelin uyumlu, etkin ve disiplinli bir çalışma sergilemesi .	❖ Bölgedeki iklim ve coğrafi şartların özellikle yol ve içme suyu hizmetlerinin gerçekleşmesindeki olumsuz etkisi.
❖ Karar alma sürecinin kısılması ve karar organları ve yürütmenin uyumlu ve etkin bir çalışma ortamına sahip olması.	❖ Özlük haklar yönünden oluşan adaletsizliğin ortadan kaldırılması
❖ Müdürlüklerin idari ve teknik personel ihtiyaçlarının karşılanması için, sözleşmeli personel pozisyonunda teknik personel alınmış olunması	❖ Mevzuattaki hızlı değişmeye bağlı olarak uygulamada birçok tereddütle karşılaşılması

C- DEĞERLENDİRME:

1-) 5302 sayılı yasa ile oluşan İl Özel İdaresi; il sınırları ve belediye sınırları içinde görev ve sorumluluk alanları belli olan hizmetlerini yerine getirilebilmesi için, yasalarla belirtilen gelirlerin nitelik ve nicelik bakımından genişletilmesi zaruri ihtiyaç haline gelmiştir.

2-) 5302 sayılı yasanın 29. maddesi “Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir.” ve 35. maddesi “Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde düzenler ve yürütür.” ve 3. maddesi “İl Özel İdaresi il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişisidir.” hükümleri gereğince, il sınırları içindeki Devlet Su İşleri ve Karayolları gibi kuruluşların yerinden yönetiminin sağlanabilmesi için, gerekli kaynakların temin edilerek ve İl Valisine bağlı olarak, İl Özel İdaresi çatısı altında toplanması hizmetlerdeki verimliliği, kaliteyi ve hızı artırmada oldukça önemli olacaktır.

3-) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin Kurumsal anlamada ilişkilerinin netleştirilmesi uygulamada yaşanan tereddüt, zorluk ve belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır. Görev, yetki ve sorumlulukların hızlı, yerinde ve zamanında yapılabilmesi için konu oldukça çok önem arz etmektedir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

A - ÖNERİLER :

1. Kurumsal stratejik planların, ilin stratejik planına dönüştürülmesi.
2. Performans ve Çalışma Programları hazırlanırken, stratejik planlar göz önünde bulundurulmalı, İl düzeyinde tüm kurum ve kuruluşların katılacağı İl Özel İdaresi odaklı yıllık Performans Planı ile Çalışma ve Yatırım Programlarının yapılması.
3. İlimiz sınırları içerisinde görev, yetki ve sorumluluk alanımızda olup, yapılması gereken hizmetlerin daha verimli, rantabl ve hızlı bir şekilde olabilmesi için, tüm sektörlerde il envanterlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve tek merkezde toplanılması, fiziki ve insan kaynakları ile araç ve gereçlerin hizmet alanlarına öncelikler belirlenerek tahsis edilmesi.
4. Norm kadro kriterlerinin gözden geçirilerek, Daire Başkanlıkları kadrolarının ihdas edilmesi.
5. İç Denetçi kadrosunun tahsis edilmesi.
6. İl Özel İdaresi Gelirleri Yasasının çıkarılarak kaynakların artırılması ve idarenin mali açıdan güçlendirilmesinin sağlanması.
7. KÖYDES Projesinin devam etmesi ve ödeneklerin İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılması.
8. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 2 nolu cetvele eklenmesi.
9. Eğitim seminerlerinin artırılması.
10. 5902 sayılı yasa ile kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin kadrolarının, İl Özel İdaresi kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu yasanın 25/e fıkrasında **(II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 6- Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda bölümüne “Boğaziçi İmar Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Afet ve Acil Durum Müdürü” ibaresi eklenmiştir.** hükmü yer almaktadır. İl Afet ve Acil Durum Müdürü ile İl Özel İdaresi Müdürlerinin gerek ek gösterge, yan ödeme ve gerekse özel hizmet tazminatları arasında ciddi derecede farklar bulunmakta olup, uygulamada eşitlik, adalet ve birlikteliğin sağlanabilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi Müdürleri tazminatları ile ilgili revize yapılması gerektiği düşünülmektedir.

B- TEDBİRLER:

1. Kıt kaynaklarla verilen hizmetlerin etkili, ekonomik ve verimli olabilmesi için ihtiyaçların öncelikli olanlarının belirlenmesi gerekmektedir.
2. Yol altyapısında 1 ve 2 inci grup köy yollarımızın standartlarının yükseltilmesi nedeniyle, İl Trafik Komisyonunca söz konusu yollarda hız ve tonaj tahdidinin belirlenmesi.
3. İlimiz yol ağının bir an önce tespit edilmesi.
4. Köy Yerleşik alanlarının tamamlanarak nüfus yoğunluğu fazla olan köylerimizin imar planlarının bir an önce bitirilmesi.
5. İl Özel İdaresinin, ilimiz yol ağının % 80'ine sahip olması nedeniyle, İl Özel İdaresi personelinin de İl Trafik Komisyonuna üye olarak katılması.
